

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Përmirësimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PROÇESI PËRMIRËSIMIT ENERGJITIK

‘FINAL’

KORNIZA PËR MENAXHIMIN MJEDISOR DHE SOCIAL (KMMS)

**CEZ Shpërndarje
(NJZP)**

Datë: Prill 23, 2014

**Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Proçes Përmirësimi Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore
në Shqipëri**

1. HYRJJE

Projekti do të mbështesë zbatimin e Qeverisë së Shqipërisë (QSH) 's Programit të Rimëkëmbjes në sektorin e energjisë elektrike, e cila është e bazuar në katër shtylla kryesore: i) zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ekzistuese ligjore, veçanërisht me CEZ .sha; ii) rritjen e sigurisë së furnizimit përmes diversifikimit të burimeve gjeneruese, duke zbatuar një plan të duhur të prodhimit nga OST-ja, operatori i tregut, për të balancuar importet e veta nga Kaskada e lumit Drin, importet e energjisë dhe brezit lokale , në të ardhmen e "Rikonstruksion i tensionit të mesëm dhe të rrjetit të tensionit të ulët dhe gjithashtu ndërtimi i nënstacioneve në zonën e Tiranës iii) përmirësimin e efikasitetit të sistemit në sektorin e shpërndarjes për të zvogëluar humbjet e energjisë së pakut 20 për qind gjatë tre viteve të ardhshme dhe për të përmirësuar shkallën e inkasimit të mjeteve monetare dhe dispozitat e borxhit të keq; dhe iv) rritjen e tregtisë rajonale duke forcuar sistemin e interkoneksionit.

Për të mbështetur programin e Qeverisë Shqiptare, projekti do të përbëhet nga një kredi investimi me tri komponente kryesore:

Komponenti 1-Sigurimi afat shkurtër të furnizimit me energji

Shqipërisë i mungon kapaciteti prodhues i fortë për të menaxhuar paqëndrueshmërinë e motit, për më tepër, HEC Koman në Kaskaden Drin nën mirëmbajtje dhe ka një hendek kapaciteti prej rreth 150/ MW për një periudhë 3 vjeçare.

Komponenti 2 - Përmirësimi i infrastrukturës së shpërndarjes

Ky komponent do të mbështesë planin e QSH-re dhe kompaninë e shpërndarjes për të zvogëluar humbjet, përmirësimin e grumbullimit të parave të gatshme dhe reabilitimin në rrjetin TM dhe TU. Kompania e CEZ Shpërndarjes ka finalizuar një studim, i kryer nga konsulentët Ndërkombëtarë, duke vlerësuar fushat e humbjeve të mëdha dhe akëtim të ulët. Raporti gjithashtu përfshin një plan veprimi të propozuar për të zvogëluar humbjet gjatë gjashtë viteve të ardhshme. Investimet vlerësohen afërsisht 275.000.000 \$ gjatë gjashtë viteve të ardhshme (2015-2020).

Investimet do të fokusohet në: i) përmirësimin e sistemit të shpërndarjes nën-transmetim për të përmirësuar reabilitimin e situatës, ii) investime në rrjetin e tensionit të mesëm (6-20 kV) dhe iii) sistemi i matjes, investimi për rrjetin e tensionit të ulët; dhe iv) përmirësimi i menaxhimit të kompanisë dhe të faturimit dhe arkëtimit të sistemit.

Pesë nënkomponentë propozuara do të përfshijnë:

- a) **Përmirësimi i sistemit të transmetim:** Investimet në nivel transmetimi janë të nevojshme për të përmirësuar reabilitimin e sistemit në qendër të Tiranës, duke forcuar dy linjat ekzistuese 35/MV dhe 110/MV në sistem.
- b) **Investime të planifikuara në rrjetin e tensionit të mesëm (6-20kV):** Investimi i propozuar do të përfshijë linjat kablllore TM dhe kabina TM/ TU të shpërndarjes, si dhe sistemin e matjes në kabina.
- c) **Investimet e sistemit Matës në rrjetin e tensionit të ulët:** CEZ Shpërndarje bën të njohur se rreth 250.000 klientë kanë matësa të dëmtuara apo të mos kenë matësa fare. Sipas këtij komponenti projekti do të ofrojë financim për blerjen dhe instalimin e: (i) rreth 230.000 matësive nje fazor dhe tre-fazor; (ii) kablllo të tensionit të ulët koncentrik; (iii) kabllot ABC; dhe (iv) kabllot trefazor me konduktor të rregullt.
- d) **Përmirësimi i sistemit të faturimit dhe mbledhjes së të ardhurave.**
- e) **Menaxhimi shërbimeve këshilluese:**

Komponenti 3- Transmetimi / përmirësimi i të dhënave

Në vitin 2011, Qeveria Shqiptare e zhvendosi konsumatorin e tensionit të lartë industriale në tregun e parregulluar, kjo ka pasur efektin e reduktimit detyrimin të Qeverisë Shqiptare, nëpërmjet KESH, për të siguruar garancitë e rreth 50.000.000 \$ Amerikan të KESH dhe e vuri Shqipërinë në ballë të reformave të tregut të kërkuara nga direktivat e BE. Hapi i ardhshëm në reformën e tregut është për të hapur tregun për konsumatorët e tensionit të mesëm të nivelit të dytë, duke ulur më tej detyrimin publik për të garantuar furnizim për konsumatorët e rregulluar tarife.

Për të lehtësuar këtë proces, projekti do të mbështesë OST-në që të: (i) të instalojë matësa për konsumatorët e tensionit të mesëm dhe të PPE-ve dhe krijimin e një qendre të dhënave / matëse në OST, dhe (ii) të lehtësojë të ardhmen tregun e çrregullt për furnizuesit të drejtë dhe të konsumatorëve, dhe IPP.

Komponenti 4 - Futja e reformave prioritare ne sektorin energjetik dhe mbështetje të realizimit të projektit

Qeveria shqiptare pranon se investimet vetëm nuk do të jenë të mjaftueshme për ta kthyer sektorin, pa reforma kritike të sektorit të energjisë që do të adresojnë çështjet strukturore, institucionale dhe operationale të këtij sektori. Ne mbështetje të projektit të zbatimit, ky komponent do të financojë asistencën teknike të nevojshme për të filluar reformat prioritare për të mundësuar rimëkëmbjen e sektorit të energjisë..

Kuadri mjedisor dhe social është përgatitur si një mjet për Komponentin 2 të projektit i cili do të përfshijë investimet të tilla si nënstacionet (rehabilitime dhe ndërtime të reja), kabllot nëntokësore, në vende të ndryshme të vendit për të përmirësuar sistemin e shpërndarjes. Që nga lokacionet e sakta dhe karakteristikat e investimeve sipas këtij

komponenti nuk është e qartë në këtë fazë, dokumenti kornizë ka për qëllim të ofrojë udhëzime për NjZP (Njësia e Zbatimeve të Projekteve) për përgatitjen dhe zbatimin e dokumenteve mbrojtëse mjedisore.

Procedurat e paraqitura në këtë dokument kornizë të veprimeve të detajuar, të cilat do të merren për të siguruar përputhshmërinë me rregulloret Shqiptare ekologjike si dhe Procedurat dhe Politikat Mbrojtëse Mjedisore të Bankës Botërore dhe procedurave të përcaktuara në politikat operacionale të Bankës Botërore, në mënyrë specifike OP 4.01 (vlerësimi i mjedisit). Që nga projektet e propozuara do të zhvillohen në zonat urbane, ka çështje që lidhen me habitatet natyrore ose pyjet që priten. Nëse ndonjë Projekt planifikohet të ndërtohet në një tokë të mbrojtjes urbane, BB do të konsultohet dhe do të shqyrtoj projektin që do të bëhet në përputhje me rrethanat.

Metodologjia e përdorur për përgatitjen e kuadrit është bazuar mbi: (i) Rishikimi i politikave ekzistuese, rregulloret, udhëzimet operative dhe rregullimet institucionale në Shqipëri për të adresuar dhe zbutur ndikimet mjedisore dhe sociale të rrugëve rurale; (ii) Vlerësimi i përputhshmërisë së parimeve bazë të rregullave shqiptare dhe politikave të Bankës Botërore për të identifikuar boshllëqet dhe duke paraqitur rekomandime për t'i adresuar ato, (iii) Përgatitja e udhëzimeve për identifikimin dhe vlerësimin e natyrës dhe shkallën e ndikimeve mjedisore dhe sociale, duke përfshirë përgatitjen e e kritereve të shqyrtimit mjedisore dhe sociale për të përzgjedhur projektet për implementimin në NJZP dhe përcaktojnë nivelin e vlerësimit / studimeve sociale dhe mjedisore të kërkuara; (iv) Sugjerime mbi modalitetet për përgatitjen e faqes specifike masat për zbutjen e projekteve.

2. INFORMACIONE PERMBLEDHËSE PËR LEGJISLACIONIN KOMBËTAR DHE POLITIKAT OPERACIONALE TË BANKËS BOTËRORE MBI VLERËSIMIN MJEDISOR

2.1. Politika e Vlerësimit Mjedisor sipas Bankës Botërore

Sipas sistemit EA Banka Botërore , projektet klasifikohen si Kategoria A, Kategoria B, Kategoria C ose në varësi të rrezikut mjedisor potencial të vlerësuar.

Kategoria A : Një projekt mund të ketë ndikime të rëndësishme negative mjedisore mbi popullsinë njerëzore apo fusha-duke përfshirë të rëndësishme për mjedisin ligatinat, pyjet, kullotat, dhe habitateve të tjera natyrore, që janë të ndjeshme, të larmishme, të paparë ose të pakthyeshëm. Këto ndikime mund të ndikojnë në një zonë më të gjerë se sa faqet ose objektet që i nënshtrohen punëve fizike. Kategoria B, Projekti ka ndikime të mundshme negative mjedisore janë më pak të padëshirueshme se ato të projekteve të një kategorie. Këto ndikime janë të

përcaktuar; pak, nëse ndonjë prej tyre janë të pakthyeshme; dhe në shumicën e rasteve masat zbutëse mund të jetë projektuar më lehtë se sa për projektet e një kategorie.

Kategoria B: mund të përfshijë projekte të ndryshme me një gamë të gjerë të çështjeve të mundshme mjedisore: nga projektet me çështje mjaft të kufizuara mundshme mjedisore për projekte me çështje potencialisht të rëndësishme mjedisore që kanë nevojë për vëmendje të veçantë për të menaxhuar siç duhet. Në fakt, Kategoria B mbulon çdo projekt që nuk është mjaft kompleks dhe e rrezikshme për të kërkuar një VNM të plotë, (VNM, bën trajtimin e një gamë të gjerë çështjesh të mundshme, duke përfshirë të dhëna bazë të mjedisit dhe një analizë të hollësishme të alternativave), por nuk të kërkojë disa analiza të ndikimeve të mundshme mjedisore në mënyrë që të jenë në gjendje të identifikojnë masat e duhura zbutëse dhe treguesit e monitorimit. Sipas rëndësisë së ndikimeve të kufizuara të Kategorisë B, për projekte të ndryshme do të mund të jetë e nevojshme të kërkohej lloje të ndryshme të dokumentacionit EA. Për shumë të thjeshtë llojin e ndërtimit / rehabilitimit të projekteve një PMMS bazë ose një listë e plotë PMMS mund të mjaftojë, por për projektet të cilat janë kufizuar për ndikime të rëndësishme një ESA pjesshme mund të jetë e nevojshme (formati do të jetë i ngjashëm me një PMMS detajuar).

Projektet e kategorisë C nuk përfshijnë aktivitete të cilat mund të ndikojnë negativisht në mjedis ose përfshihen në aktivitete me ndikime potenciale të cilat janë të shmangëshëm lehtësisht me anë të aplikimit të rregullave standarde në praktikën e mira të ndërtimit.

Se si sistemet e shqyrtimit ndryshojnë në krahasim me rregulloren kombëtare të VNM-së, ajo nuk është teknikisht shumë e lehtë për të perputhur shqyrtimet ndërmjet sistemit kombëtar dhe BB për projektet. Për shembull, ajo nuk mund të supozohet se nën sistemin kombëtar të barazohet drejtpërdrejtë me Bankën Botërore kategorinë A dhe me Kategoria B. Ndryshimet në të dy sistemet mund të lindin, dhe është e mundur për disa në Shtojcën I për projektet të merret parasysh Kategoria B, ose anasjelltas, disa si në projektet që të konsiderohen Kategoria A në qoftë se për shembull ato janë planifikuar në zonat e ndjeshme. Po kështu, disa Jo, projektet mund të shfaqen në Kategorinë B veçanërisht në qoftë se ata mund të çojnë në ndikime modeste negative në mjedisin e njeriut apo natyror dhe ndikimeve të kufizuara në një rajon të vogël dhe janë të përkohshme apo jetëshkurtër dhe këto efekte janë të lehtë dhe të lira për të kontrolluar (p.sh. shumica e aktiviteteve të ndërtimit).

Sipas listës së propozuar të nën-projekteve, u ra dakord që kabllo të nëntokësore, si dhe nënstacionet do të jetë e natyrës Kategoria B, si llojet e ndikimeve të mundshme janë të kufizuara dhe duhet të jetë relativisht e lehtë për të vlerësuar dhe të zbutur me anë të vendosjes të kujdesshëm dhe praktikën e mira të ndërtimit.

Detajet e dokumentacionit, konsultimet publike dhe marrëveshjet e zbatimit janë të detajuara në seksionet më poshtë.

2.2. Legjislacioni Kombëtar Lidhur me Mjedisin

Ligjet dhe Rregulloret në fushën e Mjedisit

- Legjislacioni mjedisor rregullohet me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit Nr 8934, datë 5 shtator 2002. Ky ligj përcakton politikat kombëtare dhe vendore për mbrojtjen e mjedisit, kërkesat për përgatitjen e Vlerësimeve të Ndikimit Mjedisor dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor, kërkesat për lejimin e aktiviteteve që ndikojnë në mjedis, parandalimin dhe reduktimin e ndotjes së mjedisit, normat dhe standartet mjedisore, monitorimin dhe kontrollin mjedisor, detyrat e organeve shtetërore në lidhje me çështjet e mjedisit, rolin e publikut dhe sanksionet e parashikuara për shkelje të ligjit.
- Ligji Nr.9890, datë 20.03.2008 Ndryshimet Shtojte te Ligjit Nr 8934 "Për mbrojtjen e mjedisit".
- Udhëzimi Nr 3, datë 2013/02/12 "Për dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar për licencë mjedisore Klasa A, B, dhe C për të reja dhe aktivitetet ekzistuese"

Ligji për VNM-në, 8990, u miratua më 23 janar, 2003. Ai përcakton rregullat, procedurat dhe afatet për identifikimin dhe vlerësimin e ndikimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të projekteve ose veprimtarive mbi mjedisin. Ligji përcakton hapat e nevojshme për zbatimin e procedurave të VNM-së: dorëzimin e aplikimit, shqyrtimit paraprak, përzgjedhjes dhe kriteret e klasifikimit, të dëgjimit publik dhe konsultimi, akses në informacion, detyrat dhe të drejtat e organeve të tjera. Ligji gjithashtu parashikon listën e aktiviteteve që duhet t'i nënshtrohen procesit të Thelluar dhe të Përmbledhur të VNM-së. Ajo është mbështetur nga disa vendime të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimet e nxjerra nga MM.MM është autoriteti ligjor kompetent për të kërkuar, rishikuar dhe aprovuar dokumentacionin VNM-së.

- Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM) përcakton tipin dhe shkallën e projekteve ose veprimtarive që kërkojnë VNM para zbatimit. Kategoritë e VNM janë:
- Një Përmbledhje (përshkruar) VNM. Kjo është për projektet që mund të kenë ndikime të më pak të rëndësishme potenciale që ende kërkojnë një vlerësim profesional të impakteve të tyre. Ato përfshijnë projekte e listuara në Shtojcën 2 të Ligjit mbi VNM, dhe çdo ndryshim ose rikonstruksionet e projekteve të listuara në Shtojcën 1.
- E thelluar (e avancuar) VNM. Kjo është për projekte me impakte potenciale, të renditur në Shtojcën I të Ligjit, ato projekte të listuara në Shtojcën 2 të cilat MM konsideron do të ketë një ndikim të rëndësishëm në mjedis (bazuar në informacionin e siguruar nga propozuesi në kohën e aplikimit, në mënyrën e detajuar në Shtojcën 3 të Ligjit), dhe aktivitetet që duhet të zbatohen në një zonë të mbrojtur të Republikës së Shqipërisë.



Ligjet dhe Rregulloret në fushën e trashëgimisë kulturore

- Trashëgimia kulturore konstaton: Çështjet që lidhen me trashëgiminë kulturore rregullohen nga Ligji Nr. 9048, "Për Trashëgiminë Kulturore", datë 7 prill 2003. Ky është një ligj shumë i gjerë, që mbulon shumë aspekte të trashëgimisë kulturore.

Ligji kërkon që çdo person që zbulojnë ose gjen, në mënyrë të rastësishme, objekte të trashëgimisë kulturore gjatë punimeve të ndërtimit duhet të pezulloj punën menjëherë dhe të informojë autoritetet përkatëse vendore brenda tri ditëve. Këto organe janë pastaj përgjegjës për të bërë kontroll përkatës të objekteve të gjetura, për të raportuar mbi vlerat e tyre dhe të bëjnë propozime për vazhdimin e punimeve ose ndërprerjen e tyre për hetime të mëtejshme. Këto organe mund të vendosë për çdo ndryshim ose ndërprerje eventuale të punimeve për të ruajtur objektet e gjetura. (Neni 48)

Për çdo projekt të të mëdh ndërtimi investitorët duhet të konsultohen me autoritetet përkatëse gjatë hartimit të projektit dhe aplikimit për leje ndërtimi. Ekspertët do të kontrollojnë zonën dhe të përgatisin raportin e tyre përkatës dhe çdo modifikim të nevojshme për të akomoduar ose pëe mbrojtjen e ndonjë objekti të rëndësishëm kulturor. Propozimi për të ndryshuar projektin duhet të dorëzohet nga institucionet që kanë kryer kontrollin. Shpenzimet për këto ndryshime duhet të mbulohen nga vetë investitorët. (Neni 47).

- Ligji për pyjet dhe shërbimin pyjor (nr 9385, datë 04.05.2005, i ndryshuar në vitin 2006, 2007, 2008);
- Ligji për burimet ujore (1996, i ndryshuar në vitin 1998, 2000, 2001);
- Ligji për furnizimin me ujë dhe rregullimin kanalizimeve (1996);
- Ligji për zonat e mbrojtura (nr 8897, datë 16.05.2002, i ndryshuar në vitin 2008);
- Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja (nr 8897, datë 16.05.2002);
- Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (nr 9010, datë 13.02.2003, i ndryshuar në vitin 2008);
- Ligji për trajtimin mjedisor të mbetjeve të ngurta (nr 9010, datë 13.02.2003);
- Ligji për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura (nr 9115, datë 24.07.2003);

➤ Legjislacioni Shqipërisë për Direktivat e BE-së

- Ligji no.8897, datë 2002/05/16 "Për Mbrojtjen e Mjedisit" dhe Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Në mënyrë që të përafrohet plotësisht me Direktivën e BE-së, miratohet në vitin 2010 dhe 2011.
- Shqipëria është transpozimin e Ndotjes Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar (IPPC) Direktiva, një projekt-ligj i cili është përgatitur dhe miratuar në vitin 2010.
- Shqipëria ka caktuar faqet e mbrojtjes sipas Konventës Ramsar (Konventa mbi ligatinat



me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht si Shpendëve Habitat).

- Direktiva LPC ende është duke pritur transpozimin të drejtpërdrejtë me Shqipërinë që ka ligjet e miratuara "në cilësinë e ajrit" në janar 2009, për aderimin në Protokollin e Helsinkit dhe Sofjes Protokollin të Konventës 1979 "Për me rreze të gjatë ndotjes së ajrit ndërkufitare".

➤ **Kuadri institucional**

- Institucioni kryesor përgjegjës për çështjet e ndryshimit të klimës është Ministria e Mjedisit (MM), i krijuar në vitin 2005,

Disa ente qeveritare kanë role të rëndësishëm në politikat mjedisore:

- Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes
- Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit,
- Ministria e Industrisë dhe Energjitikës
- Ministria e Shëndetësisë, Kombëtar Mjedisor
- Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
- Këshilli Kombëtar i Ujit,
- Instituti i Shëndetit Publik, Instituti i Ujit,
- Energjia dhe Mjedi; Këshilli për të Territorit

Krahasimi i Politikave të BB dhe ligjit shqiptar

Procedurat Shqipëtare të VNM-ve janë përgjithësisht në përputhje me procesin e VM-re të Bankës Botërore, si të gjitha projektet kërkojnë një lloj të një shqyrtimit mjedisor dhe ndoshta vlerësimin për të marrë një Deklaratën Mjedisore (për ndërtim), dhe / ose një Lejes Mjedisore (për një aktivitet që ka një ndikim në mjedis, duke përfshirë disa aktivitete të ndërtimit). Për më tepër, lloji dhe shkalla e ndikimeve projekti do të ketë mbi mjedisin përcakton procedurat që duhen ndjekur si dhe llojin e miratimit të dhënë. Gjithashtu të gjitha aprovimet përfshijnë kushte që do të zbatohen nga propozuesi duke përfshirë monitorimin e mjedisit dhe kërkesat zbutëse.

Dallimi qëndron në qëllimin e VNM të kërkuara për ato projekte që bien të jenë Kategoria A sipas Bankës Botërore dhe Ligjit shqiptar mbi VNM- Shtojcën II. Disa projekte (p.sh., menaxhimin e ujërave të zeza) konsiderohen si Kategoria A, sipas shqyrtimit të Bankës Botërore, ndërsa të njëjtat aktivitete / projekte sipas Ligjit Shqiptar do të kërkojnë vetëm një VNM të Përmbledhur për popullsi më pak se 150.000, përveç nëse ARM vendos që projekti duhet t'i nënshtrohen një VNM të Thelluar, siç u diskutua më sipër.

Ky projekt i propozuar do të përfshijë rehabilitimin e nënstacioneve / ndërtimin dhe shtrimin e kabllave nëntokësore, këto do të pranohen më së shumti si ose në Shtojcën II ose asnjë Shtojcë sipas ligjit Shqiptar. Megjithatë, këto do të trajtohen në Kategorinë B sipas Op BB 4.01. Për nën- projektet të cilat konsiderohen si në Shtojcën II sipas ligjit Kombëtar, një Përmbledhje VNM-ve do të përgatitet dhe do të merret aprovim. Përveç kësaj, një PMMS e pjesshme do të

jenë përgatitur për të përmbushur kërkesat e Bankës Botërore). Një konsultim publik do të mbahet për nën- projektet dhe në qoftë se më shumë se një nën- projekt është planifikuar në të njëjtin rajon , takime të përbashkëta mund të jetë organizuar nga CEZ Shperndarje .

3. MONITORIMI I PROJEKTIT, DOKUMENTACIONI, KONSULTIMI

3.1. Përshkrimi i projektit

Siç përcaktohet në seksionin e prezantimit të mësipërm, 2 komponent i këtij projekt përfshin: Ndërtimi i nënstacioneve të reja 110/20 kV dhe linjave përkatëse nëntokësore kabllore TL (Tensioni i lartë për lidhje me Sistemin e Transmetimit Shqiptar. Projekti gjithashtu do të zhvillojë në rrjetin përkatës të tensionit të mesëm dhe të ulët, të cilat përbëhen në ndërtimin e linjave TM nëntokësore kabllore, stacionet e transformatorëve dhe linjave të tensionit të ulët ABC. Për më tepër, do të ketë disa investime për rehabilitimin dhe përmirësimin e sistemit ekzistues të faturimit dhe të shpërndarjes menaxhim të rrjetit.

Është një listë tentative e investimeve të identifikuara në kuadër të projektit të BB. Lista është paraqitur më poshtë (tabela 1). Edhe pse lista e investimeve janë në vend, rruga e saktë e kabllorëve, vende të stacionit transformator / koordinatat, gjurmë të saktë të nënstacioneve, numri i ushqyesve etj, ende nuk janë përcaktuar. Puna e më tejshme është e nevojshme për kompletimin raportet e tyre përfundimtare, desinin e fizibilitetit. Prandaj puna kornizë përgatitet dhe sa më shpejt që harton fundit dhe studimi i fizibilitetit janë të gatshëm dokumentet mjedisore dhe sociale të nën-projektit që do të përgatitet.

Tabela 1. Lista me Potencialet e Investimeve për Projektin

II	COMPONENT 2 - IMPROVE THE SYSTEM'S EFFICIENCY IN DISTRIBUTION SECTOR		
A	Substations subcomponent		
1	Tirana 110/20 kV NST-1 substation (GIS with 2x40 MVA) (including 110 kV 5 km Cable Line and 110 kV Line Bay)		
2	Tirana 110/20 kV KOMBINAT substation (outdoor with 2x40 MVA including 110 kV 3 km OHTL)		
B	Medium Voltage subcomponent		
1	20 kV Metal Clad Switchgears for substations	pcs	20
2	20 kV Cable Line (XLPE AL 3x1x185mm ² single phase cable twisted for three phase) and accessories	km	300
3	20/0.4 kV Transformation Points (cabins) with 400 kVA Transformer	pcs	500
4	Three phase Meters including CT and accessories (for existing MV/LV Cabins)	pcs	12,000
C	Low Voltage subcomponent		
1	Integrated Single Phase Meters with Plastic Box and Limiters (MCB)	pcs	30,000
2	Three phase Meters (for non-household LV consumers and for existing metallic collective boxes)	pcs	50,000
4	Single phase Meters (for existing metallic collective boxes)	pcs	200,000
5	LV ABC Line (with three phase four conductors cables, Accessories and concrete poles)	km	1,250
6	LV Concentric single phase cables (2x 5 mm ²) and accessories	km	750
7	LV PVC three phase four conductors (4x95 mm ² and 3x120+95 mm ²) and accessories	km	300
D	Investment in Billing System (Customer data base, billing, customers care and modern commercial system)		
E	Investment in distribution network management and capacity building		
F	Physical and Price contingencies	%	10

Më poshtë në hartë dhe fotografitë janë paraqitur për të dhënë një ide të përgjithshme në lidhje me vende të nën-projektit.



Figure 1. Harta tregon zonat potenciale për nën-projektet në lidhje me rikonstruksionin e rrjetit të Mesme dhe të Tensionit të Ulët në fushën e Bathores dhe Paskuqan-Babrru

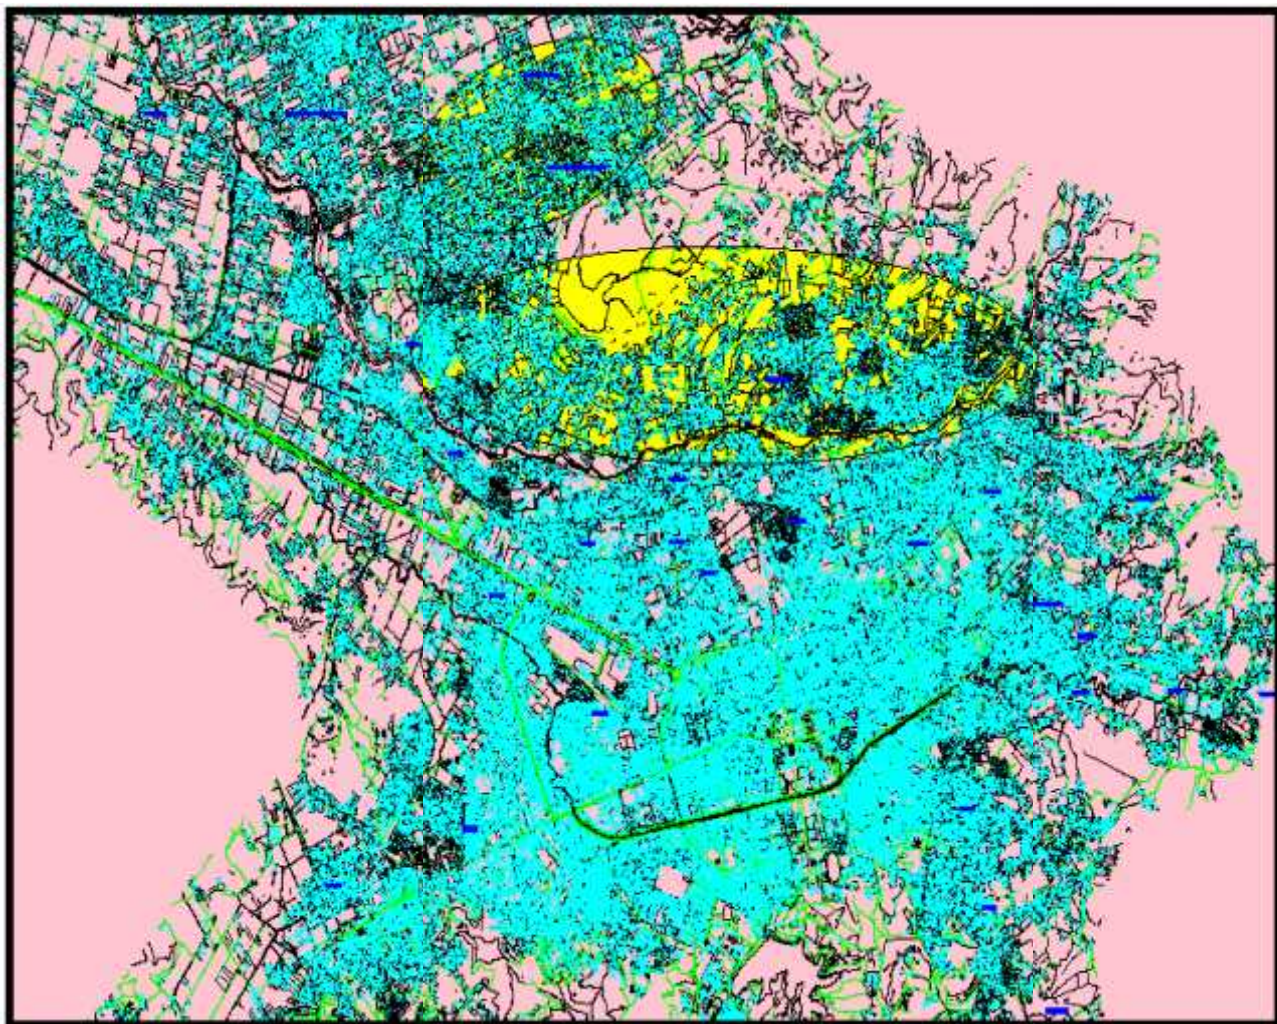


Figura 2. Fotot më poshtë tregojnë zonat potenciale për nën-projektet





Përmbledhje e ndikimeve të mundshme:

Ndikimet e mundshme në lidhje me këtë projekt do të dalin nga nënstacionet dhe kablllove nëntokësore. Të dyja llojet e projekteve do të ketë ndikime të ngjashme dhe masat përkatëse zbutëse dhe monitoruese. Projekti do të përbëhet nga të ndërtimi / rehabilitimi i nënstacioneve në vendet e tyre ekzistuese deri në masën e mundshme. Prandaj, nuk ka ndikime në shkallë të madha janë paraparë në vend se do të ketë ndikime të zakonshme të ndërtimit.

Ndikimet do të jenë të lidhura me pluhur, zhurma, mbetjet e ngurta, brezin e ujërave të zeza gjatë aktiviteteve të ndërtimit, humbja e habitateve për gjurmë të nënstacioneve (për kabllot nëntokësore kjo nuk është një çështje e madhe), etj shëndetin dhe sigurinë dhe menaxhimin e trafikut në punë dhe siguria e këmbësorëve gjatë fazës së ndërtimit është gjithashtu një çështje kritike. Ndikime gjatë fazës operative janë kryesisht të lidhura me menaxhimin e gazit SF6, asgjësimin e vajrave gjeneruese nga punimet e mirëmbajtjes të nënstacioneve, etj

Implikimet sociale të nën-projekteve duhet të merren parasysh në PMMS. Çështjet shoqërore mund të përfshijnë procesin e konsultimit publik, kërkohet mekanizëm i ankesave nga riparimi, dhe informacion të shkurtër në lidhje me çështjet e marrjes së tokës (nëse ka). PMMS nuk do të hyjë në detajet e marrjes së tokës dhe masat zbutëse; në vend të kësaj ajo do të referohet planit të veprimit plan blerja e tokës / rivendosja në qoftë se ajo është e nevojshme në përputhje me kuadrin e politikave të zhvendosjes . (në rastin e ndërtimit të ri ose nuk është tërësisht në sipërfaqen ekzistues të nën-stacionit ose shtrimi i kablllove nëntokësore përfshihen disa blerje të tokës nga tokë private).

Si për hartimin e projektit investimet konkrete dhe gjurmët e zonave nuk janë përcaktuar ende. Ndikimet e mundshme që mund të shkaktojë Reagimin Operacional 4.12 Politikës zhvendosjen e detyruar - mund të jenë investime sipas komponentëve të dytë në qoftë se projekti do të financojë nënstacioneve të reja dhe në qoftë se vendndodhja e nënstacioneve të reja është e vendosur të jetë në tokë private ose çdo tokë që është në përdorim nga personat privat ose subjekteve.

Potencialisht, edhe investimet të tilla si shtrimin e kablllove nëntokësore mund të çojë në marrjen e përkohshme të tokës ose të drejtën e mënyrës marrëveshjeve me përdoruesit e tokës qoftë kabllor do të kalojë nëpër një tokë private. Edhe pse, praktika është për të shtruar kabëll nëntokësore paralel me rrugët. Duke pasur parasysh natyrën programatike dhe hartimin e projektit, projekti do të financojë një sërë investimesh që do të jenë definitive gjatë zbatimit të projektit , me vlerësimin e projektit nuk mund të përcaktohet ndikimi i saktë , ose nëse do të ketë ndonjë ndikim në tokën private apo në tokën në përdorim apo ndonjë zhvendosje . Edhe në qoftë se ajo është një ndikim i rastit do të jetë marginal. Kështu projekti ka përgatitur Kornizën e Politikave të Zhvendosjes - KPZH dhe kjo Kornizë do të drejtojë ndonjë ndikim të mundshëm i cili do të rezultojë në blerjen e tokës ose të përhershme ose të përkohshme ose zhvendosje ose humbje të të ardhurave. Gjatë zbatimit të projektit , nëse ndonjë investim i financuar nga ky

projekt do të rezultojë në blerjen e tokës apo zhvendosjes së projekti do të përgatisë faqe të veçantë Planin e Veprimit për Zhvendosje të përcaktuara në këtë Kornizë .

Ndikimi, masat zbutëse dhe kërkesa për monitorimin e aktiviteteve të propozuara të projektit janë paraqitur në detaje në një Tabelë për “Zbutje dhe Monitorimin” si Shtojca B. Kjo tabelë duhet të përdoret si një mjet udhëzues dhe PMMS e nën-projektit duhet të jetë vend specifik dhe mund të ketë ndonjë shtesë / më pak zbutjen dhe kërkesat e monitorimit.

3.2. Dokumentacioni

Pjesërisht Vlerësimi Mjedisor dhe Social dhe/ose Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për nën-projektet do të përgatitet nga konsulent NJZP dhe do të dorëzohet në BB për shqyrtim.

Një format mostër për përgatitjen PMMS është dhënë në Shtojcën A (Formati Shembull për një Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social) të këtij dokumenti. Formatin do të rishikohet dhe zgjerohet në bazë të karakteristikave të lokacionit specifik. Duhet gjithashtu të theksohet këtu se dokumentet e nën-projektit duhet të përfshijnë jo vetëm zonën e gjurmë nënstacionit, por edhe rrugët e hyrjes, dhe linjat e transmetimit të energjisë, nga nënstacioni në rrjetin kombëtar.

Për projektet të cilat mund të kenë nevojë një ESA të pjesshme, formati do të jetë i ngjashëm me një PMMS përpunuar. Përshkrimi i projektit Seksioni, ndikimet dhe seksione zbutëse duhet të jetë më e detajuar në mënyrë që të sigurojë shpjegim të qartë rëndësinë e ndikimeve dhe ndikimet e mbetura pas zbutjes. Nevoja për përgatitjen e një ESA të pjesshme në vend të një PMMS dhe formatin e një ESA të pjesshme do të vendoset në konsultim me BB. PWR nën-projektet do t'i nënshtrohet rishqyrtimit paraprak nga BB, CEZ-Shpwrndarje do të bëjë rekomandimet për BB për të përgatitur ose një PMMS ose një ESA të pjesshme dhe rekomandimi i tyre do të konfirmohet ose të rishikohet nga BB.

Miratimet kombëtare hapësirat mjedisore duhet gjithashtu të përfshihen në ESA pjesshme. Për nën-projektet që kërkohet përgatitja e VNM-sw sw Përmbledhur për ligjin kombëtar, ajo do të jetë e lehtë për nxjerrjen e informacionit për përgatitjen e PMMS / ESA sw pjesshme. Nuk mund të jenë disa projekte që nuk do të bien në ndonjë aneks sipas ligjit kombëtar, prandaj nuk do të jenë të nevojshme për CEZ –Shpwrndarje për të përgatitur një dokument mjedisor për pastrimin kombëtar. Në këto raste, CEZ-Shpwrndarje do të përgatisë vetëm PMMS / ESA pjesshme dhe ta dërgojë atë në BB për rishikim. Mos-prapësimi nga BB do të jetë një parakusht për NJZP-ve për ta cuar në procesin e tenderimit.

Nëse vendoset që projekti është në Kategorinë C, nuk është i nevojshëm asnjë Dokumentacion për masat mbrojtëse mjedisore. Megjithatë, një kujdes mjedisor dhe social duhet të kryhet për të kontrolluar kushtet ekzistuese mjedisore të nën-projektit.

3.3. Konsultimi

Me qëllim që të mos të futet një kufizim kohor për informimin e publikut në lidhje me projektet e Kategorisë B që kërkojnë PMMS dhe ESA të pjesshme, duhet që broshurat që përshkruajnë projektin e planifikuar duhet të shpërndahen në koordinim me NJZP / drejtoritë rajonale, siç ka qenë deri më sot; Komentet dhe sugjerimet e njerëzve duhet të mblidhen për minimum 15 ditë duke lënë informacionin e kontaktit të zyrave kryeplakut; dhe të gjitha këto procedura duhet të përfshihen në PMMS së bashku me komentet dhe sugjerimet që u përcollën.

Informacioni i projektit duhet të bëhet public përmes broshurave apo njoftimeve të gazetave, me një shënim ku thuhet se komentet dhe sugjerimet do të mund të barten në zyrën kryeplakut lidhur me të. Kështu, kufizimi kohor për komentet dhe sugjerimet duhet të eliminohen dhe komunikimi me publikun duhet të lehtësohet në një afat kohor më të gjerë.

Pas përgatitjes së projekt-PMMS (ose ESA pjesshëm) dokumentet e nën-projekteve, në (anglisht dhe shqip) do të dërgohet në zyrat përkatëse të Bashkisë së bashku me broshurat me përshkrimin e projektit.

"Kështu, palët e interesuara (institucionet dhe organizatat publike, OJQ-të, njerëzit e lokale, universitete, etj) që kanë një pamje rreth projektit mund të arrijnë dhe të shprehin kërkesat e tyre për informacion më të hollësishëm rreth projektit ose PMMS dhe / ose kërkesat e tyre për mbajtjen e një takim". Konsultimet publike do të kryhet për nën-projektet që nga të gjitha nën-projektet janë supozuar të jetë me natyrë Kategoria B. Nëse disa nën-projekte janë planifikuar në të njëjtën zonë, konsultimet e përbashkëta publike gjithashtu mund të kryhet. Dokumentimi i takimeve konsultative që do të mbahen për nën-projektet do të përfshihen në dokumentacionet përkatëse ESAS të pjesshme të nën-projekteve. Dokumentacioni do të përfshijë: shpallje së ftesës, lista e pjesëmarrësve, foto, pyetjet / komentet që e publikut / palët e interesuara dhe përgjigjet e ofruara.

Konsultimi publik në lidhje me fushëveprimin e këtij kuadri të menaxhimit mjedisor dhe social është dhënë në Kapitullin 4.

3.4. Shqyrtimi dhe Miratimi

Për të gjitha nën-projektet e Kategorisë B versionet anglisht të përfundimtar PMMS / ESA të pjesshëm do të dorëzohen në Bankën Botërore nga NJZP për shqyrtim dhe miratim. Një format mostër e një PMMS / ESA i pjesshëm është treguar në Aneksin A. Nuk ka shqyrtim mjedisore dhe / ose procedura e miratimit për nën-projektet e Kategorisë C . Pas shqyrtimit dhe asnjë-kundërshtimit PMMS / ESA i pjesshëm mund të pranohet si përfundimtare dhe procedurat për dhënien e informacioneve shpjeguese mund të ndiqet.

3.5. Zbulimet

Materialet përfundimtar PMMS / ESA e pjesshme do të jetë e hapur për publikun në zyrat lokale të NJZP-t, ku ai do të jetë i përshtatshëm për njerëzit që jetojnë në ose në afërsi të zonës ku projekti është që të zbatuar. NJZP do të bëjë atë në dispozicion në faqen e saj si: Versioni në gjuhën shqipe / angleze do të dërgohet në Bankë për dhënien e informacioneve shpjeguese në zyrën informative të Bankës Botërore.

Nëse ka një plan i veçantë për menaxhimin e aseteve fizike-kulturore, ajo gjithashtu duhet të shpaloset në gjuhën shqipe siç u përmend më lart dhe gjithashtu duhet të ndahet në zyrën informative në anglisht.

3.6. Kushtet e Zbatimit / Detyrimet

RAportet e PMMS / ESAS e pjesshme janë angazhime nga NJZP ndaj Bankës Botërore lidhur detyrimeve ligjore sipas Marrëveshjes së Huasë për të zbatuar ato gjatë gjithë jetës së projektit. Kështu, para se të lidhet kontrata, Kontraktuesi i ndërtimit, NJZP do të sigurojë që të gjitha dokumentet e ofertave përmbajnë kushte (ose artikuj) duke specifikuar se PMMS së miratuar janë pjesë e kushteve që të veprojnë në përputhje me të e duhet të përfshihen në të gjitha dokumentat e tenderit dhe të kontratave . Ky do të jetë ligjërish e detyrueshme nga kontraktorët qw ajo duhet të jetë konciz dhe të përmbajë vetëm masat e nevojshme, jo rekomandimet e paqarta.

Monitorimi i performancës së kontraktorit gjatë ndërtimit do të kryhet nga palët përgjegjëse të përcaktuara në planin e monitorimit. NJZP do të jetë autoriteti për të bërë kontroll përfundimtar në lidhje me punën e Kontraktuesit lidhur me specifikimet përkatëse në dokumentet e tenderit dhe PMMS. Për rastin e një raporti të VNM-së (në pajtim me Rregulloren e VNM-shqiptare), NJZP do të ketë në "linjë të parë" përgjegjësinë për sigurimin e pajtueshmërisë me kushtet e PMMS. Pra, në rast se dokumenti mjedisor përgatitur për BB është e ndryshme nga dokumentat mjedisor për autoritetet kombëtare, NJZP është agjencia fundit përgjegjës për auditimin dhe për të siguruar se kushtet në raport mjedisor shqiptar janë plotësuar, dhe NJZP do të jetë monitorimi veprat kundër si EA kombëtare dhe BB PMMS / ESA pjesshëm.

3.7. Standardet Mjedisore / Udhëzime

- NJZP do të përdorë standardet mjedisore të Bankës Botërore (që ndonjëherë është më i rreptë) për nën-projektet.

Kriteret, standardet dhe çdo çështje tjetër relevante mund të gjenden në Rregulloren Shqiptare, Parandalimin e Ndotjes dhe zvogëlimin .Manuali i Udhëzimeve të Shëndetit Mjedisor dhe Siguria të Bankës Botërore dhe Korporatës Financiare Ndërkombëtare.Në lidhje me këto çështje kërkesat e Rregulloreve Shqiptare do të plotësohen me siguri me të. Nëse nuk ka standarde ose

kërkesat në rregulloret Shqiptare apo nëse standardet e Bankës Botërore janë më të rrepta këto do të përdoren në ndërtimin dhe funksionimin. Dokumentet e mëdha të Bankës Botërore në lidhje me këto çështje janë Politikat e Bankës mbrojtëse, nga burimet dhe përditesimet, , të cilat janë në dispozicion nga faqja e internetit të Bankës Botërore.

3. 8. Marrëveshjet institucionale për Menaxhimin Mjedisor

Gjatë ndërtimit, NJZP, në bashkëpunim me zyrat rajonale, do të kontrollojë punën e kontraktorit për të siguruar punimet reflekton kërkesat e specifikuara në PMMS. Nëse CEZ angazhohet me konsulentët e mbikëqyrjes, ata gjithashtu do të ndajnë përgjegjësinë me CEZ për mbikëqyrjen e pajtueshmërisë me ligjet kombëtare dhe ESAS PMMS / të pjesshme . Me këtë aspekt raportet tremujore do të kërkohet nga kontraktorët e ndërtimit dhe kontrollet në vend do të bëhen po të jete e nevojshme.

NJZP do të paraqesë raportet e monitorimit (të përgatitura në bazë të miratuar të Mjedisit dhe Planet e Menaxhimit Social) për të gjitha nën-projektet e Kategorisë B në BB që do të shqyrtohen në baza tremujore.

4. KONSULTIMI ME OJQ-të LOKALE DHE GRUPEVE QË PREKEN NGA PROJEKTI

Në 2014/04/14, një takim me njerëzit lokal është organizuar në faqet e Projektit. Qëllimi i takimeve është i informimi i publikut për projektin e propozuar dhe ofron një përmbledhje të ndikimeve dhe masat për zbutjen e impakteve të mundshme, gjatë zbatimit dhe shfrytëzimit të projektit. Përfaqësues nga Cez Shperndarje (hartues të projektit) prezantuan para pjesëmarrësve materialet e mëposhtme:

- Përshkrimi i projektit: kabllot nëntokësore, zona e implementimit të projektit, Nevoja e Projektit;
- Ndikimet potenciale mjedisore;
- Masat zbutëse për ndikimet mjedisore.

Më poshtë janë fotot që lidhen me takimin e konsultimit publik në lidhje me prezantimin, publikimi në media, botimin në internet dhe të gjitha rregjistrimit nga takimi.





Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Përmirësimit Energjetik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri



CEZ SHPËRNDARJE sh.a.
Departamenti Inzhinierik
Sektori Planifikim, Zhvillim, Projektim, Standartizim

Nr. _____ Prot. _____ Tiranë, më ____ / ____ / 2014

Lënda: Kërkesë për takim
Drejtuar: Bashkia e Kamëz

Më vëmendje: Z. Xhulal MZIU
Kryetar i Bashkisë së Kamëz

I nderuar Z. Kryetar,

Në vijën të takimit verbal të realizuar me Drejtorin e Urbanistikës të Bashkisë së Kamëz me datë 08.04.2014 në ambjentet e Bashkisë së Kamëz, ju bëjmë me dije se Cez Shpërndarje ka hartuar projektin investim në zonë të ndryshme në qytetin e Tiranës dhe një nga këto zona është ajo në llothoret e cila aktualisht është nën administrimin tuaj.

Për t'ju informuar më saktësisht me përmbajtjen e projektit, rëndësia e tij në përmirësimin e parametrit të furnizimit me energji elektrike të kësaj zone si dhe me hapat që duhet të ndërmerren për të mundësuar shatërrinën e tij, kërkojmë të na mundësoni një takim dy palësh në ambjentet e Bashkisë së Kamëz, me titullare apo specialistë të strukturave tuaja që kanë lidhje me projektet zhvillimore të kësaj zone.

Nga ana jonë është caktuar si koordinatë për organizimin e këtij takimi Drejtori i Projekteve në Cez Shpërndarje Z. Elton Kristo dhe për të caktuar datën dhe orën e takimit lutemi të kontaktoni në numrin e Cel: 0694140324 ose të na shkruani në adresën e e-mailit: elton.kristo@cezshperndarje.ai

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

Me konsideratë,

Arben SEFERAJ
Administrator

CEZ Shpërndarje sh.a.
Shëqëri në Administrim të Përkohshëm



CEZ SHPËRNDARJE sh.a.
Shëqëri në Administrim të Përkohshëm
RRT 1, 1103000001

Adresë e Sh. Shëqërisë: RRT 1, 1103000001, 1103000001, Tiranë, Shqipëri
Adresë e Sh. Shëqërisë: RRT 1, 1103000001, 1103000001, Tiranë, Shqipëri



Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri



LIVE GREEN

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri



Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri





LIVE GREEN

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri



Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

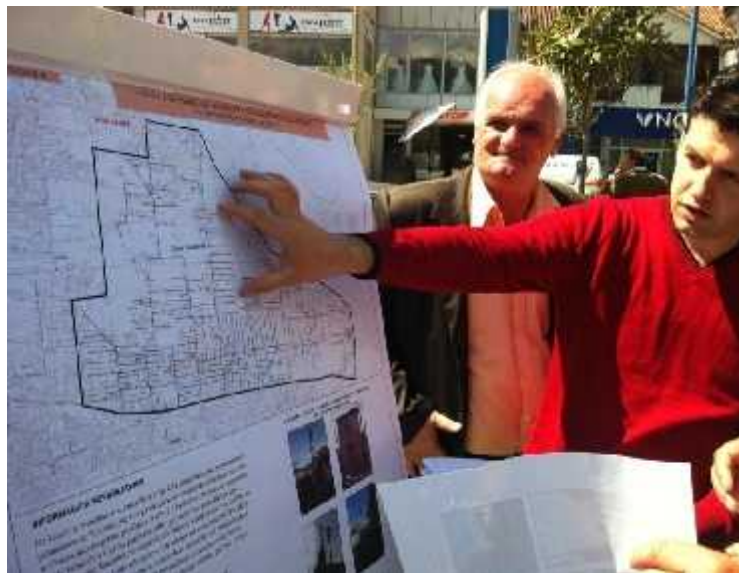

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Nr.1	LAGJE	VENDI I TAKIMIT ME PUBLIKUN	DATA	NUMERI I PERSONAVE	LISTA E PERSONAVE PJESEMARRES NE OBJEKTIV DHE ORGANIZATORET	PERMBLEDHJE E KOMENTEVE
1.	Komuna Paskuqan	Zyrat e Komunes Paskuqan	8.04.2014	6	1. Elton Kristo (Drejtor Projektimi ne Cez Shperndarje) 2. Anila Kasa (Speciealiste Mjedisi Cez shperndarje) 3. Bledar Tole (Inxhinier projektues ne cez shperndarje) 4. Fatos Rexha (Nen Kryetar ne K.Paskuqan) 5. Bledar Koskia (Shefi I Urbanistikes ne K.Paskuqan) 6. Specialist topograf ne K.Paskuqan	Takim me përfaqësues nga Komuna Paskuqan me përfaqësues te CEZ prezantuan projektin dhe sqaruan paqartesite nga përfaqësuesit e komunës.U diskutuan ndikimet sociale dhe mjedisore gjatë fazës së ndërtimit dhe shfrytezimit. Të dyja palët u angazhuan për të bashkëpunuar dhe të bëjë të gjitha përpjekjet për të pasur një proces të suksesshëm të zbatimit të projektit. Pyetje tipike te ngritura nga publiku: Periudha e implementimit te projektit(dt.fillimit dhe dt. e mbarimit), nëse do të ketë ndonjë prerje të energjisë gjatë zbatimit të projektit, çfarë do të jetë ndikimi i projektit të rrugëve ekzistuese..
Nr.1	LAGJJA	VENDI I TAKIMIT ME PUBLIKUN	DATA	NUMERI I PERSONAVE	LISTA E PERSONAVE PJESEMARRES NE OBJEKTIV DHE ORGANIZATORET	PERMBLEDHJE E KOMENTEVE
2.	Komuna Paskuqan	Zyrat e Komunes Paskuqan	14.04.2014	17	1. Elton Kristo (Drejtor Projektimi ne Cez Shperndarje) 2. Fatos Rexha Rexha (Nen Kryetar ne K.Paskuqan) 3. Bledar Tole (Inxhinier projektues ne cez shperndarje) 4. Anila Kasa (Speciealiste Mjedisi Cez shperndarje)	Banorët e komunitetit u informuan për procesin e projektit dhe ndikimin e mjedisit. Banorët e zonës, shprehën gatishmërinë e tyre për zbatimin e projektit dhe përmirësimin e furnizimit me energji elektrike. Cez shperndarje kishte përgatitur një formular për çdo koment apo objektiv që komuniteti apo anëtar duhet të

					Albana Allamani (Inxhinieri projektuese ne cez shperndarje) Avni Toska (Banor ne Babrru) Xhafer Loshi (Banor ne PAskuqan) Myftar Aliu (Banor ne Paskuqan) Binak Byberi (Banor ne Paskuqan) Ali Imeri (Banor ne Paskuqan) Ismail Gocaj (Banor ne Babrru) Arsen Hanolli (Banor ne Babrru) Yzeir Hamitaj (Banor ne Paskuqan) Hazis Vlashi (Banor ne Babrru) Faik Demi (Banor ne Babrru) Halit Leka (Banor ne PAskuqan) Besim Ferati (Banor ne Babrru)	kenë. Në të gjitha format ata konfirmojnë se projekti është shumë e dobishme dhe urgjent për rrjetin e shpërndarjes të zonës. Ata e kuptuan ndikimeve të vogla të projektit dhe do t'ia japin të gatshëmërinë e tyre për një proces të mirë të implementimit të projektit. Në përgjithësi në të gjitha ato komenton ato shprehin besimin e plotë
Nr.1	LAGJE	VENDI I TAKIMIT ME PUBLIKUN	DATA	NUMERI I PERSON AVE	LISTA E PERSONAVE PJESEMARRES NE OBJEKTIV DHE ORGANIZATORET	PERMBLEDHJE E KOMENTEVE
3.	Bashkia Kamez	Ne qender te Bashkise Kamez	14.04.2014	7	1. Elton Kristo (Drejtor Projektimi ne Cez Shperndarje) 2. Bledar Tole (Inxhinier projektues ne cez shperndarje) 3. Anila Kasa (Speciealiste Mjedisi	Banorët e komunitetit u informuan për procesin e projektit dhe ndikimin e mjedisit. Banorët e zonës, shprehën gatishmërinë e tyre për zbatimin e projektit dhe përmirësimin e furnizimit me energji



					Cez shperndarje) 4. Albana Allamani (Inxhiniere projektuese ne cez shperndarje) 5. Muharrem Munoti (Banorë ne Bathore) 1. Bashkim Koldashi(Banor ne Bathore) 2. Mislim Drogjashi (Banor ne Bathore)	elektrike. Cez shperndarje kishte përgatitur një formular për çdo koment apo objektiv që komuniteti apo anëtar duhet të kenë. Në të gjitha format ata konfirmojnë se projekti është shumë e dobishme dhe urgjent për rrjetin e shpërndarjes të zonës. Ata e kuptuan ndikimeve të vogla të projektit dhe do t'ia japin të gatshmerinë e tyre për një proces të mirë të implementimit të projektit. Në përgjithësi në të gjitha ato komenton ato shprehin besimin e plotë
--	--	--	--	--	--	--



PLANI I ZBUTJES DHE MONITORIMIT TE PARAMETRAVE PËR NËNSTACIONET DHE KABLOT NËNTOKËSORE

	TABELA E ZBUTJES					
Faza	Subektit	Masat zbutese**	Kosto	Institucioni Pergjegjes*	Data e fillimit	Data perfundimit
CONSTRUCTION	Pasuritë kulturore dhe historike	- Në rast se përkohje me ndonjë pasuri kulturore, ndërtimi do të ndalet menjëherë dhe Komiteti Kulturor i Mbrojtjes së Pasurive Natyrore do të informohet. - Deri përgjigje te vendimmarrjes, çdo veprim nuk do të bëhet e ditur ne faqen e internetit. - Pas marrjes së përgjigjes pozitive (nga asetet kulturore) ndërtimi do të vazhdojë.	Nuk ka kosto shtesë	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit
	Demontimi i nënstacionit ekzistues (e vlefshme për nënstacionet)	- Të gjitha pajisjet e tepërta dhe mbeturinat do të mblihen veçmas dhe kur është e mundur, këto materiale do të riciklohen nga një firmë e licencuar. - Azbesti përmban materiale do të hidhen nga firmat e licencuara për deponimin e mbeturinave të rrezikshme	Të përfshira në kontratën e ndërtimit	Kontraktori	Fillimi i punimeve çmontimit	Përfundimi i punimeve të çmontimit
	Pluhuri - grimcat	- Vlera e rregulluara kufi per Pluhurin / e grimcuar çështje emetimit të jenë 3 mg/Nm3 (Rregullorja Kontrollit Industrial Ndotja e ajrit) nuk duhet të tejkalohet. - Lotim do të bëhet në sezonet e thatë - Ngarkimi dhe shkarkimi do të kryhet me kujdes dhe pa shpërndarje. Në mënyrë që të mos çojë në shpërndajnë, ngarkim / shkarkimit punimet do të kryhen në një zonë të caktuar për ngarkim / shkarkimin dhe ujitje spraj do të përdoret në zonën e ngarkimit / shkarkimit. Për më tepër, punëtorët janë paralajmëruar te jenë të kujdesshëm në lidhje me aktivitetet e ngarkim / shkarkimin. Lekurat me erë nuk do të përzgjidhen për ngarkim / shkarkimit nëse është e aplikueshme. - Kamionët do të jenë të mbuluar me kanavacë, etj dhe kufizimi shpejtësi do të aplikohet. Kufiri i shpejtësisë në kamionë është 30 km / orë (në faqen e projektit) dhe 50 km / orë (e jashtme të vendit të projektit - brenda qytetit) - Gomat e kamionëve do të pastrohen kur është e nevojshme për të parandaluar papastërtitë që po kryhen në rrugë	Të përfshira në kontratën e ndërtimit	Kontraktori	Filloni e gërmimeve	Përfundimi i punimeve të gërmimit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjistik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

	TABELA E ZBUTJES					
Faza	Subektit	Masat zbutese**	Kosto	Institucioni Pergjegjes*	Data e fillimit	Data perfundimit
CONSTRUCTION	Noise	- Të gjitha punimet e ndërtimit do të bëhet 07:00-19:00. Në qoftë se kjo është e nevojshme për të punuar pas 7, autoritetet lokale dhe publiku do të informohet për këto orare të punës. - Njerëzit, që jetojnë në qendrat e popullsisë përreth, do të informohen për zgjatje të punës. - Puna e vazhdueshme e internetit zhurmë (herë në ditë) do të sigurohet që të jetë nën 70 dBA (sipas Rregullores Shqiptare për Vlerësimin dhe Menaxhimin e Zhurmës në Mjedis. Për të plotësuar këtë; - Makinat e ndërtimit (automjeteve) inspektimit, mirëmbajtjes dhe vajosje do të bëhet në kohë dhe në mënyrë periodike, dhe artikujt që rezultojnë në zhurma do të zëvendësohen.	Nuk ka kosto shtesë	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit
	Ëasteëater	Punimet e Ujërave të ndotura do të jepet për mbikqyrje sistemit të kanalizimit të zones përkatëse për tu lidhur me sistemin e kanalizimit.	Të përfshira në kontratën e ndërtimit	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

TABELA E ZBUTJES						
Faza	Subektit	Masat zbutese**	Kosto	Institucioni Pergjegjes*	Data e fillimit	Data perfundimit
	Excavation, solid and hazardous eastes due to construction	- Mbetjet Gërmimet do të depozitohen në zonën e gërmimit deponimit të mbeturinave të licencuar nga Njësia përkatëse. - Mbetjet e ngurta (materialeve të ndërtimit të tilla si metali, druri etj) dhe mbeturinave të paketimit (plastike, letër, qelq etj) do të jetë sistematike dhe veç e veç të mbledhura dhe do të sigurohet që do të merren nga Bashkia apo riciklimi firmë e licencuar. - Mbeturinat organike të brendshme për shkak të punëtorëve / personelit do të mblidhen veçmas dhe do të sigurohet që do të merren nga komuna përkatëse dhe të predispozuar për gjetjen e zonës së mbeturinave urbane afër fshatit. - Mbetje të rrezikshme të tilla si nafta, bojë etj do të mblidhen veçmas në provë rrjedhje, metalike dhe kontenierë të etiketuar dhe ajo do të sigurohet që do të merren nga një firmë e licencuar sigurohet nga kontraktori.	Nuk është e larte	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit
	Eastes due to vehicle parking	- Mirëmbajtja e automjeteve nuk do të bëhet në vendin e projektit, përveç nëse ekziston një situatë emergjente - vaji i mbeturinave për shkak të makinave të ndërtimit dhe automjeteve do të mblidhet në fuçi dhe do të dërgohet në një firmë e licencuar nga kontraktuesi. - Fuçitë do të vendosen mbi një tokë të ngjeshur për t'i mbrojtur ata nga shiu dhe dielli dhe do të merren të gjitha masat e nevojshme kundër zjarrit. Zona ku do të i jenë të vendosur fucitë do të jetë i rrethuar me shenjë paralajmëruese. Zjarrfikëse vendosur (kovë, sëpatë, lopatë, kazma, dhe spirancë) do të jetë në atë zonë. - bateri, goma dhe artikuj të ngjashëm për shkak të makinave të ndërtimit dhe automjeteve do të dërgohet në një firmë e licencuar për depozitim përfundimtar.	Nuk është e larte	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

	TABELA E ZBUTJES					
Faza	Subektit	Masat zbutese**	Kosto	Institucioni Pergjegjes*	Data e fillimit	Data perfundimit
CONSTRUCTION	Health and Safety	- Të gjitha pajisjet e nevojshme mbrojtëse (kokore mbrojtëse, rrip sigurimi, rroba mbrojtëse, doreza, syze etj) do të jetë kusht për punëtorët - Shenjat e duhura për njoftim do të vendosen për të ruajtur sigurinë e popullit publike dhe lokale - Personeli do të trajnohen për çështje të "shëndetit të punës dhe sigurisë në punë". Informacion në lidhje me rregullat e sigurisë që duhet të zbatohet brenda zonës së punës se internetit gjatë veprave të ndërtimit, rreziket dhe rregulloret përkatëse do të sigurohet për të gjithë punëtorët para se të fillojnë punimet e ndërtimit.	Brenda Buxhetit të projektit	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit
	Landscape	- Puna e internetit do të rivendoset. - Jo të rrezikshme, të ngurta, të lëngshme, mbeturinat e ndërtimit do të mbetet në vend.	Brenda Buxhetit të projektit	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Duke marrë nënstacionin në dorezim
CONSTRUCTION	Habitats (flora/fauna)	- Të gjitha habitateve natyrore të njohura, ligatinat dhe zonat e mbrojtura në afërsi të aktivitetit nuk do të dëmtohen apo të shfrytëzohen, për gjithë stafin do të ndalohet rreptësisht që të gjuajë, prerjet e foragjereve ose aktivitete të tjera të dëmshme. - Një studim dhe një inventar bëhet nga pemë të mëdha në afërsi të aktivitetit të ndërtimit, pemë të mëdha do të shënohen dhe rrethohen me gardh, sistemi i tyre rrënjë të mbrojtura, dhe çdo dëmtim të pemëve shmanget - ligatinat dhe përrenjtë në afërsi do të mbrohet nga vendin e ndërtimit të lidhura me erozionin dhe sedimentin, - Nuk do të lejohen gropa të palicencuara të marrë hua, gurorët apo deponitë e mbeturinave në zonat e afërta, vecanërisht në zonat e mbrojtura.	Brenda Buxhetit të projektit	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Duke marrë nënstacionin në dorezim

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

TABELA E ZBUTJES						
Faza	Subektit	Masat zbutese**	Kosto	Institucioni Pergjegjes*	Data e fillimit	Data perfundimit
CONSTRUCTION	Traffic and Pedestrian Safety	Në përputhje me rregulloret kombëtare, kontraktuesi do të sigurohet që vendi i ndërtimit është i mbrojtur mirë dhe trafiku ndërtimi i lidhur dhe i rregulluar. Kjo përfshin por nuk kufizohet në: - Sinjalistika, shenja paralajmëruese, pengesa dhe shmangje të trafikut: faqe do të jetë qartësisht i dukshëm dhe publiku do të paralajmërohet nga të gjitha rreziqet e mundshme - Sistemi i menaxhimit të trafikut dhe trajnimi i stafit, veçanërisht për qasje se internetit , në trafik të rëndë. Sigurimi i kalimeve të sigurta dhe vendkalimet për këmbësorë ku ndërhyr trafiku ndërtimit. - Përshtatja e orëve të punës me modelet e trafikut lokal, p.sh. shmangja e veprimtarive të mëdha të transportit gjatë orëve të pikut të trafikut ose kohë të lëvizjeve të bagëtive - Menaxhim aktiv i trafikut nga staf të trajnuar dhe të dukshme në vend, në qoftë se kërkohet për kalimin e sigurt dhe të përshtatshëm për publikun. - Sigurimi i aksesit të vazhdueshëm dhe të sigurt për tek objektet e zyrës,, dyqanet, dhe rezidencat gjatë veprimtarive rinovuese, në ndërtesat që rrine hapur për publikun.	Brenda Buxhetit të projektit	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Duke marrë nënstacionin në dorezim
	Social	Blerja e tokës (nëse ka) dhe procesi i ankimimit do të udhëhiqet nga Kuadri i Politikave për Zhvendosje	Brenda Buxhetit të projektit	CezShperndarje, MoEI	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Duke marrë nënstacionin në dorezim
	Social	Për çdo ndërtim të mundshëm të nënstacioneve një herë vendimi paraprak është bërë, lagjja do të konsultohet	Brenda Buxhetit të projektit	CezShperndarje, MoEI	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Duke marrë nënstacionin në dorezim

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor

Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

TABELA E ZBUTJES						
Faza	Subektit	Masat zbutese**	Kosto	Institucioni Pergjegjes*	Data e fillimit	Data perfundimit
OPERATION	Noise	- Vlerat kufi (Lperidhadites: 65 dBA, Lperiudhanates: 55 dBA) të rregulluara në Vlerësimin Mjedisor të Zhurmave në Shqipëri, kjo Rregullore Kontrolli nuk do të tejkalohet. Për të kënaqur këtë kufijtë; - Pajisje formimin nënstationi do të specifikohen në dokumentet e tenderit dhe të ofruara në përputhje me Komisionin Ndërkombëtar të Elektroteknikës (IEC) 60076-10 dhe standardet e tjera ndërkombëtare (Për transformatorët 154 kV ≤ 60 dBA në burim / Për transformatorët 380 kV ≤ 70 dBA në burim).	Brenda Buxhetit të projektit	NJZP Transmission Netëork Operation Maintenance Department	Duke marrë nënstationin në dorezim	Përfundimi i jetës ekonomike të nënstationit
OPERATION	Electro-Magnetic Field (EMF)	- Vlerat kufi (5 kV / m për fushën elektrike / për publikun , 1000 mg për fushën magnetike (24 orë / ditë) , 10 kV për fushën elektrike / për mundime , 5000 mg për fushën magnetike (8 orë / ditë) përmendur në Komisionin Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi Jo - Jonizues (ICNIRP) do të përmbushen . Në mënyrë që të plotësojë këtë kufizim do të bëhet si në vijim ; - Siç është përcaktuar në dokumentet e tenderit , të gjitha pajisjet e nënstationit (transformator , ndarësit , siguresa , transformator aktuale, tensionit të transformatorit etj) do të merren sipas Komisionit Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC) dhe standardet e tjera ndërkombëtare dhe kontrollet dhe mirëmbajtjes (forcimi nga rinovimit) do të bëhet në pajtim me IEC . - nënstation do të jetë i rrethuar me mur dhe gardhe . Prandaj , hyrja , qasja , dhe shlyerja do të shmanget . - Ndërtesat e nënstationit , pajisjeve , muret dhe gardhet do të jenë të bazuar . Në çdo rast e shenjë të një dështimi (si dështim në funksionimin e një pajisje , rritjen e kontaktit aktuale , hark elektrik, ngrohjes etj lokal)rezistenca argumentim do të matet dhe në përputhje me matjen e rezultateve.	Brenda Buxhetit të projektit	NJZP	Duke marrë nënstationin në dorezim	Përfundimi i jetës ekonomike të nënstationit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

	TABELA E ZBUTJES					
Faza	Subektit	Masat zbutese**	Kosto	Institucioni Pergjegjes*	Data e fillimit	Data perfundimit
OPERATION	Health and Safety	- personeli do të përzgjidhet nga njerëzit që janë trajnuar në ndihmën e parë, siguria elektrike, duke punuar në nivele të larta për mirëmbajtje të nënstacionit - Shenjat paralajmëruese dhe barrierat ngjitje do të vendosen rreth e nënstacionit.	Jo të lartë (si pjesë e buxhetit të operimit)	NJZP Zyrat e NJZP	Duke marrë nënstacionin në dorezim	Pas përfundimit të jetës ekonomike të nënstacionit
	SF6	Gazi SF6 do të monitorohet vazhdimisht me matjes presioni dhe rrjedhjet e gazit do të kontrollohen. Në rastin e rrjedhjes së gazit (para se dendësia e gazit SF6 bie nën nivelin kritik), do të mbyllet dhe ajo pjesë që do të jetë jashtë shërbimit derisa problemi është zgjidhur.	Jo të lartë (si pjesë e buxhetit të operimit)	NJZP Departamenti Mirëmbajtja e Rrjetit të Operimi dhe Transmisionit	Duke marrë nënstacionin në dorezim	Pas përfundimit të jetës ekonomike të nënstacionit
	Fire Risk	- Nënstacioni i cili do të themelohet si të elementeve të sigurisë nga zjarri në "Intensiteti Elektirk Rregullorja aktuale" të kontrollohen rregullisht dhe të gjitha pajisjet, mirebahet, testuar, rehabilituar dhe rinovohet (në aspektin e parametrave si unazë, SF6 , vaj izolimin, përfundon kabllor dhe rrjedhje të gazit). - Të gjitha paisjet do të testohen sipas harkut kombëtare dhe ndërkombëtare të standarteve para ndezjes.	Jo të lartë (si pjesë e buxhetit të operimit)	NJZP Zyrat e NJZP Departamenti i Mirëmbajtjes se Rrjetit të Operimi dhe Transmisionit	Duke marrë nënstacionin në dorezim	Pas përfundimit të jetës ekonomike të nënstacionit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

TABELA E ZBUTJES						
Faza	Subektit	Masat zbutese**	Kosto	Institucioni Pergjegjes*	Data e fillimit	Data perfundimit
	Substation oil	- vaji Nënstacionit do të analizohet fizikisht dhe kimikisht (dendësia, aciditetit, viskozitetit, sulfide korrozive, PCB, ngjyra). - Kur nafta kompleton jetën e saj ekonomike, ajo do të zëvendësohet me një të re dhe asgjësimi i saj do të sigurohet nga kryerja e testeve të kërkuara (për të përcaktuar kategorinë e vajit), dhe duke aplikuar metodën e duhur të nxjerrë jashtë përdorimit si për rezultatet e testimit dhe kategorinë. - PCB kurrë nuk do të përdoren si vajra zëvendësim.	Not high (as a part of operation budget)	NJZP Zyrat e NJZP Departamenti i Mirëmbajtjes së Rrjetit të Operimi dhe Transmisionit	Duke marrë nënstationin në dorezim	Pas përfundimit të jetës ekonomike të nënstationit
	Solid-Liquid and Hazardous Eastes	- Mbetjet e ngurta, materialet vjeturina dhe mbetjet e ndërtimit do të mblidhen veç e veç dhe ata do të sigurohet që do të merren nga njësi përkatese, ose një firmë e licencuar - Mbeturinat të tilla si vaj, bojë do të mblidhen në të veçantë, në enë të papërshkueshme, metalike dhe kontinier të etiketuar dhe do të sigurohet që do të merren nga një firmë e licencuar riciklimi	Not High (changing by depending on municipalities and/or licensed recovery plant)	NJZP Zyrat e NJZP	Duke marrë nënstationin në dorezim	Pas përfundimit të jetës ekonomike të nënstationit
	Social	Projekti do të krijojë qytetarëve reagime mekanizëm për të adresuar ankesat gjatë operacionit dhe çdo gjë tjetër të lidhur me ankesave projektit.	As a part of operation budget	CEZshperndarje	Duke marrë nënstationin në dorezim	Pas përfundimit të jetës ekonomike të nënstationit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

	MONITORING TABLE									
<u>Fazat</u>	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
Ndertimi	Pasuritë kulturore dhe historike	Asetet kulturore në vend	Vendi i ndërtimit	Visualisht	Në rastet kur përkon me një pasuri kulturore monitorim të vazhdueshëm nga një arkeolog	Bindja ndaj Ligjit së Mbrojtjes Natyrore dhe Mjetet Kulturore	Not high if no cultural assets are damaged	Drejtoria e Kulturës dhe Muzeut.	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Fillimi i punimeve të ndërtimit
	Demontimi i nënstacionit ekzistues (e vlefshme për nënstacionit)	Komponentet e Nënstacionit & instalimit Pajisje të tepërta dhe mbeturinat	Vendi i ndërtimit	Visualisht	Gjatë aktivitetit të demontimit	Mbeshtetur në Ligjet dhe Rregulloret Mjedisore	No additional cost (ëithin the project budget)	Zyrat e NJZP	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i aktiviteteve shembjes
	Dust – Particulate Matter	Formimi i Pluhuri shkak të Lëvizjes së Makinerive dhe rruget e në ndërtim (mg/Nm3) Ankesa nga publiku	Vendi i ndërtimit	Inspectim Visual Intervistat me njerëzit lokal pranë vendit	Gjatë periudhës së gërmimeve / punimeve intensive të ndërtimit, javore / në rastin e ankesës	Rregullorja Ndotjes Industriale e Kontrollit të ajrit.	Nuk ka kosto shtesë (në kuadër të buxhetit të projektit)	Zyrat e NJZP	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Fillimi i punimeve të ndërtimit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjistik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

	MONITORING TABLE									
<u>Fazat</u>	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
<i>Ndertimi</i>	Zhurmat	Ankesa nga publiku Niveli I zhurmës (dBA)	Vendi i ndërtimit	Intervistat që duhet të kryen në zonat pranë rezidencave Matja e nivelit të zhurmës me metër zhurmës (metër nivel të shëndoshë)	Vëzhgim (javor) Në rast të ankesës nga publiku	Rregullorja Mjedisore mbi Vlerësimin dhe Kontrollin e Zhurmave	Jo e Lartë	Zyrat e NJZP	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjistik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

	MONITORING TABLE									
<u>Fazat</u>	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
Ndertimi	Ujërat e zeza	Lidhja me sistemin e kanalizimeve, Kontaminimi ne uje dhe / ose të tokës në zonën nënstacionit	Lidhja me sistemin e kanalizimeve Zona nënstacionit	Visual (ujërave të zeza të gjeneruara nga punëtorët do të jepet në sistemin e kanalizimit të qytetit. Lidhja me sistemin e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe nëse ndonjë është shkarkuar në tokë, ujë ose për ndonjë organ pranues presin e lejuar do të vëzhgohet dhe kontrollohet)	Javore (kontrollet parregullt)	Në përputhje me Rregulloren e Kontrollit të Ndotjes së Ujit dhe Tokës.	Nuk ka kosto shtesë (në kuadër të buxhetit të projektit)	Zyrat e NJZP Bashia, Komun a	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Fazat	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
Ndërtimi	Gërmimet, Mbeturinat e ngurta dhe të rrezikshme	Magazinimi dhe deponimit të Kushteve	Vendi i ndërtimit dhe asgjësimit	Visualisht	Javore (kontrollet parregullt)	Pajtueshmëria me Rregulloren e Ruajtjes së Habitatit, Rregulloren e Kontrollit të mbeturinave të ngurta dhe Rregulloren e Kontrollit të Ndotjes tokës, Rregulloren e Kontrollit të mbeturinave të rrezikshme dhe Kontrollit të Mbeturinave nga vaji.	Nuk ka kosto shtesë	Zyrat e NJZP Kontraktori Bashika	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit
	Mbeturinat shkak të Parkimit të automjeteve	Vajërat hedhurinë, bateri automobil, goma të përdorura dhe materiale junk elektronike	Në zonën e parkimit të automjeteve	Visualisht Inspektimi dhe kontrolli i dokumenteve të mirëmbajtjes të automjeteve	Gjatë dështimit dhe mirëmbajtjen e rregullt	Arritja e dispozicion të pajtimit me Rregulloren e Kontrollit të mbeturinave të naftës, baterive dhe akumulatorëve .	Nuk ka kosto shtesë	Kontraktori	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjistik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Fazat	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
	Shëndeti dhe Siguria	Dokumentet që lidhen me trajnimin e punëtorëve me shëndetin dhe sigurinë Pajisjet e përdorura nga punonjësi gjatë punës për ndërtimin (kokore mbrojtëse, dorashka, rrip sigurimi etj) Praktik pune	Vendet e ndërtimit	Visualisht	Fillimi i çdo fazë pune Ditore	Në përputhje me Rregulloren e Shëndetit në Punë dhe Sigurisë në Punë	Nuk ka kosto shtesë (në kuadër të buxhetit të projektit)	Zyrat e NJZP	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit
Ndertimi	Peisazhi	Ëastes (construction, solid, hazardous, liquid) are left at the site, the excavated areas	Zona e projektit	Visualisht	Gjatë mbylljes së sheshit të ndërtimit	Harmonizim me Ligjin dhe Rregulloret e Mjedisit	Nuk ka kosto shtesë (në kuadër të buxhetit të projektit)	NJZP Zyrat e NJZP	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Fazat	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
	Habitatet	Çdo ndikim negativ në florë dhe faunë në zonën e projektit	Zona e projektit	Visualisht	Vazhdueshem	Harmonizim me Ligjin e Mjedisit dhe Rregulloret dhe PMMS	Nuk ka kosto shtesë (në kuadër të buxhetit të projektit)	NJZP Zyrat e NJZP	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit
	Trafiku dhe siguri këmbësorëve	Instalimi i shenjave, shpejtësia e automjeteve, etj	Zona e projektit	Visualisht	Vazhdueshem	Harmonizim me Ligjin e Mjedisit dhe Rregulloret dhe PMMS	Nuk ka kosto shtesë (në kuadër të buxhetit të projektit)	NJZP Zyrat e NJZP	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Përfundimi i punimeve të ndërtimit
Ndertimi	Social Zënie të tokës Ankesa	Procesi do të udhëhiqet përmes RPF	Zona e projektit	Mardhënie me publikun	Vazhdueshem	Për të kontrolluar respektimin e Politikave për Zhvendosje	Të përfshira në buxhetin e operimit	CEZshperndarje	Fillimi i punimeve të ndërtimit	Deri në përfundimin e jetës ekonomike të projektit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor

Procesi i Permiresimit Energjistik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Fazat	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
Funksinimi	Zhurma	Niveli i zhurmës (dBA) Ankesa Publike	Në kufi (muri) e nënstacionit Pranë qendrave të banuara	Intervistat me njerëzit lokal	Në rastin e ankesës	Kontrolli nga vlerat kufi të përcaktuara në rregullore e lidhur	Jo e lartë	Zyrat e NJZP	Duke e marrë nënstacionin në veprim	Përfundimi i jetës ekonomike të nënstacionit
	Përparësitë elektromagnetike në terren	Largësia në mes të nënstacionit dhe murit / rrethimit Dokumentet në lidhje me prokurimin e pajisjeve Argumentimi i Rezistencës (om)	Në kuadër të nënstacionit dhe nënstacionit zonës	Vëzhgimi Visual Intervistat me njerëzit në pranë zonave të banuara Argumentimi i matjes	Duke e marrë nënstacionin në operacion Çdo problem, dështim në argumentim	Kontrolli i kënaqjes së vlerave kombëtare dhe ndërkombëtare reference	Jo e lartë	Zyrat e NJZP	Duke e marrë nënstacionin në veprim	Përfundimi i jetës ekonomike të nënstacionit

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Fazat	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
<i>Funksinimi</i>	Shëndeti dhe Siguria	Trajnime teknike në drejtim të operimit dhe të mirëmbajtjes Pajisjet dhe rroba mbrojtëse (nëse kemi përdorim ose jo)	Zona e nënstacionit	Visualisht	Punimet e mirëmbajtjes në (periudhat e duhura)	Përputhje me rregulloret përkatëse shëndetësore dhe të sigurisë	Nuk ka kosto shtesë (në kuadër të buxhetit të operacionit)	Zyrat e NJZP	Duke marrë nënstacionin në veprim	Përfundimi i jetës ekonomike të nënstacionit
<i>Funksinimi</i>	SF6	Presioni i gazit SF6	Te gjitha anët	Me presion matës	Gjatë operacionit (vazhdimisht)	Pajtueshmëria me Ligjin dhe Rregulloret Mjedisit Te nevojshme gjate operimit	Nuk ka kosto shtesë (në kuadër të buxhetit të operacionit)	Zyrat e NJZP	Duke marrë nënstacionin në veprim	Përfundimi i jetës ekonomike të nënstacionit

Fazat	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
<i>Funksinimi</i>	Rrezik nga zjarri	Presionin e gazit SF6 përfundimi kabllor izolatorët Pikat e lidhjes kabllor Kontrollorët fillestar dhe sekondar	Sipërfaqja e nënstacionit	Testet teknike dhe testet standarde të mirëmbajtjes të kryera nga kontrollorët	Çdo gjashtë muaj / në rastin e mirëmbajtjes, kontrollit dhe dështimit	Për shkak të rrezikut nga zjarri Për të përmbushur kërkesat intensive të Tanishëm Elektrike ose rregulloret përkatëse të sigurisë së zjarrit, për riparimin e veshur, pjesë thyer, për të minimizuar rrezikun e aksidentit dhe për të parandaluar ndërprerjen	Nuk ka kosto shtesë (në kuadër të buxhetit të operacionit)	Zyrat e NJZP	Duke marrë nënstacionin në veprim	Përfundimi i jetës ekonomike të nënstacionit

Fazat	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
<i>Funksinimi</i>	Vajërat në nënstacion	Parametra karakteristike të vajit (densitet, aciditet, viskozitet, sulfide korrozive, pika flash, PCB, ngjyra)	Transformatorët	Analiza laboratorike fizike, kimike bëhet nga NJZP.	Janë vjetore, mujore, javore ditore, në rastin e dështimit	Kontrolli i cilësisë së vajit të nënstacionit	Jo të lartë (brenda buxhetit të operimit)	NJZP Zyrat e NJZP	Duke marrë nënstacionin në veprim	Përfundimi i jetës ekonomike të nënstacionit



Fazat	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
Funksinimi	Materie të ngurta, të lëngshme dhe mbeturina të rrezikshme (akumulator automobili, vaj nënstacion)	Ndotja brenda zonës së nënstacionit (mbeturinat, erë, etj)	Zona e nënstacionit	Visualisht	Gjatë periudhës së operimit	Pajtueshmëria me Rregulloren e Kontrollin dhe Ruajtjen e Habitatit me Rregulloren e mbeturinave të ngurta dhe Rregulloren Kontrollit të Ndotjes, Rregulloren e Kontrollit të tokës nga mbeturinat e Rrezikshme .	Nuk është e lartë (në ndryshim nga varësia e komunave dhe / trajtim i licencuar)	NJZP	Duke marrë nënstacionin në veprim	Përfundimi i jetës ekonomike të nënstacionit
		Mbeturinat e pajisjeve të dëmtuar Ndotsve në vaj të nënstacionit mbeturinave (arsenik, kadmium, Lead, Totali halogjene, PCB, ndezje pika)		Analizim	Në rastin e dezertimit, dështimi, përfundimin e jetës ekonomike të pajisjeve Përfundimi i jetës ekonomike të naftës nënstacionit	Pajtueshmëria me Rregulloren e Kontrollin e mbeturinave të vajrave	Jo të larta (në varësi të firmës / që kryen analiza laboratorike)	Bashkia Drejtoria Provinciale e Mjedisit dhe Pyjeve		

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor

Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Fazat	Subjekti	Cilat janë parametrat, të cilat do të monitorohen?	Ku do të monitorohen parametrat?	Si do të monitorohen parametrat?	Kur do të monitorohen parametrat - Frekuenca e matjeve?	Pse do të monitorohen parametrat?	Kosto	Instituti që kontrollon - frekuencën e kontrollit	Data e fillimit	Data e mbarimit
	Sociale Mekanizmi i ankesave dëmshpërblim	Regjistrimet e ankesave	Në vend të ndërtimit	marrëdhëniet publike	vazhdimisht	Për të kontrolluar respektimin e KS të Politikave për Zhvendosje	Të përfshira në buxhetin e operimit	CEZshperndarje	Fillimi i ndërtimit	Deri në përfundimin e jetës ekonomike të projektit

