




## Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORTATION				
Secteur:	TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY				
Numéro(s) de Prêt(s):	2741/BL-GY	Montant Courant Approuvé:	66.200.000,00	Initial BID:	66.200.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	66.200.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	96,00
Opération(s) Connexe(s):	GY-T1078, RG-P1442, RG-P1478	Solde:	66.200.000,00	Cofinancement/Pays:	3.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	69.200.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012
		Validé par le Représentant: 30-sep-2012

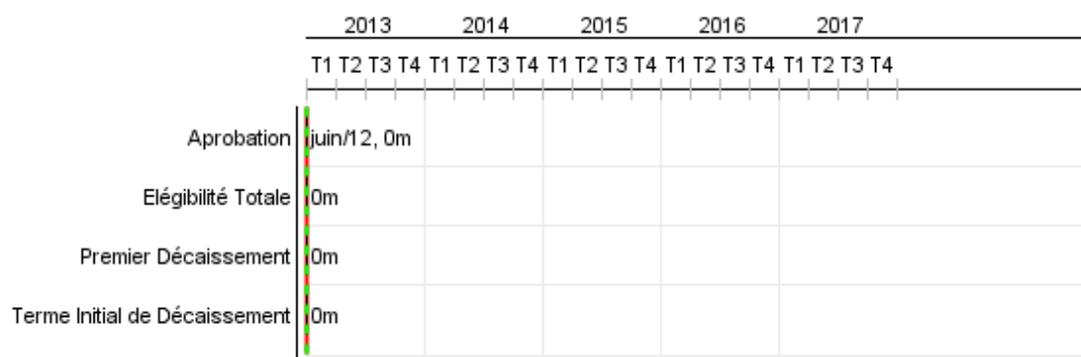

**Progrès Cumulé à 2012**

## Progrès Cumulé



**Résultats**
**Résultat:** Vehicle travel time reduced

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Average journey/trip time	%	100.00	2012	P A	85.00

**Résultat:** Vehicle operation cost reduced

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Vehicle operation cost	%	100.00	2012	P A	85.00

**Résultat:** Reduction in road fatality rate

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Fatal road crashed/incidents and fatalities	%	100.00	2012	P A	90.00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Civil Works</b>									
Expansion of Sheriff Street Mandela Avenue Road, including structures (bridges, culverts, drainage, etc.), bikeways, sidewalks and other road safety works.	Kilometers				7,10				24.000.000,00
Rehabilitation, improvement and construction of roads, construction of sidewalks, bikeways and streets, shoulder widening, construction and rehabilitation of bridges and culverts.	Kilometers								34.000.000,00
<b>Studies</b>									
Feasibility and Design Study	Reports				1,00				1.700.000,00
<b>Sustainable Urban Transport and Road Safety</b>									
Urban transport Study	Report				1,00				800.000,00
Road safety diagnostic and Action Plan	Report				1,00				250.000,00
Public awareness/education campaign implemented	Report				2,00				450.000,00
<b>Implementation Support and Institutional Strengthening</b>									
Construction Supervision	%				100,00				4.300.000,00
Institutional Strengthening Activities Implemented	IS Activities				5,00				500.000,00
<b>Routine Maintenance Management System</b>									
Roads under the RMMS.	Kilometers				1.640,00				3.000.000,00
<b>Audit, Monitoring and Evaluation</b>									
Audits, Monitoring Reports and Evaluations	%				100,00				200.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>69.200.000,00</b>
