

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1136	Chief of Operations Validation Date	10/20/23
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2023	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/23	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Development Programme's Norte Grande provinces: W&S Infrastructure	Loan Number	2776/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	GUICHON, MATIAS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	08/05/20
Safeguard Performance Rating - Rationale	La Agencia Ejecutora posee alta capacidad, conocimiento de las políticas de salvaguardias y realiza un buen seguimiento de la gestión socioambiental del Programa. Se presentan algunas inconsistencias para el cumplimiento de las directrices B.4. B.6 y B.9 de la OP-703 por temas de Salud y seguridad ocupacional, planificación de reforestación (Corrientes y Concepción). El proyecto de Agua Segura para comunidades indígenas implicará un desafío en términos de articulación de actores institucionales.		

Financial Data

Operations	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1136	500,000,000	364,000,000		0	500,000,000	364,000,000	349,790,556.44	96.10%	14,209,443.56
Aggregated	500,000,000	364,000,000		0	500,000,000	364,000,000	349,790,556.44	96.10%	14,209,443.56

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

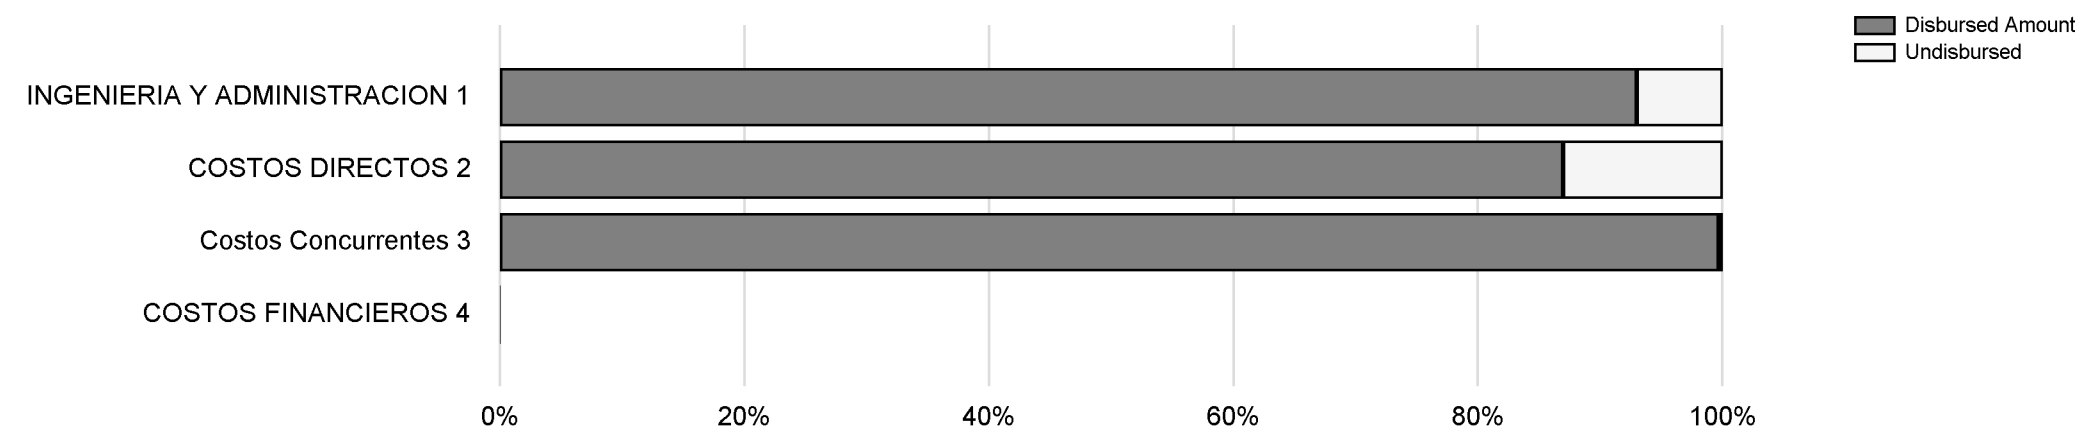

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo específico 1. Incrementar la cobertura y mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en áreas sin servicio o con servicio deficiente

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2025
0.0	Hogares con nueva conexión a sistemas de saneamiento por red construidos y/o rehabilitados	# of households	0	2014	P	-	-	-	-	-	-	-	-	9,353	-	-	9,353
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	7,828	1,562	-	9,390

Details

Means of Verification: Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

Observations: El indicador considera el total de hogares con conexión efectiva (conexión intradomiciliaria).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2025
0.1	Nuevos hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0	2014	P	-	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	-	160,000
					A	-	-	-	-	-	15,000	-	-	7,828	-	-	22,828

Details

Means of Verification: Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

Observations: Se considera tratado cuando cumple con los parámetros de vuelco (según normas vigentes y aplicables)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Households with wastewater treatment (#) ()

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2025
0.2	Caudal de aguas residuales tratado	l/s	0	2014	P	-	-	-	-	-	-	-	-	2,128	-	-	2,128
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores

Observations: Se considera tratado cuando cumple con los parámetros de vuelco (según normas vigentes y aplicables)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2025
0.3	Hogares con nueva conexión a servicio de agua potable por red construida y/o rehabilitada	# of households	0	2014	P	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000	-	-	31,000
					A	-	-	-	12,060	-	-	5,430	-	-	-	-	17,490

Details

Means of Verification: Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

Observations: El indicador considera el total de hogares con conexión potencial al sistema de tratamiento construido y/o rehabilitado.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2025
0.4	Caudal de agua cruda tratado	l/s	0	2014	P	-	-	-	-	-	-	-	260	-	-	260
					A	-	-	-	260	-	-	-	-	-	-	260

Details

Means of Verification: Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico 2. Fortalecer las entidades del sector a nivel provincial y mejorar la eficiencia y gestión operativa y financiera de los prestadores de servicios

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2025
1.0	Prestadores de servicio beneficiarios cuyos ingresos cubren los costos de operación, mantenimiento y administración del servicio.	Número	0	2014	P	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
					A	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

Details

Means of Verification: Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores

Observations: Los entes beneficiarios reportan sus ingresos a través de los informes financieros.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2025
1.1	Entidades del sector a nivel provincial con personal capacitado en gestión del sector de agua y saneamiento.	Número	0	2014	P	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Acta de talleres de capacitación

Observations: ninguna

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX
OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS
Component Nbr. 1 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Construidos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2023	EOP 2025	2023	EOP 2025
1.01	Sistemas de Saneamiento Construidos	nº	P	-	5	-	52,514,431.5
			P (a)	0.82	6	61,316,979	283,172,051.23
			A	0.34	2.93	18,759,532	234,863,058.23
1.02	Sistemas de agua potable construidos	nº	P	-	4	-	131,567,593.08
			P (a)	0.82	5.49	6,091,515	119,824,692.42
			A	0.03	3.07	419,009	97,809,770.42
1.03	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas	Planta	P	-	4	-	53,391,199.55
			P (a)	-	5.55	-	-
			A	0.4	2.95	-	-
1.04	Planta de tratamiento agua potable	Planta	P	-	1	-	6,296,775.87
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-

Component Nbr. 2 Mejoramiento de la Gestión Operativa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2023	EOP 2025	2023	EOP 2025
2.01	Macromedidores instalados	Macromedidores	P	-	80	-	2,581,176
			P (a)	-	87	-	2,581,176
			A	-	80	-	2,581,176
2.02	Micromedidores instalados	Micromedidores	P	-	29,000	-	10,628,824
			P (a)	-	37,039	-	10,628,824
			A	-	29,000	-	10,628,824

Other Cost

Ingeniería y Administración	P		20,120,000
	P (a)	2,684,259	23,738,849.29
	A	1,488,022	18,587,715.29
Recursos sin Asignar	P		340,000
	P (a)	0	0
	A	0	0
Costos Financieros y Auditoría	P		12,800,000
	P (a)	14,714	2,311,272.73
	A	19,073	2,298,487.73
Escalamiento	P		128,710,000
	P (a)	0	0
	A	0	0
Adquisición de equipos desobstructores y succionadores instalados en camiones	P		0
	P (a)	3,878,082	8,706,624
	A	1,763,208	6,591,750

Total Cost

Total Cost	P	0	419,000,000
------------	---	---	-------------

	Total Cost	P (a)	73,985,549	450,963,489.67
		A	22,448,844	373,360,781.67

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	RCASTELLO	9/4/2023
			Modify Physical Historical Actual	RCASTELLO	9/4/2023
	Sistemas de Agua Potable Construidos	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	RCASTELLO	9/4/2023
			Modify Physical Historical Actual	RCASTELLO	9/4/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
1	Inactive	Planning	
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
2	Materialized	Planning	
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
3	Inactive	Legal Environment	
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
4	Inactive	Planning	
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
5	Inactive	Planning	
	Response Actions		
	5	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
6	Inactive	Planning	
	Response Actions		
	6	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
7	Active	Planning	
	Response Actions		
	7.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

--
