

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1136	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/15/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/09/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Development Programme's Norte Grande provinces: W&S Infrastructure	<b>Loan Number</b>	2776/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS	<b>Sector/Subsector</b>	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
<b>Team Leader</b>	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	La agencia ejecutora tiene capacidad para gestionar los aspectos ambientales y sociales, del Programa. Las obras en ejecución cumplen con las políticas del Banco en lo referente al relacionamiento comunitario, la gestión de residuos y de materiales peligrosos, etc. El proyecto en preparación, Agua Segura para comunidades indígenas, implicará un desafío en términos de articulación de actores institucionales.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1136	500,000,000	500,000,000	55,000,000	0	555,000,000	500,000,000	232,612,536.44	46.52%	267,387,463.56
<b>Aggregated</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>555,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>232,612,536.44</b>	<b>46.52%</b>	<b>267,387,463.56</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

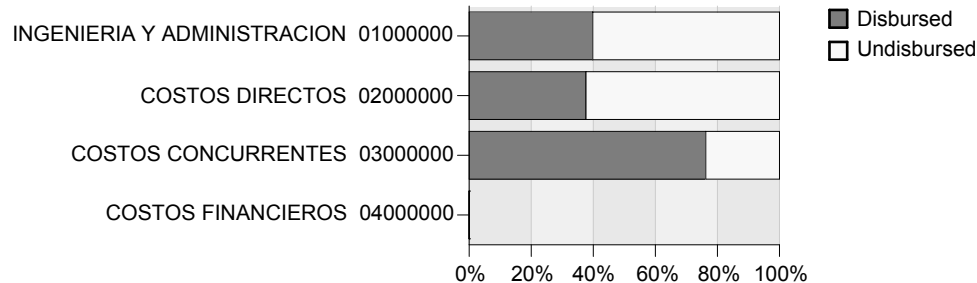

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Objetivo específico 1. Incrementar la cobertura y mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en áreas sin servicio o con servicio deficiente

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
0.0	1.1 Hogares con nueva conexión a sistemas de saneamiento por red construidos y/o rehabilitados	# of households	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,353.00	9,353.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	9,353.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

**Observations:** El indicador considera el total de hogares con conexión efectiva (conexión intradomiciliaria).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
0.1	1.2 Nuevos hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

**Observations:** Se considera tratado cuando cumple con los parámetros de vuelco (según normas vigentes y aplicables)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
0.2	1.3 Caudal de Aguas Residuales Tratado	l/s	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	2,128.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	2,128.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores

**Observations:** Se considera tratado cuando cumple con los parámetros de vuelco (según normas vigentes y aplicables)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.3	1.4 Hogares con nueva conexión a servicio de agua potable por red construida y/o rehabilitada	# of households	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.3	1.4 Hogares con nueva conexión a servicio de agua potable por red construida y/o rehabilitada	# of households	0.00	2014	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

**Observations:** El indicador considera el total de hogares con conexión potencial al sistema de tratamiento construido y/o rehabilitado.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Gestión Operativa de los Entes Beneficiarios Fortalecida

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	2.1 Prestadores de servicio beneficiarios cuyos ingresos cubren los costos de operación, mantenimiento y administración del servicio.	Nº	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores

**Observations:** Los entes beneficiarios reportan sus ingresos a través de los informes financieros.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	2.2. Entidades del sector a nivel provincial con personal capacitado en gestión del sector de agua y saneamiento.	Numero	0.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Details

**Means of verification:** Acta de talleres de capacitación

**Observations:** ninguna

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Construidos**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1 Sistemas de Saneamiento Construidos	Nº	P	0	5	8,727,407	52,514,431.5
		P(a)	0	5	8,727,407	52,514,431.5
		A	0	3	5,727,407	40,001,863.5
1.2 Sistemas de Agua Potable Construidos	Nº	P	0	4	0	131,567,593.08
		P(a)	0	4	0	125,311,309.08
		A	0	3	0	119,055,025.08
1.3 Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	Planta	P	0	4	0	53,391,199.55
		P(a)	0	4	0	59,647,483.55
		A	0	1	0	53,391,199.55
1.4 Planta de tratamiento agua potable	Planta	P	0	1		6,296,775.87
		P(a)	0	1		6,296,775.87
		A	0	1		6,296,775.87

**Component Nbr. 2 Mejoramiento de la Gestión Operativa**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1 Macromedidores instalados	Macromedidores	P	0	80	0	2,581,176
		P(a)	0	80	0	2,581,176
		A	0	80	0	2,581,176
2.2 Micromedidores instalados	Micromedidores	P	0	29,000	0	10,628,824
		P(a)	0	29,000	0	10,628,824
		A	0	29,000	0	10,628,824
2.3 Talleres de capacitación a entes provinciales realizados	Talleres	P	0	2	0	50,000
		P(a)	0	2	0	50,000
		A	0	0	0	0

**Other Cost**

Ingeniería y Administración	P			185,727	20,120,000
	P(a)			185,727	20,120,000
	A			185,727	12,224,310
Auditoría, Evaluación y Seguimiento	P			0	340,000
	P(a)			0	340,000
	A			0	0
Costos Financieros y Auditoría	P			0	12,800,000
	P(a)			0	12,800,000
	A			0	2,205,093
Escalamiento	P			0	128,710,000
	P(a)			0	128,710,000
	A			0	0

**Total Cost**

Total Cost	P			8,913,134	419,000,000
	P(a)			8,913,134	419,000,000
	A			5,913,134	246,384,267

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	2.2. Entidades del sector a nivel provincial con personal capacitado en gestión del sector de agua y saneamiento.	Los cambios realizados se basan en la misión especial de junio. Se adjunta documento.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	SOFIAG	09/29/2020
Output	Sistemas de Agua Potable Construidos	Los cambios realizados se basan en la misión especial de junio. Se adjunta documento.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SOFIAG	10/08/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Cost and Budgetary Aspects
