

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1136	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/12/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/26/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Development Programme's Norte Grande provinces: W&S Infrastructure	<b>Loan Number</b>	2776/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS	<b>Sector/Subsector</b>	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
<b>Team Leader</b>	MORENO MORENO,HENRY ALBERTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Partially Satisfactory		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1136	500,000,000	500,000,000	55,000,000	0	555,000,000	500,000,000	177,730,426.94	35.55%	322,269,573.06
<b>Aggregated</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>555,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>177,730,426.94</b>	<b>35.55%</b>	<b>322,269,573.06</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

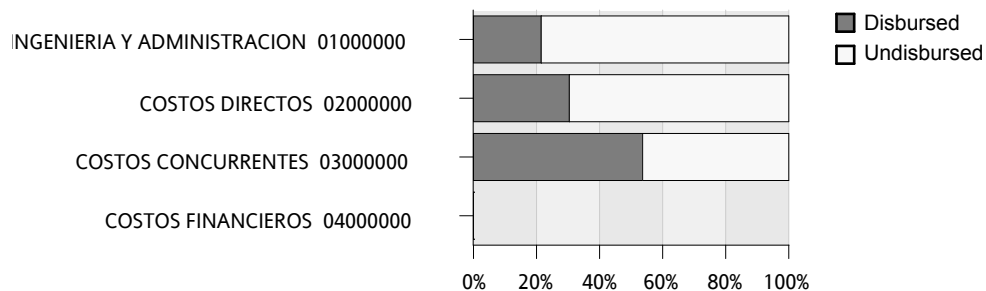

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento en la región del Norte Grande Argentino

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.1	Cobertura de agua potable en la Región del Norte Grande Argentino	% Hogares	84.0	2010	P		91.00
					P(a)		91.00
					A		

**Details**

**Means of verification:** Informes de la unidad ejecutora del programa.

**Observations:** Línea base tomada del censo 2010.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.2	Cobertura de saneamiento en la Región del Norte Grande Argentino	% Hogares	41.0	2010	P		51.00
					P(a)		51.00
					A		

**Details**

**Means of verification:** Informes de la unidad ejecutora del programa.

**Observations:** Línea base tomada del censo 2010.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.3	Incremento Margen Financiero EBIDTA promedio al final del proyecto	% USD	0.0	2013	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		

**Details**

**Means of verification:** Estados Financieros

**Observations:** EBIDTA: Ingresos antes de Depreciación, Amortización, Impuestos/Ingresos Totales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.4	Grado de Satisfacción del usuario sobre la calidad	% Usuarios	50.0	2013	P		65.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

1.4	del servicio	% Usuarios	50.0	2013	P(a)		65.00
					A		
<b>Details</b>							
<b>Means of verification:</b> Encuestas de Percepción							
<b>Pro-Gender</b>		No		<b>Pro-Ethnicity</b>		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Servicios de Agua Potable Mejorados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Caudal de Agua Cruda Tratado	l/s	0.0	2014	P	0.00	0.00	260.00	60.00	333.00	0.00	0.00	653.00
					P(a)	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	
					A	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00		260.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en Reportes de los Entes Operadores

**Observations:** Se considerará tratado cuando se verifique que cumple con los parámetros de calidad de agua aceptable, según normas vigentes y aplicables.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Hogares con conexión a servicio de agua potable por red construida y/o rehabilitada	Households (#)	0.0	2014	P	0.00	0.00	31,250.00	6,027.00	133,442.00	0.00	0.00	170,719.00
					P(a)	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	5,614.00	0.00	17,674.00
					A	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00		12,060.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en Reportes de los Entes Operadores

**Observations:** Se considerarán los hogares con potencial conexión al sistema, según valores de diseño a fin de proyecto.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 0:** Servicios de Saneamiento Mejorados

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Caudal de Aguas Residuales Tratado	l/s	0.0	2014	P	0.00	0.00	0.00	890.50	32,212.00	0.00	0.00	33,102.50
					P(a)	0.00	0.00	0.00	890.50	625.00	0.00	1,546.00	2,171.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores

**Observations:** Se considera tratado cuando cumple con los parámetros de vuelco (según normas vigentes y aplicables)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Measure	Baseline	Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
0.1	Hogares con acceso a sistemas de saneamiento construidos y/o rehabilitados	Households (#)	0.0	2014	P	0.00	0.00	0.00	37,080.00	128,952.00	0.00	0.00	166,033.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	37,080.00	15,000.00	0.00	136,350.00	151,350.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

**Observations:** El indicador considera el total de hogares con conexión potencial al sistema de tratamiento construido y/o rehabilitado.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
0.2	Hogares con nueva conexión a sistemas de saneamiento por red construidos y/o rehabilitados	Households (#)	0.0	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

**Observations:** El indicador considera el total de hogares con conexión efectiva (conexión intradomiciliaria).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
0.3	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.0	2014	P	0.00	0.00	0.00	37,080.00	84,872.00	0.00	0.00	121,952.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	37,080.00	15,000.00	0.00	145,746.00	160,746.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores.

**Observations:** Se considera tratado cuando cumple con los parámetros de vuelco (según normas vigentes y aplicables)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 0:** Gestión Operativa de los Entes Beneficiarios Fortalecida

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019	
0.0	Entes Beneficiarios cuyos ingresos cubren los costos de operación, mantenimiento y administración del servicio.	Nº	0.0	2014	P	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00
					P(a)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.0	Entes Beneficiarios cuyos ingresos cubren los costos de operación, mantenimiento y administración del servicio.	Nº	0.0	2014	A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			0.00
-----	---	----	-----	------	---	------	------	------	------	------	--	--	------

#### Details

**Means of verification:** Informes de la Unidad Ejecutora basado en reportes de los Entes Operadores

**Observations:** Los entes beneficiarios reportan sus ingresos a través de los informes financieros.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Construidos**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1 Sistemas de Agua Potable Construidos	Nº	P	2	4	7,916,796	170,544,822
		P(a)	2	3	40,409,696	132,424,349
		A	0	1	12,822,734	104,388,854
1.2 Sistemas de Saneamiento Construidos	Nº	P	3	4	23,262,085	327,727,753
		P(a)	1	4	28,170,946	272,729,300
		A	0	0	7,644,098	68,907,940

**Component Nbr. 2 Mejoramiento de la Gestión Operativa**

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1 Macromedidores instalados	Macromedidores	P	0	80	27,882	2,260,331
		P(a)	1	80	68,467	2,397,221
		A	1	80	229,687	2,517,246
2.2 Micromedidores instalados	Micromedidores	P	0	25,000	171,276	13,884,899
		P(a)	0	29,000	420,585	14,725,782
		A	0	29,000	918,746	14,970,890
2.3 Planes de Mejora de la Gestion Operativa de los Operadores del Servicio Implementados	Planes	P	1	4	130,000	875,000
		P(a)	0	2	50,000	350,000
		A	0	1	0	0

**Other Cost**

Costos Financieros y Auditoría	P			0	0
	P(a)			1,645,000	5,359,750
	A			0	2,078,050
Ingeniería y Administración	P			310,000	1,725,000
	P(a)			3,374,077	12,888,724
	A			1,598,018	4,364,512
Recursos sin Asignar	P			0	37,982,196
	P(a)			0	114,124,874
	A			0	0

**Total Cost**

Total Cost	P			31,818,039	555,000,001
	P(a)			74,138,771	555,000,000
	A			23,213,283	197,227,492

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Planes de Mejora de la Gestion Operativa de los Operadores del Servicio Implementados	Modify Output	Se aumentó los planes de mejoras de la gestión operativa de 4 a 5 porque se identificó un ente operador adicional.	09/06/2017	09/04/2017
