


# ADELCA DE LITORAL - MAE

— Duration  
 — Completion  
 — Today

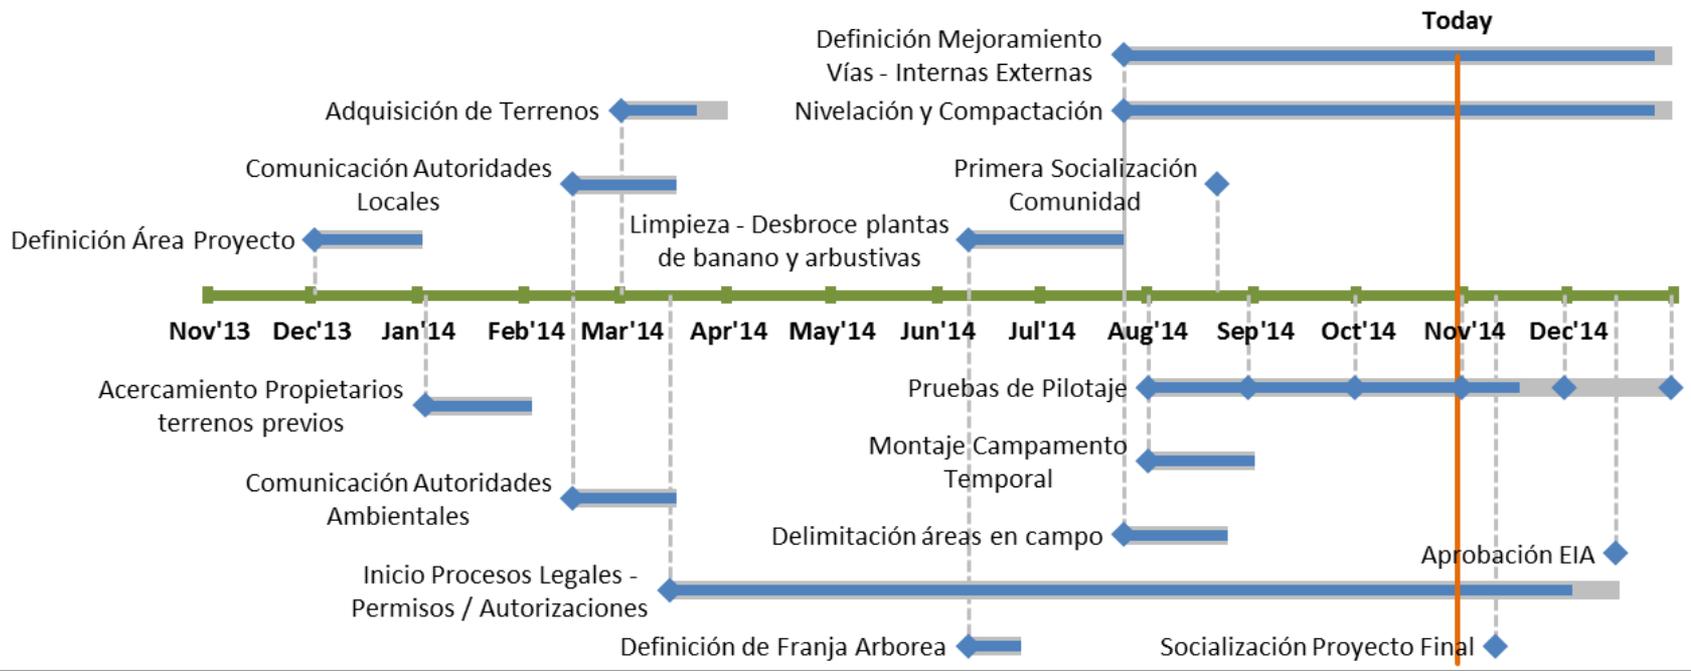

Title: ADELCA DE LITORAL - MAE		Today:	30/10/2014
Date	Task	Duration	% Done
02/12/2013	Definición Área Proyecto	31	100%
03/01/2014	Acercamiento Propietarios terrenos previos	31	100%
15/02/2014	Comunicación Autoridades Locales	30	100%
15/02/2014	Comunicación Autoridades Ambientales	30	100%
01/03/2014	Adquisición de Terrenos	31	70%
15/03/2014	Inicio Procesos Legales - Permisos / Autorizaciones	276	95%
10/06/2014	Limpieza - Desbroce plantas de banano y arbustivas	45	100%
10/06/2014	Definición de Franja Arborea	15	100%
25/07/2014	Nivelación y Compactación	220	70%
25/07/2014	Definición Mejoramiento Vías - Internas Externas	220	70%
25/07/2014	Delimitación áreas en campo	30	100%
01/08/2014	Pruebas de Pilotaje	180	60%
01/08/2014	Montaje Campamento Temporal	31	100%
21/08/2014	Primera Socialización Comunidad	0	0%
10/11/2014	Socialización Proyecto Final	0	0%
15/12/2014	Aprobación EIA	0	0%
