



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2013 - DICIEMBRE 2013

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Centros de Aprendizaje Comunitario para Implementación y Desarrollo Sostenible

Nro. Proyecto: CH-M1056 - Nro. Operación: ATN/ME-13626-CH

Resultado: Establecimiento de Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) para la gestión de Agua Potable Rural (APR) y ecotecnologías de saneamiento rural en la Cooperativa Maule


País Administrador
CHILE

País Beneficiario
CHILE


Agencia Ejecutora: SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE LIMITA

Líder equipo de diseño: Carrasco, Carolina
Líder equipo de supervisión: Carrasco, Carolina


CRONOLOGÍA DE EVENTOS

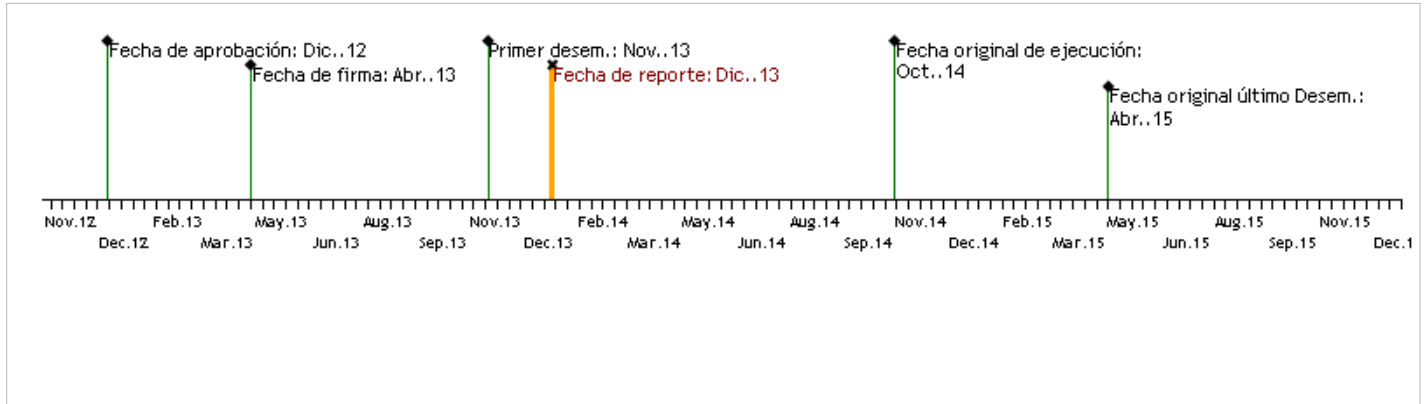

RECURSOS

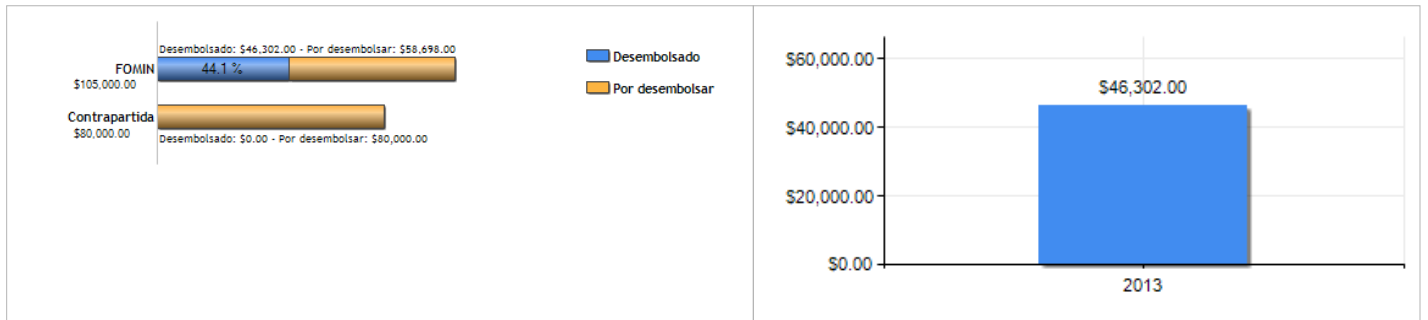

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

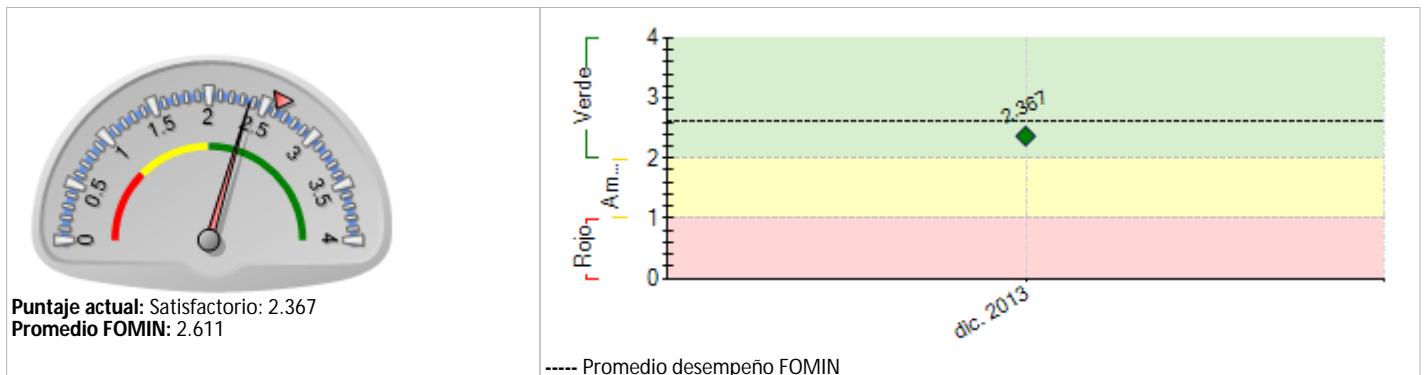


RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Bajo
Adquisiciones: Bajo
Capacidad Técnica: Medio

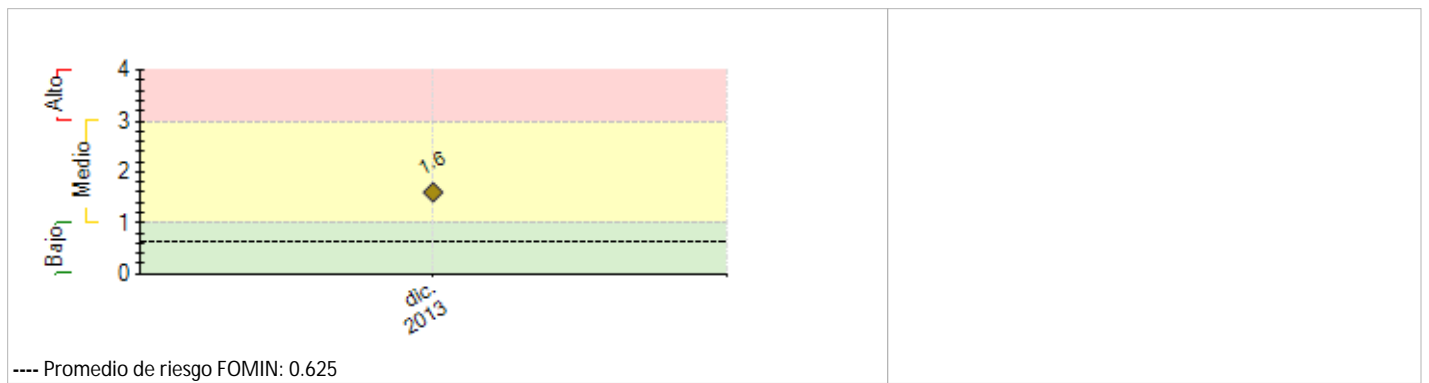

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Inicio de ejecución del proyecto:

Conformación equipo ejecutor.

Visita y reunión de coordinación entre socios del proyecto en terreno: Sociedad de Desarrollo Tecnológico Universidad de Santiago de Chile (SDT-USACH), Federación Nacional de Cooperativas de Saneamiento Rural (FESAN), Cooperativa de Saneamiento Maule.

1. Resultados más importantes:

Componente 1:

1.1. Catastro tecnologías de saneamiento existentes en Chile actualizado al año 2013 de las Cooperativas y Comités de APR, obtenido en la División de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Componente 2:

2.1 Establecimiento de criterios y selección de APR de la región de Maule que recibirán Asistencia Técnica.

Componente 3:

3.1. Planificación visita de expertos del Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico (CINARA) de la Universidad del Valle, Colombia; actividad a realizarse en el mes de enero de 2014.

2. Áreas con mayores dificultades y retrasos:

Retraso en el cumplimiento de las condiciones previas para el inicio del proyecto en el ámbito administrativo de la institución ejecutora. Para superarlo se realizaron gestiones a nivel de las máximas autoridades de la universidad.

3. Acciones críticas a lograr en próximo semestre:

Componente 1:

1.7 Instalación Centro de Información del CCA

Componente 2:

2.5 Diseñar un plan de formación.

Componente 3:

3.4 Talleres fortalecimiento gestión comunitaria local.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Establecimiento de Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) para la gestión de Agua Potable Rural (APR) y ecotecnologías de saneamiento rural en la Cooperativa Maule	R.1	Metodologías de difusión y capacitación del CCA Maule sistematizadas y documentadas	0			1 Ene. 2014	0 Dic. 2013	
	R.2	Modelo de gestión cooperativa y Guía Metodológica para saneamiento de APR utilizando ecotecnología sistematizado y documentado.	0			1 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
	R.3	La Cooperativa Maule y al menos 5 cooperativas de la Región han mejorado sus indicadores de gestión administrativa, operativa y comunitaria, especialmente en lo referido a saneamiento	0			6 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
	R.4	El CCA de Maule cuenta con mecanismos establecidos para su sostenibilidad financiera y técnica.	0			1 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
	R.5	FESAN ha duplicado el número de socios.	7 Abr. 2013			14 Abr. 2015	0 Ene. 2014	
	R.6	Modelo transferido a dos cooperativas de APR socias de FESAN	0			1 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
	R.7	500 operadoras rurales de servicios de agua y saneamiento sensibilizadas por la experiencia de Maule	0			500 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
	R.8	10 comunidades de la región de Maule sensibilizadas en aspectos ambientales y de salud relacionados con agua y saneamiento	0			10 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
Componente 1: Diagnóstico y Establecimiento de mecanismos de operación, comunicación y funcionamiento del CCA Maule Peso: 44% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Diagnóstico regional APR documentado	0			1 Oct. 2013		Atrasado
	C1.12	CCA Maule abierto a la comunidad y operando	0			1 Abr. 2014		
	C1.13	el CCA Maule ha recibido solicitudes de información de APRs de 6 regiones del país	0			6 Abr. 2015		
	C1.14	visitas al sitio web del CCA Maule llegan a un promedio de 2.000/mes	0			2000 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
Componente 2: Diagnóstico de gestión administrativa y comunitaria de sistemas de provisión de servicios de agua y saneamiento en la Región de Maule Peso: 24% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	diagnósticos elaborados en 3 dimensiones para operadores APRs, validados por cada operador	0			10 Abr. 2014		
	C2.12	% implementación de los planes de mejora	0			50 Abr. 2015		
Componente 3: Desarrollo de capacidades para la gestión administrativa, comunitaria, de operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento sostenible en Maule Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	miembros de la Cooperativa Maule capacitados para operar y mantener el sistema de saneamiento	0			20 Abr. 2014		
	C3.12	sistema de seguimiento operativo de saneamiento de Cooperativa Maule, se encuentra operativo y actualizado con un desfase inferior a 45 días	0			1 Oct. 2014	0 Dic. 2013	
	C3.13	La cooperativa Maule cuenta con un Plan de Operación y Mantenimiento anual del sistema de saneamiento, el cual es monitoreado mensualmente	0			1 Oct. 2014	0 Dic. 2013	
	C3.14	transferencia de metodologías de gestión comunitaria (y administrativa) a dirigentes (operadores) de APR	0			60 Oct. 2014		
	C3.15	Cooperativa Maule ha cumplido las metas operacionales y de gestión de su sistema de saneamiento	0			1 Abr. 2015		
Componente 4: Diseminación y transferencia. Peso: 12% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Numero de cooperativas socias de FESAN a las que se ha transferido la experiencia	0			2 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
	C4.12	Numero de miembros de las Cooperativas que reciben la transferencia capacitados en operación y mantención de sistemas de saneamiento	0			8 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
	C4.13	El CCA Maule cuenta con una planificación anual para la realización de talleres de formación y sensibilización	0			1 Abr. 2015	0 Dic. 2013	
	C4.14	Numero de operadores APR a los cuales se ha difundido el Modelo	0			500 Abr. 2015	0 Dic. 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	6	Oct. 2013	6	Oct. 2013	Logrado tarde

H3	CCA Maule abierto a la comunidad	1	Abr. 2014			
H2	[*] Diagnostico regional APR	1	Abr. 2014			
H4	Reporte Línea de Base 10 operadores región del Maule	1	Jun. 2014			
H5	Manual de operación sistema de saneamiento Cooperativa Maule y Sistema de seguimiento operando	1	Oct. 2014			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las inversiones necesarias para implementar las mejoras requeridas en el sistema de saneamiento en la Comunidad de Maule presentan demoras que impidan operacionalizar en su totalidad el modelo a desarrollar	Medio	La Agencia Ejecutora, FESAN y Cooperativa Maule han iniciado los procesos correspondientes ante las entidades gubernamentales para la aprobación de los correspondientes proyectos de inversión	Invitado Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN	es necesario identificar mecanismos de financiamiento post proyecto

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Presentación del proyecto a representantes de las instituciones: Municipio Maule, Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Maule, Subsecretaría de Desarrollo Regional. Lo que permitió establecer una línea de comunicación y vinculación para el apoyo a los objetivos del proyecto en su proceso de instalación. Se solicitará nuevamente en el mes de marzo una reunión con las nuevas autoridades regionales del gobierno entrante con el fin de involucrar a las instituciones públicas pertinentes en el respaldo y colaboración con el proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Inicio del proyecto con Encuentro y Protagonismo de las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural de la Región del Maule: Una debilidad del diseño original del proyecto es que no contempló en su inicio, una instancia de encuentro entre las organizaciones comunitarias del territorio que gestionan el agua potable y el saneamiento. Lo que no tomaba en cuenta la falta de comunicación, desvinculación y desarticulación de estas organizaciones. La generación de un espacio en que estas compartieron, se reconocieron, contaron su historia, sus necesidades y desafíos futuros, les entregó un protagonismo que permitió que valoraran aún más el proyecto y vieran las oportunidades individuales, pero también colectivas, lo que permitió que tempranamente se generaran acciones colectivas que apuntan a ir generando un sentido asociativo, el cual contribuye a reforzar los objetivos de asociatividad, pero también la sostenibilidad del proyecto mismo.	Design	caro, victor
2. No se cuenta con lecciones aprendidas por el momento respecto de la implementación del proyecto.	Implementation	caro, victor
