



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2016 - JUNIO 2016

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Plataforma de Exportación Asistida


Nro. Proyecto: PE-M1105 - Proyecto No.: ATN/ME-15356-PE

Propósito: Contribuir a que las PYMES preparadas para exportar cuenten con una Plataforma de Exportación Asistida integrada a INTradeBID que les facilite la identificación de oportunidades en los mercados internacionales, y contribuir a que PROMPERÚ mejore su modelo de negocio de atención a las PYMES.


Pais Administrador	Pais Beneficiario	Grupo	Subgrupo
PERÚ	PERÚ	SME - Desarrollo de la pequeña y mediana empresa	TECH - Tecnología para el desarrollo empresarial

Agencia Ejecutora: COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO
Líder equipo de diseño: MARGARITA RIOS JARAMILLO
Líder equipo de supervisión: HILDA ELIZABETH MINAYA FERNANDEZ


CICLO DEL PROYECTO

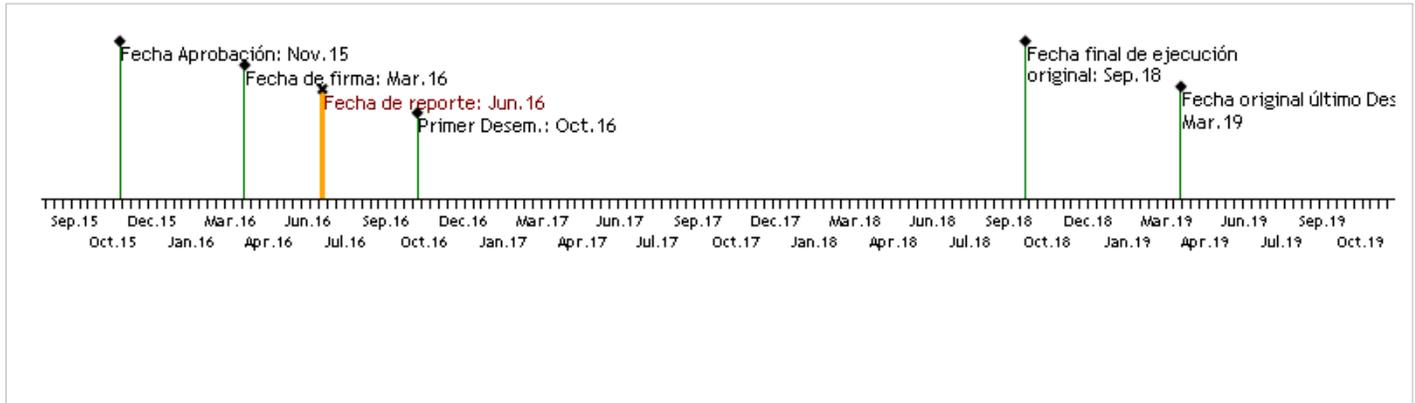


RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO

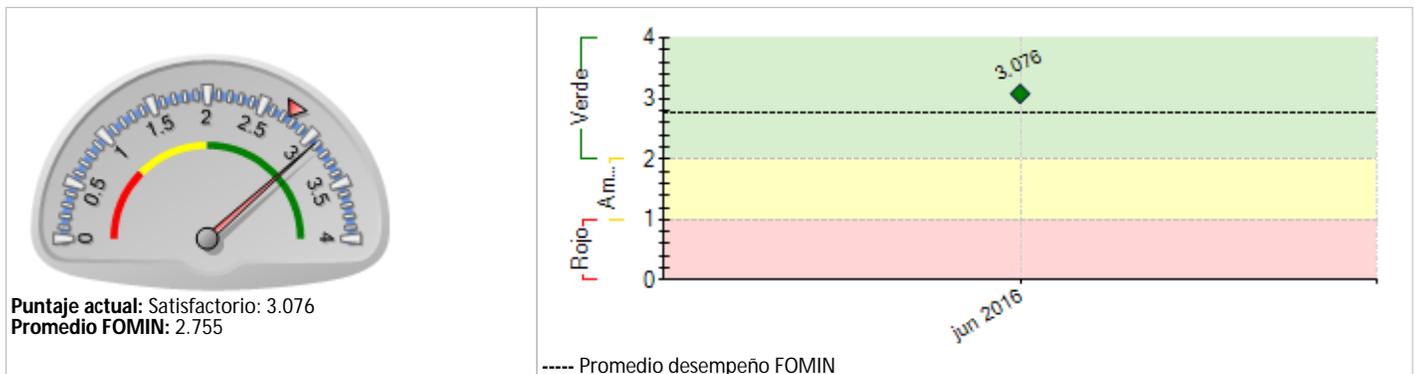

RIESGOS EXTERNOS

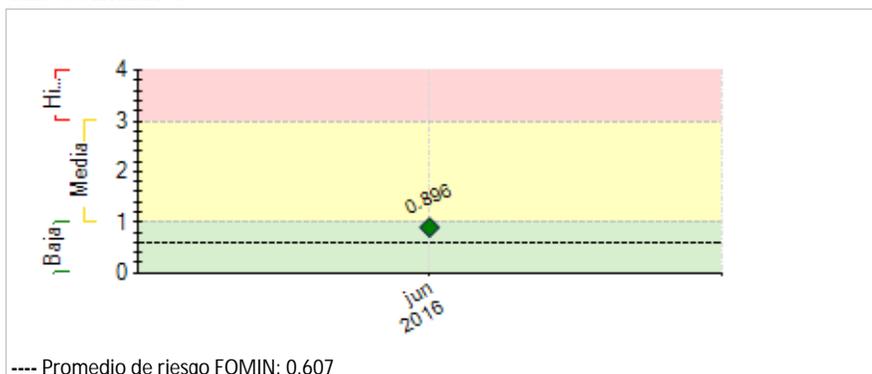

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo
Administración Financiera: Baja
Adquisiciones: Baja
Capacidad Técnica: Baja

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se tiene pendiente la contratación de la Plataforma de Exportación Asistida, cuya contratación se ha visto afectada por los retrasos presupuestales internos que afrontó la institución en los últimos meses, a esto se suma los problemas administrativos que generan una demora adicional.

Se han tomado las medidas correctivas del caso y se están destinando los recursos internos al proyecto para poder culminar lo establecido en los plazos acordados.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Comentarios de margarita Ríos:

-La contratación para el desarrollo de la PEA, ha sufrido importantes retrasos administrativos por parte de PROMPERU lo cual ha afectado significativamente el avance del proyecto y en lo cual se espera se incorporen las medidas correctivas analizadas.

-El equipo ejecutor aun no muestra un nivel de apropiación y proactividad en el desarrollo de los planes aprobados lo cual debe ser resuelto con prioridad.

-En el componente de regionalización falta realizar una labor de promoción con las organizaciones que manifestaron interés en la PEA a fin de madurar acuerdos de colaboración con aliados clave

Nota de Elizabeth Minaya:

este PSR fue enviado por error en el sistema a la Coordinadora Regional del Proyecto. Adicionalmente a lo expresado, durante ese semestre está preparando las condiciones previas al primer desembolso. Una dificultad que observo son los niveles de articulación y coordinación para responder a los requerimientos del Banco, en ocasiones la comunicación con el ejecutor no es fluida. Se requiere mayor liderazgo en la coordinación del proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Contribuir a fortalecer el sector exportador de Perú mediante incrementar las exportaciones de las PYMES preparadas para exportar.	I.1	500 PYMES incrementan en un 10% sus ingresos procedentes de las exportaciones.(CRF # 330101)	0	250		500	0	
			Mar 2016	Mar 2018		Sep 2018		
	I.2	200 PYMES preparadas para exportar en PERU acceden a mercados internacionales por primera vez. (CRF # 330601)	0	100		200	0	
			Mar 2018		Sep 2018			
	I.3	300 PYMES diversifican exportaciones en productos y/o mercados.(CRF # 330601)	0	200		300	0	
			Mar 2018		Sep 2018			
Propósito: Contribuir a que las PYMES preparadas para exportar cuenten con una Plataforma de Exportación Asistida integrada a INTradeBID que les facilite la identificación de oportunidades en los mercados internacionales, y contribuir a que PROMPERU mejore su modelo de negocio de atención a las PYMES.	R.1	2000 PYMES usan los nuevos productos y servicios de innovación de la Plataforma de Exportación Asistida e INTradeBID (CRF # 160100)	0	1000		2000	0	
				Mar 2018		Sep 2018		
	R.2	PROMPERU aumenta la cobertura de servicios no presenciales a las PYMES en 6,2 veces.	0	3		6.2	0	
				Mar 2018		Sep 2018		
Componente 1: Plataforma de Exportación Asistida Desarrollada Peso: 61% Clasificación: Insatisfactorio	C1.11	50 PYMES y mínimo 4 miembros de la CoP participan en el levantamiento de los requerimientos para el diseño de la plataforma	0	50	4	54		Finalizado
				Sep 2016	Sep 2016	Sep 2016		
	C1.12	Un Prototipo desarrollado y validado con las PYMES y CoP	0	1		1		Finalizado
				Sep 2016		Sep 2016		
	C1.13	Una Plataforma de exportación asistida versionada, desarrollada y validada con los usuarios PYME-CoP (3 versiones de la plataforma desarrolladas y validadas)	0	1	2	3	3	
				Mar 2017	Sep 2017	Mar 2018	Mar 2018	
	C1.14	Plataforma de Exportación Asistida versión I, II, III integrada a INTradeBID	0	1	2	3	3	
				Mar 2017	Sep 2017	Mar 2018	Mar 2018	
Componente 2: Regionalización de la PEA-INTradeBID Peso: 29%	C2.11	Una Comunidad de Práctica -CoP conformada para garantizar la sostenibilidad de la plataforma	1	1	1	1	1	Finalizado
			Mar 2016	Jun 2016	Mar 2017	Mar 2018	Mar 2018	
	C2.12	Un plan de marketing, tres plataformas diseminadas (PEA -INTradeBID- ConnectAmericas) y 2 artículos publicados	0	1	4	5	6	

Clasificación: Insatisfactorio	C2.I3	Cuatro TPOs participantes CoP reciben transferencia tecnológica sobre PEA y 50 PYMES reciben capacitación sobre el uso de la Plataforma de Exportación Asistida e INTradeBID	0	Sep 2017	Mar 2018	Sep 2018	Sep 2018		
			54	Mar 2017	Sep 2017	Mar 2018	Mar 2018		
Componente 3: Gestión del Conocimiento.	C3.I1	Tres productos de conocimiento del proyecto generados	0	1	2		3		
				Sep 2017	Mar 2018		Mar 2018		
Peso: 10%									
Clasificación: Satisfactorio									

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0	10	Sep 2016			
H1	1	Oct 2016			
H2	1	May 2017			
H3	4	Dic 2017			
H4	50	Dic 2017			
H5	1	Dic 2017			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Inestabilidad en el sector exportador del PERU (decrecimiento de las exportaciones en un 11% en el 2014)	Media	Diversificación de mercados. Fortalecer comercio intrarregional. Mejorar acceso a información sobre oportunidades comerciales	Project Guest
2. La desactualización de la información puede desestimular el uso de la herramienta por parte del sector privado	Media	Para mitigar este riesgo se generaran acuerdos interinstitucionales con organizaciones públicas y privadas participantes en la CoP interesados en usar la plataforma, los cuales contribuirán con el ingreso y actualización de la data de su respectivo país. En el caso de Perú, PROMPERU asumirá el proceso de actualización de los datos e incluirá tareas de actualización de la información en el presupuesto ordinario de la institución	Project Guest
3. Riesgo de compatibilidad tecnológica entre la PEA y los países que quieren usar la plataforma (estructuras tecnológicas no integrables)	Media	Para mitigar este riesgo se hará un desarrollo versionado y modular basado en estándares internacionales apoyado en desarrollo de interfaces e intercambio de información con los países interesados en usar la plataforma y participantes en la CoP	Project Guest
4. Restricciones para el acceso a datos sobre exportaciones a nivel de empresas en Perú.	Baja	Se trabajará con la información disponible en los sistemas de información de PROMPERU y/o con los sistemas de estadísticas nacionales	Project Guest
5. Las organizaciones participantes no tienen interés en adoptar los servicios de PEA y los productos de conocimiento.	Baja	Para mitigar este riesgo, la estrategia de comunicación del proyecto promocionara y posicionara la herramienta entre las audiencias clave identificadas e incluirá estudios de casos que demuestren el valor agregado de la plataforma y la eficacia para las PYMES exportadoras	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Como parte de las actividades propias de PROMPERU, se realiza todos los miércoles difusión de temas y actividades de exportación, a través del denominado MIERCOLES DEL EXPORTADOR inicial, se usara este canal de difusión, para incluir temas relacionados a los avances de la Plataforma de Exportación Asistida, así como actividades vinculadas a la Comunidad de Buenas prácticas - CoP.

Se ha iniciado contacto con instituciones locales quienes manifiestan interés en formar parte de la CoP-PEA

Se han realizado los compromisos presupuestales pertinentes que garanticen la continuidad de las actividades dentro del marco de la Plataforma de Exportación Asistida para el 2018.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
<p>1. Procesos administrativos internos generan retrasos en la ejecución del proyecto, por lo que se tomaron medidas correctivas a fin de alcanzar los objetivos</p> <p>Dentro de los temas incorporados, es reuniones internas con las personas facilitadoras del proyecto con miras a acelerar los procesos internos, con esto se ha logrado ya lanzar la convocatoria para la contratación de la firma consultora que desarrollara la Plataforma de Exportación Asistida.</p> <p>Fecha de lanzamiento de convocatoria 31 de Marzo de 2017</p> <p>Fecha de adjudicación, 14 de Mayo de 2017.</p> <p>Se incorporó personal al proyecto a fin de realizar otras tareas como la elaboración del Plan de Marketing y Difusión de la Plataforma de Exportación Asistida.</p>	Implementation	Diaz, Carlos
<p>2. Procesos administrativos internos generan retrasos en la ejecución del proyecto, por lo que se tomaron medidas correctivas a fin de alcanzar los objetivos</p>	Risk	Diaz, Carlos
