

REPORTE DE ESTADO DE PROYECTO (PSR)

01/01/2024 - 09/30/2024 - PSR-10156

SÍNTESIS DEL PROYECTO

Número de Operación

HO-T1416

Número de suboperación

ATN/GA-20351-HO

Nombre del proyecto

Strengthening Capacities for Climate Resilience and
Economic Empowerment of Rural Small Holder Producers
in the Dry Corridor of Honduras

Lider de equipo

Fausto Tomas Castillo

Agencia ejecutora

Red De Comercializacion Comunitaria Alternativa

Proposito

Mejorar la resiliencia climática y la seguridad alimentaria mediante el empoderamiento económico y la transformación del sistema agrícola de los pequeños agricultores del oeste de Honduras.



Ciclo del Proyecto



PUNTAJE PSR



- 0 - 1 Bandera roja
- 1 - 2 Bandera amarilla
- 2 - 4 Bandera verde

APRENDIZAJES

1. Implementación

1.1. Breve Resumen

1.1. Por favor, proporcione un breve resumen sobre el estado general de esta operación y los acontecimientos relevantes que han ocurrido durante la ejecución. Puede incluir las principales actividades realizadas, los resultados generales obtenidos, los cambios relevantes en el contexto y los próximos pasos contemplados. Si lo desea, esta sección puede organizarse por componentes.

Durante este periodo de 01 de enero 2024 al 30 de septiembre del 2024, se ha avanzado en la implementación de los tres componentes del proyecto. En el componente 1: Hay avances importantes en la ejecución de las actividades relacionadas a las tres cadenas de valor, a través de las Escuelas de Campo se han facilitado 15 módulos con contenido teórica y práctica dirigido a 800 productores y productoras participantes. En la cadena de valor apícola, se han establecido 21 apiarios 15 colmenas de doble cuerpo por apiario con participación de 245 mujeres, se ha dotado del equipo de protección y otros equipos para el funcionamiento de los apiarios. A la fecha se han producido 1,035 botellas de miel de abeja y se han comercializado en mercados locales. En la cadena de valor de aguacate se han entregado 14,826 plantas de aguacate (12,826 de aguacate Hass y 2,000 de Antillano) con participación unos 275 productores localizados en comunidades de los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Con relación a la cadena de hortalizas, se dotado de materiales para sistemas de riego por goteo a 144 productores, al menos 69 productores ya instalaron tanques de geomembrana con capacidad de almacenar 15,100 litros de agua para riego, al menos 160 productores y productoras han sido apoyados con semillas de lechuga, brocoli y chile dulce, se construyeron 19 invernaderos colectivos con participación de 244 productores/as, se han construido 10 reservorios para cosecha de aguas lluvias con capacidad de almacenar 93 mil litros de agua cada uno. En el componente 2: Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha avanzado en la dotación de 6400 árboles frutales (melocotón, maracuyá, naranja valencia y limón persa) a 408 hogares y dotación de semillas de hortalizas (rábano, zapallo, zanahoria, cilantro) a 55 hogares para el establecimiento de igual número de huertos familiares, Se ha dotado con dos silos metálicos al menos a 30 organizaciones de productores para almacenamiento y conservación de maíz y frijol. En coordinación con el Proyecto PRO-Occidente de la secretaria de Agricultura y Ganadería SAG - se han facilitado talleres de capacitación sobre nutrición e higiene con participación de 243 personas, entre ellas 195 mujeres y 48 hombres. En el componente 3, se han facilitado talleres de capacitación sobre gobernanza y liderazgo, justicia de género y educación financiera dirigido a 24 integrantes de las juntas directivas regionales de Intibucá, La Paz y Lempira. Es importante mencionar el proceso de articulación con la Dirección de Investigación y Tecnología Agrícola - DICTA en la región de Intibucá y con la agencia CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS), está en proceso la firma de una carta de entendimiento con cada una de estas instituciones, la finalidad es articular esfuerzos y optimizar el uso de los recursos para mayor impacto en las comunidades.

1.1.2. Basado en estas actividades, especifique al menos dos Lecciones Aprendidas, Hallazgos y Recomendaciones. *

Fase	Dimensión	Hallazgo	Recomendación
Ejecución		Es evidente la mayor participación de las mujeres cuando los procesos de formación y capacitación se realizan en las comunidades. Además, se reducen	Es necesario designar a una mujer joven para que se encargue del cuidado de los niños y niñas mientras las madres están participando en los eventos de capacitación, así se logra mayor concentración de las madres y mejor asimilación de los conocimientos impartidos. Se

		costos de transporte y alimentación y por ende, se genera una mayor eficiencia en el uso de los recursos del proyecto.	deben comprar materiales didácticos para la recreación de los niños y niñas, ejemplo: plastilina, crayolas, cuadernos de dibujo, etc.
Ejecución		Al inicio del proceso de implementación de la cadena de valor apícola algunas mujeres expresaron que esa labor del manejo de las colmenas era trabajo de hombres y no querían participar, igual algunos hombres manifestaron que ese trabajo no es para las mujeres. Sin embargo, luego de desarrollar los módulos de capacitación a través de las Escuelas de Campo y garantizado el equipo de protección para el manejo de los apiarios, las mujeres han vencido el temor y ahora están aplicando los conocimientos en el manejo de los apiarios de manera activa y con eficiencia.	Es necesario seguir brindando asesoría técnica a las mujeres para generar mayor capacidad en el manejo de los apiarios. Al mismo tiempo es necesario realizar talleres de capacitación sobre masculinidad y justicia de género dirigido a los hombres para sensibilizarlos y que puedan asumir algunos roles domésticos y desde luego para que apoyen y acompañen a las mujeres, especialmente a sus familiares.

1.1.3. Describa los resultados logrados este año y su relación/contribución al objetivo de la TC. Si los resultados no se han completado según lo previsto, explique cómo afectará esto al progreso hacia la consecución del objetivo de la operación.

El objetivo del proyecto es mejorar la resiliencia climática y la seguridad alimentaria a través del empoderamiento económico y la transformación del sistema agrícola para pequeños agricultores en el occidente de Honduras. Sin duda los resultados obtenidos a la fecha están contribuyendo al objetivo general del proyecto, entre ellos se pueden mencionar: 1. Al menos 720 productores implementan mejores conocimientos y prácticas agroecológicas en las cadenas de valor priorizadas: 275 productores de aguacate, 200 de hortalizas; y 245 mujeres productoras de miel. 2. Unos 243 productores y productoras mejoran sus conocimientos sobre seguridad alimentaria y la nutrición e implementan prácticas agroecológicas como la diversificación de cultivos, uso de bioinsumos, conservación del suelo, conservación de semillas y granos básicos incrementando así su resiliencia al cambio climático. 3. Al menos 24 integrantes de las juntas directivas regionales y comunitarias capacitados en temas de gestión financiera, gobernanza, liderazgo y justicia de género. Iniciado el proceso de organización y fortalecimiento de las cajas de ahorro y crédito para apoyo financiero en las comunidades.

1.1.4. ¿Se han difundido los productos y/o resultados de la operación?

[Sí]

1.1.5. Si corresponde, adjunte documentos relacionados con la difusión

1.1.6. Historias del Proyecto

Tipo de Historia	Texto de la Historia	Enlace (Si aplica)
Desafío	Conservación de las semillas nativas de maíz y frijol	https://x.com/CAFOD/status/1798419162932375872
Desafío	Participación de las mujeres en el proyecto ATN / GA 20351-HO, conocido como proyecto GAFSP	https://drive.google.com/file/d/1HDT2sNdEpEdIxmzqNoUg795fcyoCUBta/view?usp=sharing
Desafío	Testimonio de productoras Celina Domínguez - cadena de valor de aguacate	https://tinyurl.com/mrxr2fju
	Testimonio de productora	

Éxito	Gladis Lazo - Cadena de Valor de Miel Actualmente hay 21 apiarios instalados en las tres regiones Lempira, Intibucá y La Paz. De los primeros 10 apiarios se registra una producción de 1035 botellas de miel, comercializadas en mercados locales. Se prevé otra cosecha el mes del noviembre del 2024	https://tinyurl.com/5n8j72ny
N/A	Cadena de Valor de Aguacate - Testimonio Prudencio Calix	https://tinyurl.com/5y6zub2f
Desafío	Cadena de Valor de Hortalizas - Testimonio Julio César Domínguez	https://tinyurl.com/w3c2xjmb

1.2. Población Objetivo

1.2. Seleccionar la población objetivo realmente alcanzada por el proyecto/empresa/fondo apoyado por BID Lab (incluso si no fue identificada originalmente en el diseño del proyecto)

[Población indígena, Mujeres, Población rural]

2. Escalabilidad

2.1.a Resultados PMV/Empresa/Solución/Proceso

2.1.1. a) En el último año calendario, ¿sus costos han sido cubiertos totalmente por las ventas o la financiación del programa? En caso afirmativo, seleccione cuánto de sus costos se están cubriendo para continuar brindando su solución/modelo/servicio.

[Sí. Se cubrieron los costos y aún podríamos financiar hasta 6 meses de operaciones (1-6 meses)]

2.1.2. En el último año calendario, ¿aumentó el número de clientes (individuos, hogares, empresas, organizaciones u otros) que utilizaron su solución/modelo/servicio? En caso afirmativo, ¿alcanzó o superó el número de clientes que esperaba alcanzar?

[Sí. y cumplimos la meta anual]

Nro. de Individuos o Hogares

1063

Nro. de Empresas y Organizaciones

40

Nro. de Individuos u Hogares

1063

Nro. de Empresas y Organizaciones

40

2.1.b Capacidad institucional para escalar

2.1.3. ¿Tiene su organización un plan de escalamiento que especifique los elementos clave necesarios para escalar la solución/modelo/servicio que se está financiando?

[No]

2.1.4. Indique la vía principal de escalamiento que el proyecto/iniciativa está siguiendo para alcanzar escala

[La solución se escalará a través de un esfuerzo conjunto (asociación) que involucre a mi empresa u organización y otras entidades]

2.1.5. ¿Está buscando activamente socios o interactuando con ellos para llevar su solución/modelo/servicio a escala?

[Sí]

2.1.5.1. En caso afirmativo, seleccione el grado de participación (si hay varios socios, seleccione todos los que correspondan)

[Acuerdo verbal/informal]

2.1.c Factores

2.1.6. ¿Cuáles de estos factores externos están facilitando el escalamiento de su solución/modelo/servicio? Seleccione solo aquellos que correspondan y lístelos en orden de prioridad.

[La solución/modelo/servicio aborda una necesidad muy sentida por los clientes]

2.1.6.1 ¿Existe algún otro factor(es) externo que facilite el escalamiento de su solución/modelo/servicio? (Si no hay otro factor, dejar en blanco)

Los socios para el escalamiento ven valor en adoptar y/o adquirir la solución/ modelo/ servicio

2.1.7 ¿Cuáles de estos factores externos están dificultando el escalamiento de su solución/modelo/servicio? Seleccione solo aquellos que correspondan y lístelos en orden de prioridad.

[Ninguno]

2.1.8 ¿Cuáles de estos factores internos están facilitando el escalamiento de su solución/modelo/servicio? Seleccione solo aquellos que correspondan y lístelos en orden de prioridad.

[Se han documentado y comunicado los resultados sobre la efectividad]

2.1.8.1 ¿Existe algún otro factor(es) interno que facilite el escalamiento de su solución/modelo/servicio? (Si no hay otro factor, dejar en blanco)

Existe voluntad y compromiso de las y los productores en participar en la implementación del proyecto

2.1.9 ¿Cuáles de estos factores internos están dificultando el escalamiento de su solución/modelo/servicio? Seleccione solo aquellos que correspondan y lístelos en orden de prioridad.

[Ninguno]

3. Despliegue de Tecnología

3.1. Factores de Nuevas Tecnologías

3.1.1. Si el proyecto/empresa/fondo hace uso de tecnologías o metodologías novedosas, ¿Qué factores han facilitado la implementación de la solución tecnológica propuesta inicialmente por el proyecto?

[Acceso a expertos en la materia por parte de la agencia ejecutora/cliente]

3.1.2. Si el proyecto/empresa/fondo hace uso de tecnologías o metodologías novedosas, ¿Qué factores han dificultado la implementación de la solución tecnológica propuesta inicialmente por el proyecto?

[Bajo interés por parte de otras empresas/gobiernos en la tecnología]

4. Resultados de Desarrollo (Cuantitativo)

4.0 ¿Su proyecto/empresa/fondo ha contribuido a alguno de los siguientes indicadores durante este año calendario (Ene-Sept)?

[4.1. Número de empresas beneficiadas]

4.1. Número de empresas beneficiadas

Total

40

Empresas propiedad/dirigidas por hombres

20

Empresas propiedad/dirigidas por mujeres

20

4.1.2. Señale qué indicador de la matriz de resultados se relaciona con su respuesta, o cómo ha calculado este número.

Número de organizaciones de productores apoyadas [4] (debido a la participación en procesos de capacitación sobre gestión y liderazgo, desarrollo empresarial, educación financiera, buena gobernanza, género e inclusión, transparencia y dignidad).

4.1.4. Por favor, seleccione cómo a través del proyecto se están beneficiando a estas empresas.

[Mejora de la capacidad para abordar las necesidades de los grupos subrepresentados (por ejemplo/afrodescendientes/poblaciones indígenas/personas con discapacidad/LGBTQ+)]

4.1.3. ¿Qué tipo de servicios recibieron las empresas?

[No Financiero]

Otros. ¿Cuáles?

Además de los equipos, materiales, semillas, invernaderos, sistemas de riego, reservorios de agua, las y los productores han recibido capacitación técnica a través de las Escuelas de Campo para el manejo de apiarios, cultivos de aguacate y cultivo de hortalizas. También, las y los integrantes de las juntas directivas han recibido capacitación en temas de justicia de género, liderazgo, gobernanza y educación financiera.

4.5. Fuente de Datos

4.5.1. ¿Qué tipo de fuentes de verificación ha utilizado para informar los datos que proporcionó en esta sección? (Por favor, seleccione todas las respuestas válidas).

[Información administrativa]

Otros. ¿Cuáles?

Base de datos en donde se registra la información de los beneficios que han sido entregados a las y los productores, actas de entrega, fotografías, listados de participantes.

5. Sostenibilidad e Innovación

5.1. Sostenibilidad

5.1.1. ¿La operación está diseñada para ser sostenible?

[Sí]

5.1.2. Describa las medidas identificadas durante la ejecución para mejorar la sostenibilidad del proyecto, si corresponde. En el informe final explique cómo se continuarán obteniendo beneficios una vez que la operación haya finalizado.

Se han identificado varias medidas que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto entre ellas podemos mencionar las siguientes: a) Se trabaja con organizaciones comunitarias ya establecidas en las comunidades, estas organizaciones en su mayoría son afiliadas a la asociación Red COMAL, eso significa que tendrán acompañamiento una vez finalizado el proyecto. b) Se ha promovido la organización y fortalecimiento de cajas de ahorro y crédito en todas las organizaciones comunitarias participantes del proyecto. De las inversiones o beneficios que se han entregado a las y los productores tanto de manera individual como

colectivo, las y los participantes realizarán una devolución que va desde el 15% hasta el 20% del costo total de los materiales o equipos recibidos, con estos fondos se capitalizarán las cajas de ahorro y crédito a nivel comunitario y regional. Una vez finalizado el proyecto, las y los productores podrán solicitar préstamos en las cajas de ahorro y crédito para continuar sus procesos productivos. c) En las capacitaciones de educación financiera se ha orientado a las y los participantes sobre la importancia del hábito del ahorro, podrán ahorrar un porcentaje de las utilidades generadas por la comercialización de sus productos. d) Se ha iniciado el proceso de firma de cartas de entendimiento con instituciones públicas como la Secretaría de Agricultura y Ganadería -SAG, a través de la Dirección de Investigación de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) para brindar asesoría técnica a las y los productores de aguacate. Además, se ha iniciado procesos de articulación con otros programas y proyectos presentes en el territorio entre ellos Catholic Relief Services- CRS Honduras y el Proyecto Pro-Occidente, estos programas y proyectos tendrán mayor permanencia en los territorios y podrán dar seguimiento a algunas acciones del proyecto.

5.2. Innovación

5.2.1. ¿Ha introducido la TC alguna innovación clave (nuevos procesos o nuevos productos)?

[Sí]

5.2.2. Describa las innovaciones, si procede

Tipo de Innovación	Innovación Clave	Grado de Éxito
Producto	Instalación de tanques de geomembrana para el almacenamiento de agua para los sistemas de riego por goteo	Los tanques de geomembrana son una tecnología de fácil instalación y adopción por parte de los productores y productoras. Además, el material es resistente y de larga duración.

5.3. Movilización

5.3.1. Proporcione información pertinente sobre la movilización de recursos financieros en relación con esta operación. Incluya la cantidad estimada, así como una breve descripción del esfuerzo de apalancamiento previsto y las entidades relacionadas.

Monto	Tipo	Fuente
3500.00	Directo	Público
2000.00	Directo	Privado

5.3.2. Utilización de los resultados. Proporcione ejemplos de cómo el beneficiario ha utilizado (o tiene previsto utilizar) los productos financiados con los recursos de la operación. Tenga en cuenta que si se trata del informe final, este campo es obligatorio y debe cumplimentarse.

- En el caso de DICTA / SAG, es un apoyo en especie ya que ha facilitado el camión en tres ocasiones para el transporte de materiales hacia las comunidades participantes en el proyecto, igual en una oportunidad facilitó el salón de reuniones para la realización de un foro ambiental con gobiernos locales. -En el caso de PRO -OCCIDENTE (Fondos BID), el apoyo consiste en la facilitación de cuatro jornadas de capacitación sobre nutrición e higiene - dirigida a productores de las comunidades de Intibucá. En una de las jornadas también participó el personal técnico de Red COMAL, quienes a su vez están haciendo la replica de los conocimientos a fin de capacitar a las y los productores en otras comunidades del área de influencia del proyecto. - Catholic Relief Services- CRS Honduras, apoyó en la facilitación del taller sobre Educación financiera dirigido a integrantes de las juntas directivas regionales y juntas directivas de las cajas de ahorro y crédito afiliadas a Red COMAL en el área de influencia del proyecto.

6. Socios y Consultorías

6.1. Socios

6.1.1. Socios

Tipo de Socio	Compromiso del Socio	Nombre del Socio
Ministry / Agency (Public)	La Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Investigación de Tecnología Agropecuaria - DICTA Región Lempa, se han logrado articulación con la oficina localizada en La Esperanza, Intibucá. En algunos ocaciones se ha recibido apoyo con vehículo para el transporte de materiales hacia las comunidades. Se ha coordinado apoyo con asesoría técnica a los productores en el cultivo de aguacate Hass en comunidades de Intibucá. Además, con el proyecto Pro-Occidente (fondos BID), que depende de la SAG se ha coordinado apoyo de una especialista para la facilitación de talleres sobre nutrición e higiene dirigido a productores y productoras participantes en los huertos familiares.	
International / Multilateral Organization	Se ha iniciado un proceso de articulación y gestión de firma de carta de entendimiento con Catholic Relief Services- CRS Honduras, esta agencia de cooperación internacional está implementando proyectos con componentes similares en algunas comunidades del área de influencia de la Red COMAL, actualmente se ha recibido apoyo técnico con especialista en la facilitación de taller de educación financiera dirigido a integrantes de las juntas directivas de las organizaciones comunitarias y de las juntas directivas de los comités regionales. Además, se prevé la posibilidad de coinversión de recursos en infraestructura productiva y en procesos de capacitación dirigida a las y los productores.	

6.2. Consultorías

6.2.1. Consultorías

Nombre	Tipo	Nacionalidad	Comienzo del Contrato	Fin del Contrato	Monto	Objetivo de la Consultoría	Evaluación de la Calidad
Wilfredo Vásquez Zeledón	Particulares	Nicaraguense	2023-12-5	2024-2-1	5003.30	Elaborar una línea de base a través del levantamiento de información y datos que debidamente procesados permitan conocer la dinámica actual a nivel organizativo, alimentario, económico, productivo y de comercialización de los productores y productoras organizados y no organizados que participan en el proyecto No. proyecto ATN / GA 20351 -HO "Fortalecimiento de capacidades para la resiliencia climática y el empoderamiento económico de los pequeños productores rurales en el corredor seco de Honduras"	Satisfactorio
Alexis Zepeda Cerna	Particulares	Hondureña	2024-3-5	2024-7-8	8950.00	Elaborar una estrategia de producción y comercialización de las tres cadenas productivas impulsadas por el proyecto ATN / GA 20351 -HO "Fortalecimiento de capacidades para la resiliencia climática y el empoderamiento económico de los pequeños productores rurales en el corredor seco de Honduras"; de manera que permita	Satisfactorio

						tener un diagnóstico de oferta y demanda de los cultivos de aguacate, hortalizas y miel que Red COMAL podría ofrecer en mercados locales, nacionales e internacionales.	
Wilfredo Vásquez Zeledón	Particulares	Nicaraguense	2024-6-12	2024-6-14	2400.00	Desarrollar un proceso de formación-sensibilización a través de un taller dirigido a directivos regionales de Intibucá, La Paz y Lempira con metodologías de educación popular. Lúdicas y de fácil aprendizaje sobre los temas siguientes: Liderazgo, Derechos constitucionales, transparencia (rendición de cuentas), Procedimientos para el buen manejo de los créditos, Monitoreo de la calidad del servicio y Fortalecimiento Organizacional, Trabajo en equipo.	Satisfactorio
Nery Leonel Mendez Pineda	Particulares	Hondureña	2024-6-18	2024-9-23	20255.87	Construir 10 reservorios para almacenamiento de agua, cada uno con capacidad de 93 mts cúbicos (93,000 litros) con dimensiones; 6.5mts de ancho x 16mts de largo x 1.20mts de alto, con piso cubierto con geomembrana calibre 1mm de 7.5mts de ancho x 17mts de largo, cerco perimetral de malla ciclón y techo con malla sombra, beneficiando a familias integrantes de 10 organizaciones comunitarias participantes del proyecto.	Satisfactorio

INDICADORES

 Superado
  Logrado
  Pendiente
  En proceso
  Atrasado

C1: Desarrollo de cadenas de valor mediante enfoques agroecológicos

Peso: 84%

Calificación: Satisfactorio

C2: Seguridad alimentaria y nutricional

Peso: 10%


Calificación: Satisfactorio

C3: Fortalecimiento de la capacidad organizacional

Peso: 6%

Calificación: Satisfactorio

HITOS

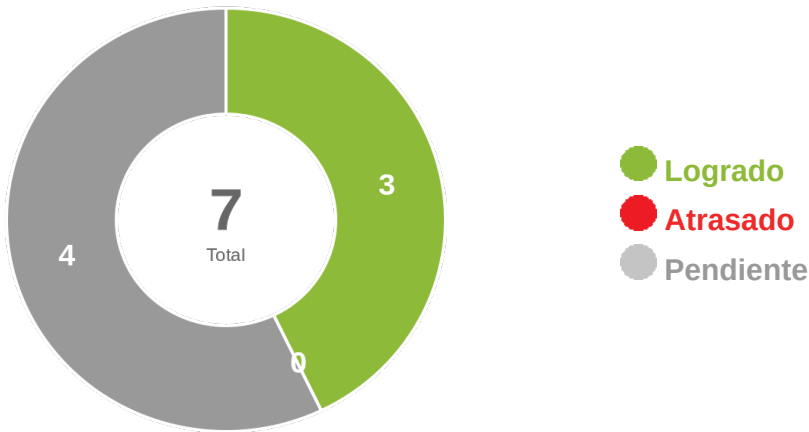

Hitos	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
*Condiciones Previas / Prior Conditions	1	2024-04-17	2023-11-15	✓
*Mapeo de línea base completado	1	2024-05-30	2024-04-03	✓
*Establecimiento de tres escuelas de campo con enfoque de producción agro	3	2024-12-15	2024-09-30	✓
*Diseño del plan de formación en servicios de nutrición y prácticas higiénicas	1	2025-06-30		...
*Curricula de capacitación en educación financiera desarrollada	1	2026-03-01		...
*10 bancos de semillas establecidos	10	2025-11-30		...
*Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas del proyecto	1	2026-10-30		...
