


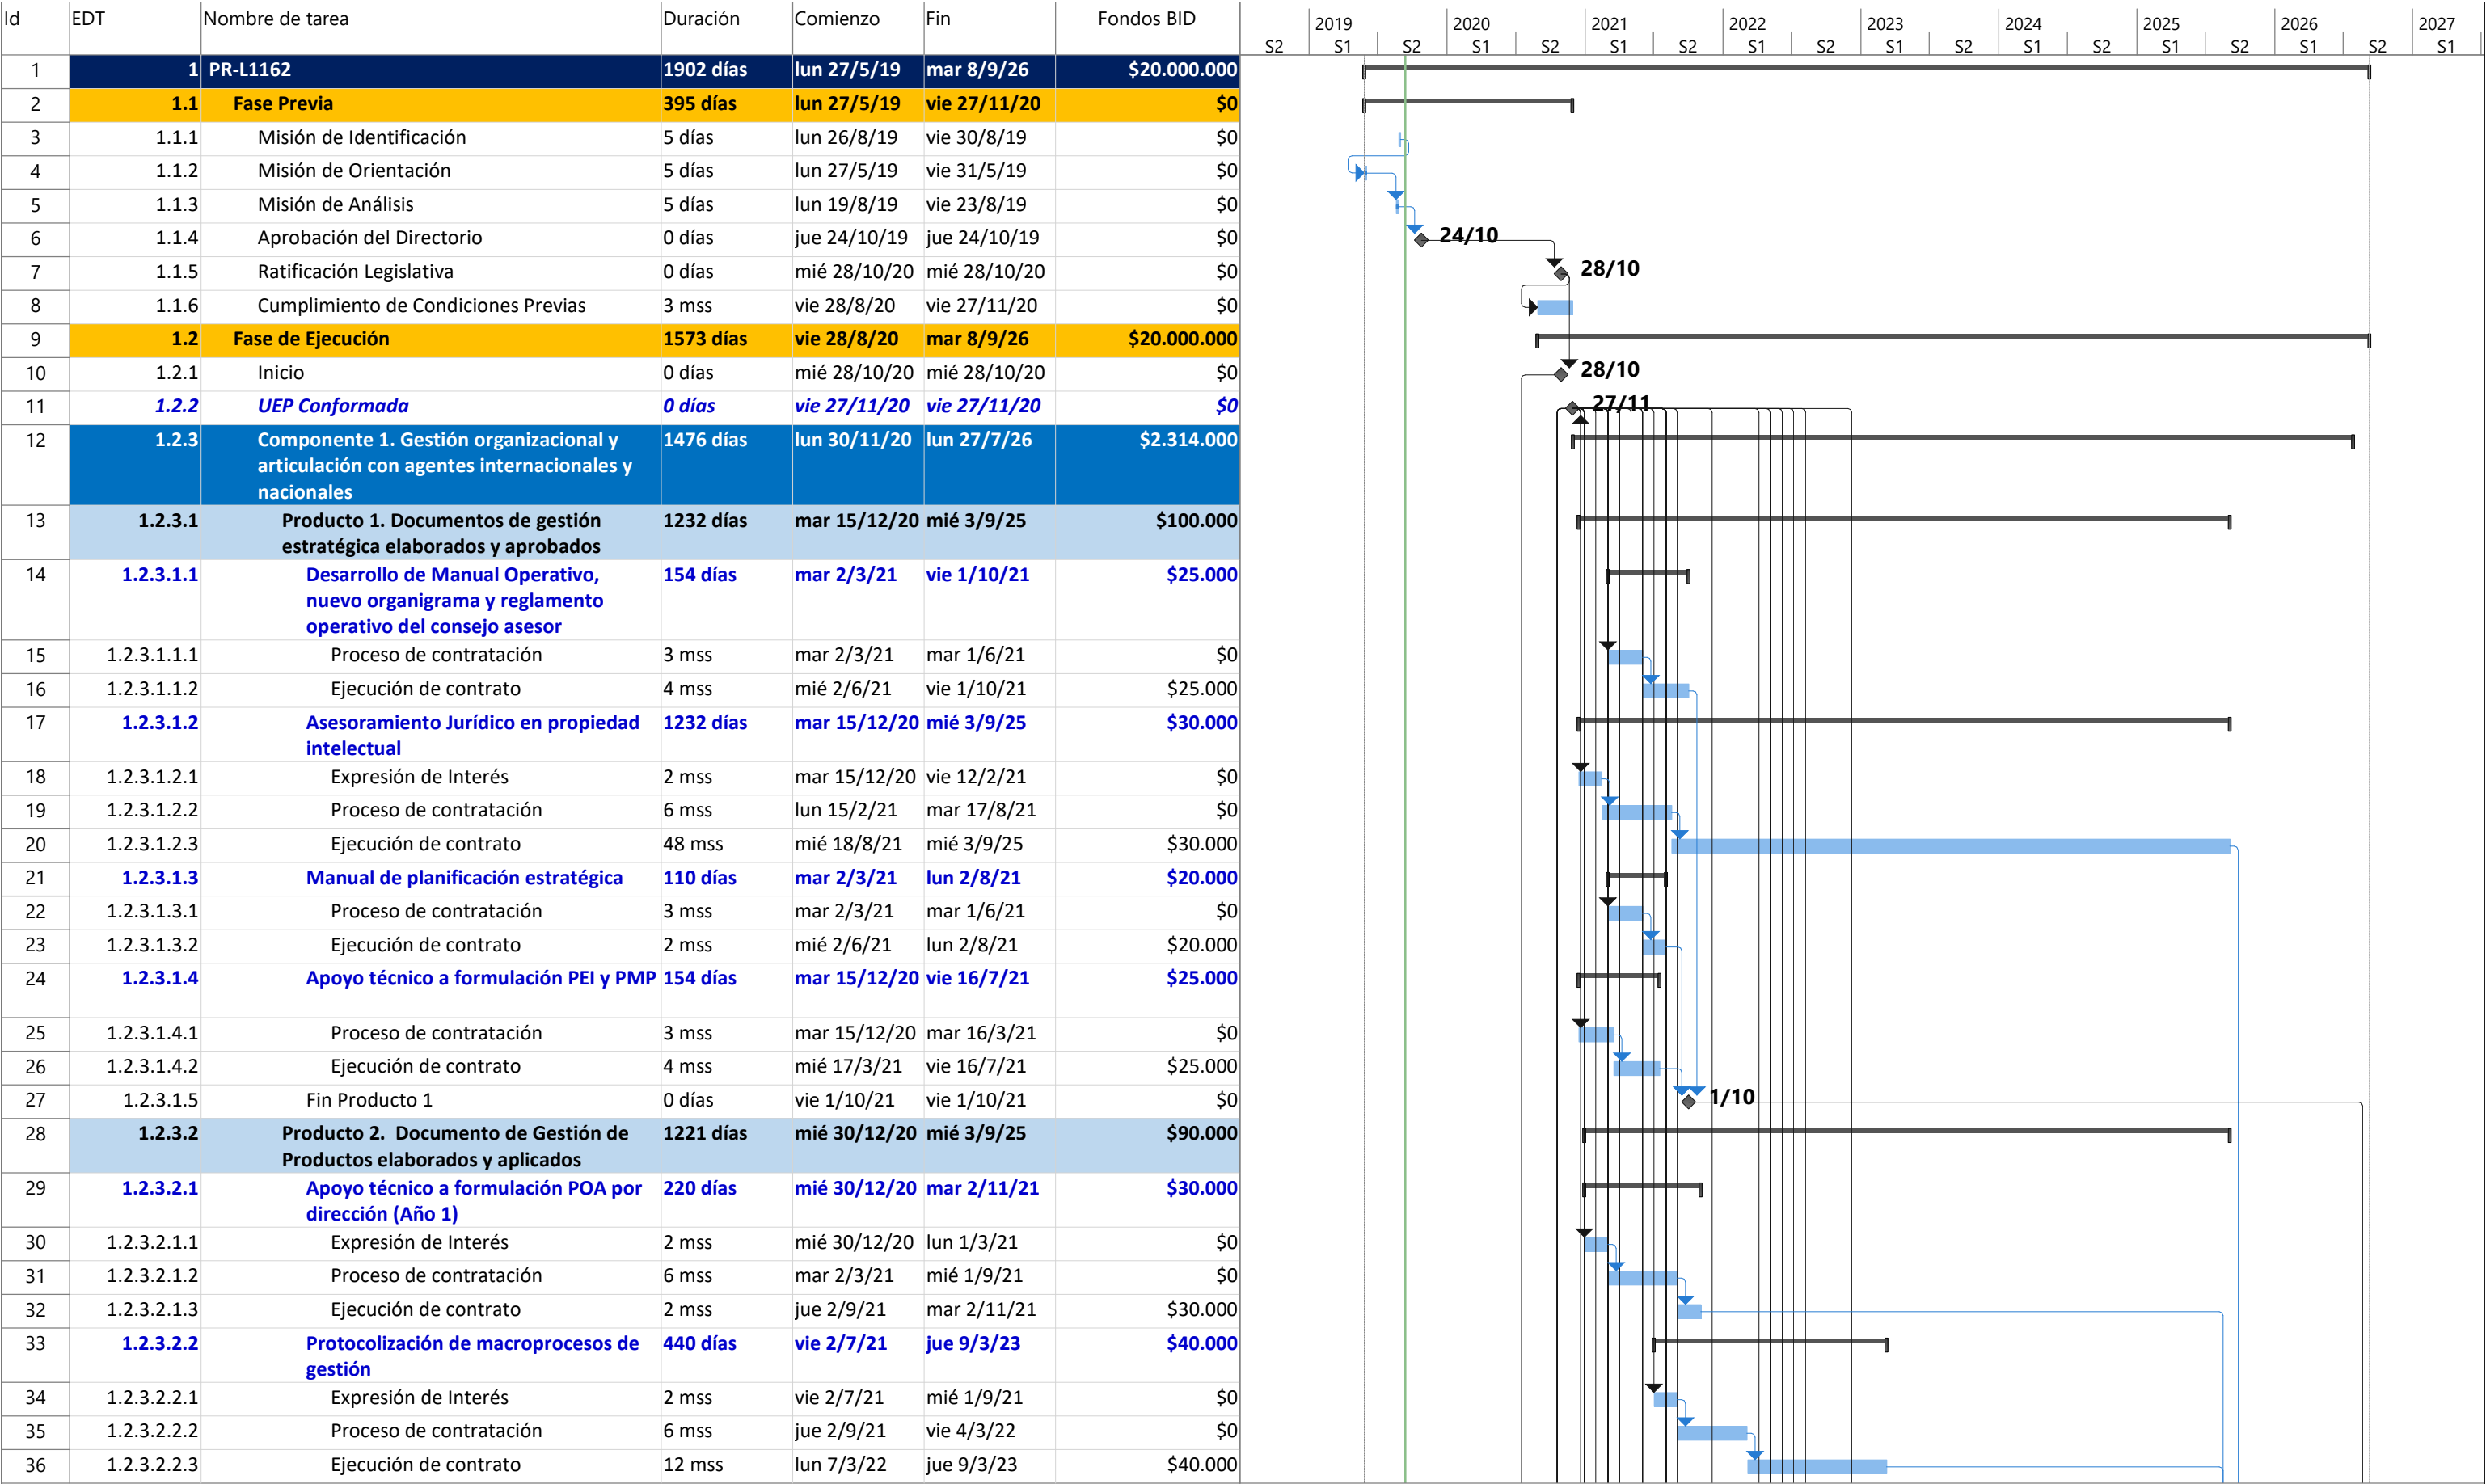

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
37	1.2.3.2.3	Manual de monitoreo y evaluación	198 días	mié 2/6/21	vie 4/3/22	\$20.000																		
38	1.2.3.2.3.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$0																		
39	1.2.3.2.3.2	Ejecución de contrato	6 mss	jue 2/9/21	vie 4/3/22	\$20.000																		
40	1.2.3.2.4	Fin Producto 2	0 días	mié 3/9/25	mié 3/9/25	\$0																		
41	1.2.3.3	Producto 3. Sistema de gestión informática desarrollado y operativo	550 días	mar 2/3/21	lun 10/4/23	\$1.040.000																		
42	1.2.3.3.1	Adquisición de equipamiento	220 días	mar 2/3/21	lun 3/1/22	\$240.000																		
43	1.2.3.3.1.1	Proceso de contratación	5 mss	mar 2/3/21	lun 2/8/21	\$0																		
44	1.2.3.3.1.2	Plazo de entrega	5 mss	mar 3/8/21	lun 3/1/22	\$240.000																		
45	1.2.3.3.2	Adquisición de DATA CENTER	176 días	mié 2/6/21	mié 2/2/22	\$450.000																		
46	1.2.3.3.2.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$0																		
47	1.2.3.3.2.2	Plazo de entrega	5 mss	jue 2/9/21	mié 2/2/22	\$450.000																		
48	1.2.3.3.3	Adquisición de Licencias	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$200.000																		
49	1.2.3.3.3.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																		
50	1.2.3.3.3.2	Plazo de entrega	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$200.000																		
51	1.2.3.3.4	Desarrollo de Sistema CRM POA	440 días	mar 3/8/21	lun 10/4/23	\$75.000																		
52	1.2.3.3.4.1	Expresión de Interés	2 mss	mar 3/8/21	vie 1/10/21	\$0																		
53	1.2.3.3.4.2	Proceso de contratación	6 mss	lun 4/10/21	mar 5/4/22	\$0																		
54	1.2.3.3.4.3	Ejecución de contrato	12 mss	mié 6/4/22	lun 10/4/23	\$75.000																		
55	1.2.3.3.5	Desarrollo de Sistema de gestión Integrada Financiera	440 días	mar 3/8/21	lun 10/4/23	\$75.000																		
56	1.2.3.3.5.1	Expresión de Interés	2 mss	mar 3/8/21	vie 1/10/21	\$0																		
57	1.2.3.3.5.2	Proceso de contratación	6 mss	lun 4/10/21	mar 5/4/22	\$0																		
58	1.2.3.3.5.3	Ejecución de contrato	12 mss	mié 6/4/22	lun 10/4/23	\$75.000																		
59	1.2.3.3.6	Fin Producto 3	0 días	lun 10/4/23	lun 10/4/23	\$0																		
60	1.2.3.4	Producto 4. Documentación de gestión de RRHH elaborados	286 días	lun 30/11/20	lun 3/1/22	\$645.000																		
61	1.2.3.4.1	Desarrollo de Manual de Planificación y seguimiento a la implementación	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$20.000																		
62	1.2.3.4.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																		
63	1.2.3.4.1.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$20.000																		
64	1.2.3.4.2	Manual de puestos y perfiles	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$20.000																		
65	1.2.3.4.2.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																		
66	1.2.3.4.2.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$20.000																		
67	1.2.3.4.3	Desarrollo de nuevo instrumento de evaluación de desempeño y seguimiento a la implementación	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$25.000																		
68	1.2.3.4.3.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																		
69	1.2.3.4.3.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$25.000																		
70	1.2.3.4.4	Propuesta técnica de grilla salarial y Plan de Carrera	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$25.000																		
71	1.2.3.4.4.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																		
72	1.2.3.4.4.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$25.000																		
73	1.2.3.4.5	Paquete de becas de formación	274 días	lun 30/11/20	jue 16/12/21	\$515.000																		

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
74	1.2.3.4.5.1	Firma de Convenio con BECAL	2 mss	lun 30/11/20	jue 28/1/21	\$0																		
75	1.2.3.4.5.2	Transferencia a BECAL	10 días	vie 3/12/21	jue 16/12/21	\$515.000																		
76	1.2.3.4.6	Gestión del cambio (Encuesta de clima y coach)	264 días	mié 30/12/20	lun 3/1/22	\$40.000																		
77	1.2.3.4.6.1	Expresión de Interés	2 mss	mié 30/12/20	lun 1/3/21	\$0																		
78	1.2.3.4.6.2	Proceso de contratación	6 mss	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$0																		
79	1.2.3.4.6.3	Ejecución de contrato	4 mss	jue 2/9/21	lun 3/1/22	\$40.000																		
80	1.2.3.4.7	Fin Producto 4	0 días	lun 3/1/22	lun 3/1/22	\$0																		
81	1.2.3.5	Producto 5. Apoyo a la estrategia de Comercialización de productos tecnológicos (marca IPTA) Marketing, Propiedad Intelectual desarrollada y	1432 días	vie 29/1/21	lun 27/7/26	\$439.000																		
82	1.2.3.5.1	Especialista en Vinculación Tecnológica y propiedad intelectual	1254 días	jue 1/4/21	mar 20/1/26	\$135.000																		
83	1.2.3.5.1.1	Proceso de contratación	3 mss	jue 1/4/21	jue 1/7/21	\$0																		
84	1.2.3.5.1.2	Ejecución de contrato	54 mss	vie 2/7/21	mar 20/1/26	\$135.000																		
85	1.2.3.5.2	Asesoría Jurídica en Propiedad Intelectual	1254 días	mié 2/6/21	lun 23/3/26	\$60.000																		
86	1.2.3.5.2.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$0																		
87	1.2.3.5.2.2	Ejecución de contrato	54 mss	jue 2/9/21	lun 23/3/26	\$60.000																		
88	1.2.3.5.3	Desarrollo del Plan de Marketing	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$50.000																		
89	1.2.3.5.3.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																		
90	1.2.3.5.3.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$50.000																		
91	1.2.3.5.4	Eventos de intercambio de conocimiento	1432 días	vie 29/1/21	lun 27/7/26	\$144.000																		
92	1.2.3.5.4.1	Proceso de contratación	5 mss	vie 29/1/21	jue 1/7/21	\$0																		
93	1.2.3.5.4.2	Firma de contrato	2 mss	vie 2/7/21	mié 1/9/21	\$0																		
94	1.2.3.5.4.3	Ejecución de contrato	1300 días	mar 3/8/21	lun 27/7/26	\$144.000																		
95	1.2.3.5.4.3.1	Evento 1	2 días	mar 3/8/21	mié 4/8/21	\$12.000																		
96	1.2.3.5.4.3.2	Evento 2	2 días	lun 7/2/22	mar 8/2/22	\$12.000																		
97	1.2.3.5.4.3.3	Evento 3	2 días	vie 12/8/22	lun 15/8/22	\$12.000																		
98	1.2.3.5.4.3.4	Evento 4	2 días	jue 16/2/23	vie 17/2/23	\$12.000																		
99	1.2.3.5.4.3.5	Evento 5	2 días	mié 23/8/23	jue 24/8/23	\$12.000																		
100	1.2.3.5.4.3.6	Evento 6	2 días	mar 27/2/24	mié 28/2/24	\$12.000																		
101	1.2.3.5.4.3.7	Evento 7	2 días	jue 1/8/24	vie 2/8/24	\$12.000																		
102	1.2.3.5.4.3.8	Evento 8	2 días	mié 5/2/25	jue 6/2/25	\$12.000																		
103	1.2.3.5.4.3.9	Evento 9	2 días	mar 12/8/25	mié 13/8/25	\$12.000																		
104	1.2.3.5.4.3.10	Evento 10	2 días	jue 15/1/26	vie 16/1/26	\$12.000																		
105	1.2.3.5.4.3.11	Evento 11	2 días	jue 21/5/26	vie 22/5/26	\$12.000																		
106	1.2.3.5.4.3.12	Evento 12	2 días	vie 24/7/26	lun 27/7/26	\$12.000																		
107	1.2.3.5.5	Diseño de Estrategia de vinculaciones Institucionales	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$20.000																		
108	1.2.3.5.5.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																		
109	1.2.3.5.5.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$20.000																		
110	1.2.3.5.6	Actividades de Propiedad Intelectual	264 días	vie 2/7/21	mié 6/7/22	\$30.000																		


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
111	1.2.3.5.6.1	Ejecución de contrato	12 mss	vie 2/7/21	mié 6/7/22	\$30.000																		
112	1.2.3.5.7	Fin Producto 5	0 días	lun 27/7/26	lun 27/7/26	\$0																		
113	1.2.4	Componente 2. Mejoramiento de la capacidad de innovación	1452 días	mié 30/12/20	jue 23/7/26	\$15.471.000																		
114	1.2.4.1	Producto 6. Nuevas variedades de soja y trigo desarrolladas	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$928.400																		
115	1.2.4.1.1	Profesional Univ. con Maestría en Estadística - Diseño experimental	330 días	mar 3/8/21	lun 7/11/22	\$26.400																		
116	1.2.4.1.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
117	1.2.4.1.1.2	Ejecución de contrato	12 mss	mié 3/11/21	lun 7/11/22	\$26.400																		
118	1.2.4.1.2	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Mejoramiento Genético (soja)	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
119	1.2.4.1.2.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
120	1.2.4.1.2.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
121	1.2.4.1.3	Profesional Univ. con formación de Maestría en Mejoramiento Genético (trigo)	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
122	1.2.4.1.3.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
123	1.2.4.1.3.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
124	1.2.4.1.4	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Fitopatología	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
125	1.2.4.1.4.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
126	1.2.4.1.4.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
127	1.2.4.1.5	Profesional Univ. Con formación de Maestría en Biotecnología	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
128	1.2.4.1.5.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
129	1.2.4.1.5.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
130	1.2.4.1.6	Consultoría corta para ordenar acciones y orientación en la aplicación de Biotecnología aplicada a los programas de mejoramiento de IPTA	132 días	mar 3/8/21	mié 2/2/22	\$18.000																		
131	1.2.4.1.6.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
132	1.2.4.1.6.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 3/11/21	mié 2/2/22	\$18.000																		
133	1.2.4.1.7	Visitas e intercambios regionales con socios estratégicos	132 días	mié 3/11/21	jue 5/5/22	\$24.000																		
134	1.2.4.1.7.1	Intercambios realizados	6 mss	mié 3/11/21	jue 5/5/22	\$24.000																		
135	1.2.4.1.8	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	1034 días	jue 3/2/22	mar 20/1/26	\$350.000																		
136	1.2.4.1.8.1	Ejecución	47 mss	jue 3/2/22	mar 20/1/26	\$350.000																		
137	1.2.4.1.9	Capacitación de becario de Doctorado en Mejoramiento Genético	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
138	1.2.4.1.9.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
139	1.2.4.1.10	Capacitación de becario de Doctorado en Fitopatología	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
140	1.2.4.1.10.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
141	1.2.4.1.11	Capacitación de becario de Maestría en Estadística	528 días	vie 17/12/21	mar 26/12/23	\$0																		
142	1.2.4.1.11.1	Usufructo de beca	24 mss	vie 17/12/21	mar 26/12/23	\$0																		

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
143	1.2.4.1.12	Fin Producto 6	0 días	mar 20/1/26	mar 20/1/26	\$0																		
144	1.2.4.2	Producto 7. Tecnología de manejo de soja y trigo desarrollados	1320 días	mar 2/3/21	lun 23/3/26	\$200.000																		
145	1.2.4.2.1	Consultoría Asesoramiento modelos de crecimiento de cultivos	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$15.000																		
146	1.2.4.2.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																		
147	1.2.4.2.1.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$15.000																		
148	1.2.4.2.2	Profesional Univ. con formación de Maestría en Ecofisiología de cultivo	1210 días	mar 3/8/21	lun 23/3/26	\$110.000																		
149	1.2.4.2.2.1	Proceso de contratación	5 mss	mar 3/8/21	lun 3/1/22	\$0																		
150	1.2.4.2.2.2	Ejecución de contrato	50 mss	mar 4/1/22	lun 23/3/26	\$110.000																		
151	1.2.4.2.3	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	1100 días	mar 4/1/22	lun 23/3/26	\$75.000																		
152	1.2.4.2.3.1	Ejecución de contrato	50 mss	mar 4/1/22	lun 23/3/26	\$75.000																		
153	1.2.4.2.4	Capacitación de doctorado en Ecofisiología de Cultivos	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
154	1.2.4.2.4.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
155	1.2.4.2.5	Fin Producto 7	0 días	lun 23/3/26	lun 23/3/26	\$0																		
156	1.2.4.3	Producto 8. Nuevas variedades de arroz desarrolladas	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$197.500																		
157	1.2.4.3.1	Profesional Univ. con formación de Maestría en Ecofisiología de cultivo	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
158	1.2.4.3.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
159	1.2.4.3.1.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
160	1.2.4.3.2	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	1100 días	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$87.500																		
161	1.2.4.3.2.1	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$87.500																		
162	1.2.4.3.3	Fin Producto 8	0 días	mar 20/1/26	mar 20/1/26	\$0																		
163	1.2.4.4	Producto 9.Tecnología de Riego y Manejo de Suelos en arroz ajustada	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$221.500																		
164	1.2.4.4.1	Profesional Univ. con formación de Maestría en Riego	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
165	1.2.4.4.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
166	1.2.4.4.1.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
167	1.2.4.4.2	Intercambios técnicos con Centros Regionales referentes en el cultivo de arroz	132 días	mié 3/11/21	jue 5/5/22	\$24.000																		
168	1.2.4.4.2.1	Ejecución de contrato	6 mss	mié 3/11/21	jue 5/5/22	\$24.000																		
169	1.2.4.4.3	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	1100 días	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$87.500																		
170	1.2.4.4.3.1	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$87.500																		
171	1.2.4.4.4	Capacitación de becario de Doctorado en Riego	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
172	1.2.4.4.4.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
173	1.2.4.4.5	Fin Producto 9	0 días	mar 20/1/26	mar 20/1/26	\$0																		
174	1.2.4.5	Producto 10. Variedades hortícolas y de cultivo de renta de la agricultura familiar adaptado	1320 días	mié 30/12/20	mar 20/1/26	\$777.200																		

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	
175	1.2.4.5.1	Profesional Univ. Con formación de Maestría en Cultivos de tejidos	1166 días	mié 30/12/20	mié 18/6/25	\$110.000																		
176	1.2.4.5.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 30/12/20	mié 31/3/21	\$0																		
177	1.2.4.5.1.2	Ejecución de contrato	50 mss	jue 1/4/21	mié 18/6/25	\$110.000																		
178	1.2.4.5.2	Profesional Univ. con formación de Maestría en Post-Cosecha	858 días	mar 3/8/21	jue 14/11/24	\$79.200																		
179	1.2.4.5.2.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
180	1.2.4.5.2.2	Ejecución de contrato	36 mss	mié 3/11/21	jue 14/11/24	\$79.200																		
181	1.2.4.5.3	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Nutrición de Cultivos y Riego	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
182	1.2.4.5.3.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
183	1.2.4.5.3.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
184	1.2.4.5.4	Consultoría de Ecofisiología de cultivos hortícolas	110 días	mar 3/8/21	lun 3/1/22	\$14.000																		
185	1.2.4.5.4.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
186	1.2.4.5.4.2	Ejecución de contrato	2 mss	mié 3/11/21	lun 3/1/22	\$14.000																		
187	1.2.4.5.5	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	132 días	mié 3/11/21	jue 5/5/22	\$125.000																		
188	1.2.4.5.5.1	Ejecución de contrato	6 mss	mié 3/11/21	jue 5/5/22	\$125.000																		
189	1.2.4.5.6	Capacitación de becario de Doctorado en Nutrición de Cultivos y Riego en cultivos intensivos	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
190	1.2.4.5.6.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
191	1.2.4.5.7	Capacitación de becario de Maestría en Postcosecha	550 días	lun 4/10/21	vie 10/11/23	\$0																		
192	1.2.4.5.7.1	Transferencia Recursos a BECAL	1 ms	lun 4/10/21	mar 2/11/21	\$0																		
193	1.2.4.5.7.2	Usufructo de beca	24 mss	mié 3/11/21	vie 10/11/23	\$0																		
194	1.2.4.5.8	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Ecofisiología de cultivos	1166 días	mié 30/12/20	mié 18/6/25	\$145.000																		
195	1.2.4.5.8.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 30/12/20	mié 31/3/21	\$0																		
196	1.2.4.5.8.2	Ejecución de contrato	50 mss	jue 1/4/21	mié 18/6/25	\$145.000																		
197	1.2.4.5.9	Intercambios técnicos con Centros Regionales en cultivos industriales	110 días	vie 2/7/21	jue 2/12/21	\$16.000																		
198	1.2.4.5.9.1	Ejecución de contrato	5 mss	vie 2/7/21	jue 2/12/21	\$16.000																		
199	1.2.4.5.10	Consultoría para ajuste de objetivos de investigación en cultivos de renta	176 días	mié 30/12/20	mié 1/9/21	\$18.000																		
200	1.2.4.5.10.1	Proceso de contratación	5 mss	mié 30/12/20	mar 1/6/21	\$0																		
201	1.2.4.5.10.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$18.000																		
202	1.2.4.5.11	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	1056 días	vie 2/7/21	vie 18/7/25	\$125.000																		
203	1.2.4.5.11.1	Ejecución de contrato	48 mss	vie 2/7/21	vie 18/7/25	\$125.000																		
204	1.2.4.5.12	Capacitación de Becario de Doctorado en Ecofisiología de cultivos	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
205	1.2.4.5.12.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
206	1.2.4.5.13	Fin Producto 10	0 días	mar 20/1/26	mar 20/1/26	\$0																		

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
207	1.2.4.6	Producto 11. Tecnologías de manejo de los cultivos hortícolas y de renta de la AF ajustadas	1320 días	mié 30/12/20	mar 20/1/26	\$498.000																		
208	1.2.4.6.1	Profesional Univ. con formación de Maestría en Ciencias del Suelo	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
209	1.2.4.6.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
210	1.2.4.6.1.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$110.000																		
211	1.2.4.6.2	Profesional Univ. con formación de Maestría en Agronomía, énfasis en Fruticultura (banano y piña)	1166 días	mié 30/12/20	mié 18/6/25	\$110.000																		
212	1.2.4.6.2.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 30/12/20	mié 31/3/21	\$0																		
213	1.2.4.6.2.2	Ejecución de contrato	50 mss	jue 1/4/21	mié 18/6/25	\$110.000																		
214	1.2.4.6.3	Profesional Univ. con formación de Maestría en Fitopatología	1166 días	mié 30/12/20	mié 18/6/25	\$110.000																		
215	1.2.4.6.3.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 30/12/20	mié 31/3/21	\$0																		
216	1.2.4.6.3.2	Ejecución de contrato	50 mss	jue 1/4/21	mié 18/6/25	\$110.000																		
217	1.2.4.6.4	Consultoría en sistemas de producción familiar	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$18.000																		
218	1.2.4.6.4.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																		
219	1.2.4.6.4.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$18.000																		
220	1.2.4.6.5	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	1100 días	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$150.000																		
221	1.2.4.6.5.1	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$150.000																		
222	1.2.4.6.6	Capacitación de becario de Doctorado en Fitopatología	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
223	1.2.4.6.6.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
224	1.2.4.6.7	Fin Producto 11	0 días	mar 20/1/26	mar 20/1/26	\$0																		
225	1.2.4.7	Producto 12. Cuantificación y simulación del stock de Carbono y emisiones en sistemas agrícolas y ganaderos	1154 días	mar 3/8/21	vie 2/1/26	\$517.800																		
226	1.2.4.7.1	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Ciencias del Suelo	858 días	mié 6/4/22	vie 18/7/25	\$104.400																		
227	1.2.4.7.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 6/4/22	mié 6/7/22	\$0																		
228	1.2.4.7.1.2	Ejecución de contrato	36 mss	jue 7/7/22	vie 18/7/25	\$104.400																		
229	1.2.4.7.2	Consultoría - Modelos de simulación de nutrientes	132 días	vie 7/10/22	lun 10/4/23	\$15.000																		
230	1.2.4.7.2.1	Proceso de contratación	3 mss	vie 7/10/22	vie 6/1/23	\$0																		
231	1.2.4.7.2.2	Ejecución de contrato	3 mss	lun 9/1/23	lun 10/4/23	\$15.000																		
232	1.2.4.7.3	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	792 días	jue 7/7/22	vie 18/7/25	\$200.000																		
233	1.2.4.7.3.1	Ejecución de contrato	36 mss	jue 7/7/22	vie 18/7/25	\$200.000																		
234	1.2.4.7.4	Capacitación de becario de Doctorado en Ciencias del Suelo	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
235	1.2.4.7.4.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
236	1.2.4.7.5	Profesional universitario con formación de Doctorado en Nutrición Animal	330 días	mar 3/8/21	lun 7/11/22	\$34.800																		
237	1.2.4.7.5.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
238	1.2.4.7.5.2	Ejecución de contrato	12 mss	mié 3/11/21	lun 7/11/22	\$34.800																		
239	1.2.4.7.6	Intercambios con centros Regionales en balance de carbono en sistemas ganaderos	264 días	mié 3/11/21	lun 7/11/22	\$12.000																		
240	1.2.4.7.6.1	Ejecución de contrato	12 mss	mié 3/11/21	lun 7/11/22	\$12.000																		
241	1.2.4.7.7	Profesional universitario con formación de Maestría en Ciencias del Suelo	462 días	lun 8/8/22	mar 14/5/24	\$39.600																		
242	1.2.4.7.7.1	Proceso de contratación	3 mss	lun 8/8/22	lun 7/11/22	\$0																		
243	1.2.4.7.7.2	Ejecución de contrato	18 mss	mar 8/11/22	mar 14/5/24	\$39.600																		
244	1.2.4.7.8	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	396 días	mar 8/11/22	mar 14/5/24	\$40.000																		
245	1.2.4.7.8.1	Ejecución de contrato	18 mss	mar 8/11/22	mar 14/5/24	\$40.000																		
246	1.2.4.7.9	Consultoría de estimación balance de carbono	440 días	vie 3/12/21	jue 10/8/23	\$72.000																		
247	1.2.4.7.9.1	Expresión de Interés	2 mss	vie 3/12/21	mié 2/2/22	\$0																		
248	1.2.4.7.9.2	Proceso de contratación	6 mss	jue 3/2/22	vie 5/8/22	\$0																		
249	1.2.4.7.9.3	Ejecución de contrato	12 mss	lun 8/8/22	jue 10/8/23	\$72.000																		
250	1.2.4.7.10	Capacitación de becario de Doctorado en Nutrición Animal	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
251	1.2.4.7.10.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
252	1.2.4.7.11	Fin Producto 12	0 días	vie 18/7/25	vie 18/7/25	\$0																		
253	1.2.4.8	Producto 13. Tecnología de manejo de enfermedades y plagas en cultivos agrícolas extensivo e intensivos desarrolla	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$498.000																		
254	1.2.4.8.1	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Malherbología	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
255	1.2.4.8.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
256	1.2.4.8.1.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
257	1.2.4.8.2	Intercambios regionales con Argentina y Brasil para el tema resistencia de malezas	132 días	mié 3/11/21	jue 5/5/22	\$8.000																		
258	1.2.4.8.2.1	Ejecución de contrato	6 mss	mié 3/11/21	jue 5/5/22	\$8.000																		
259	1.2.4.8.3	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	1100 días	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$100.000																		
260	1.2.4.8.3.1	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$100.000																		
261	1.2.4.8.4	Capacitación de becario de Doctorado en Malherbología	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
262	1.2.4.8.4.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		
263	1.2.4.8.5	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Fitopatología	1166 días	mar 3/8/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
264	1.2.4.8.5.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 3/8/21	mar 2/11/21	\$0																		
265	1.2.4.8.5.2	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$145.000																		
266	1.2.4.8.6	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	1100 días	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$100.000																		
267	1.2.4.8.6.1	Ejecución de contrato	50 mss	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$100.000																		
268	1.2.4.8.7	Capacitación de becario de Doctorado en Fitopatología	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																		

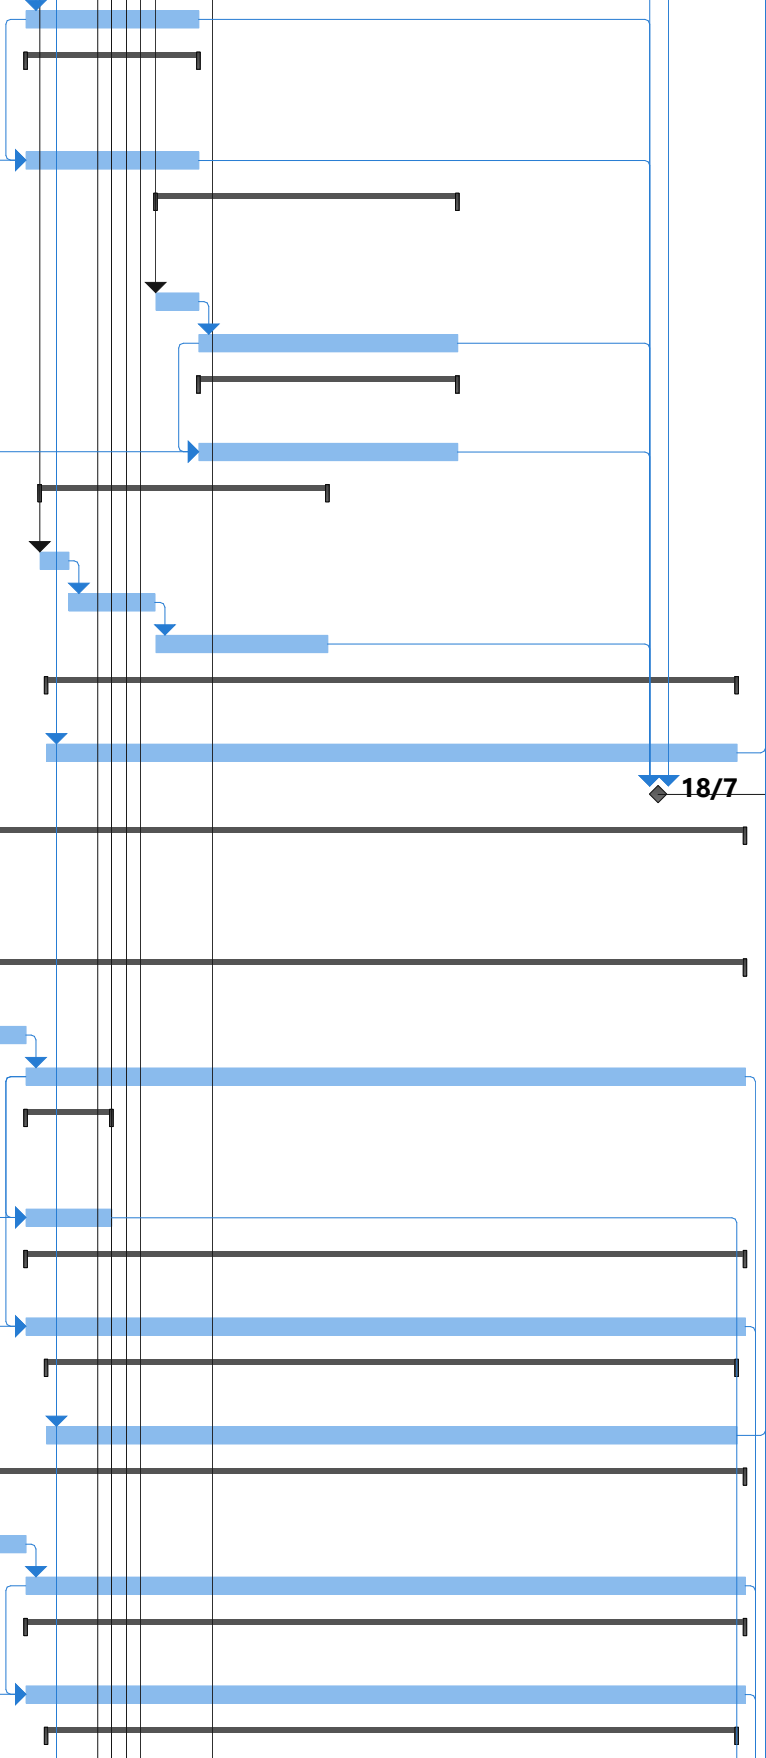

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1		S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
269	1.2.4.8.7.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																	
270	1.2.4.8.8	Fin Producto 13	0 días	mar 20/1/26	mar 20/1/26	\$0																	
271	1.2.4.9	Producto 14. Tecnología de Sistemas de producción de cría vacuna de intensificación variable desarrollados	1308 días	mié 30/12/20	vie 2/1/26	\$413.000																	
272	1.2.4.9.1	Profesional universitario con formación de Maestría en Producción Animal	1166 días	mié 30/12/20	mié 18/6/25	\$110.000																	
273	1.2.4.9.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 30/12/20	mié 31/3/21	\$0																	
274	1.2.4.9.1.2	Ejecución de contrato	50 mss	jue 1/4/21	mié 18/6/25	\$110.000																	
275	1.2.4.9.2	Profesional universitario con formación de Maestría en Manejo de Pasturas	1166 días	mié 30/12/20	mié 18/6/25	\$110.000																	
276	1.2.4.9.2.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 30/12/20	mié 31/3/21	\$0																	
277	1.2.4.9.2.2	Ejecución de contrato	50 mss	jue 1/4/21	mié 18/6/25	\$110.000																	
278	1.2.4.9.3	Consultoría en tecnologías en producción animal	132 días	mié 30/12/20	jue 1/7/21	\$18.000																	
279	1.2.4.9.3.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 30/12/20	mié 31/3/21	\$0																	
280	1.2.4.9.3.2	Ejecución de contrato	3 mss	jue 1/4/21	jue 1/7/21	\$18.000																	
281	1.2.4.9.4	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	1100 días	vie 2/7/21	jue 18/9/25	\$175.000																	
282	1.2.4.9.4.1	Ejecución de contrato	50 mss	vie 2/7/21	jue 18/9/25	\$175.000																	
283	1.2.4.9.5	Capacitación de becario de Doctorado en Manejo y Ecofisiología de pastizales	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																	
284	1.2.4.9.5.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																	
285	1.2.4.9.6	Capacitación de becario de Doctorado en Producción Animal	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																	
286	1.2.4.9.6.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																	
287	1.2.4.9.7	Fin Producto 14	0 días	jue 18/9/25	jue 18/9/25	\$0																	
288	1.2.4.10	Producto 15. Diagnóstico y cuantificación del impacto de enfermedades reproductivas y parasitarias desarrollado	1264 días	mar 2/3/21	vie 2/1/26	\$231.000																	
289	1.2.4.10.1	Consultoría para el desarrollo del área de salud animal	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$18.000																	
290	1.2.4.10.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																	
291	1.2.4.10.1.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$18.000																	
292	1.2.4.10.2	Profesional Univ. con formación de Doctorado en Sanidad Animal	858 días	jue 7/7/22	lun 20/10/25	\$108.000																	
293	1.2.4.10.2.1	Proceso de contratación	3 mss	jue 7/7/22	jue 6/10/22	\$0																	
294	1.2.4.10.2.2	Ejecución de contrato	36 mss	vie 7/10/22	lun 20/10/25	\$108.000																	
295	1.2.4.10.3	Insumos y suministros (gastos directos de investigación)	792 días	vie 7/10/22	lun 20/10/25	\$105.000																	
296	1.2.4.10.3.1	Ejecución de contrato	36 mss	vie 7/10/22	lun 20/10/25	\$105.000																	
297	1.2.4.10.4	Capacitación de becario de Doctorado en Sanidad Animal	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																	
298	1.2.4.10.4.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																	
299	1.2.4.10.5	Fin Producto 15	0 días	lun 20/10/25	lun 20/10/25	\$0																	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1		S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
300	1.2.4.11	Producto 16. Estudios de identificación de temas Forestales de investigación realizados.	1264 días	mar 2/3/21	vie 2/1/26	\$312.000																	
301	1.2.4.11.1	Consultoría para el desarrollo del área de salud animal	132 días	mar 2/3/21	mié 1/9/21	\$12.000																	
302	1.2.4.11.1.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 2/3/21	mar 1/6/21	\$0																	
303	1.2.4.11.1.2	Ejecución de contrato	3 mss	mié 2/6/21	mié 1/9/21	\$12.000																	
304	1.2.4.11.2	Fondos Concursables	902 días	vie 6/5/22	lun 20/10/25	\$300.000																	
305	1.2.4.11.2.1	Proceso de contratación	5 mss	vie 6/5/22	jue 6/10/22	\$0																	
306	1.2.4.11.2.2	Ejecución de contrato	36 mss	vie 7/10/22	lun 20/10/25	\$300.000																	
307	1.2.4.11.3	Capacitación de becario de Doctorado en Sanidad Animal	1056 días	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																	
308	1.2.4.11.3.1	Usufructo de beca	48 mss	vie 17/12/21	vie 2/1/26	\$0																	
309	1.2.4.11.4	Fin Producto 16	0 días	lun 20/10/25	lun 20/10/25	\$0																	
310	1.2.4.12	Producto 17. Infraestructura, equipos y maquinaria agrícola de Centros de Investigación equipados y en funcionamiento	1330 días	mar 2/3/21	lun 6/4/26	\$9.601.800																	
311	1.2.4.12.1	Diseño del modelo organización de la DPNC (Incluye Licencias Ambientales)	352 días	mar 2/3/21	mié 6/7/22	\$211.685																	
312	1.2.4.12.1.1	Expresión de Interés	2 mss	mar 2/3/21	vie 30/4/21	\$0																	
313	1.2.4.12.1.2	Proceso de contratación	6 mss	lun 3/5/21	mar 2/11/21	\$0																	
314	1.2.4.12.1.3	Ejecución de contrato	8 mss	mié 3/11/21	mié 6/7/22	\$211.685																	
315	1.2.4.12.2	Contratación de Constructora para Refracción y mejoras de Centros de Investigación	528 días	mié 7/9/22	vie 13/9/24	\$2.833.705																	
316	1.2.4.12.2.1	Proceso de contratación	6 mss	mié 7/9/22	jue 9/3/23	\$0																	
317	1.2.4.12.2.2	Ejecución de contrato	396 días	vie 10/3/23	vie 13/9/24	\$2.833.705																	
318	1.2.4.12.2.2.1	Centro - Cap. Miranda	12 mss	vie 10/3/23	mié 13/3/24	\$605.100																	
319	1.2.4.12.2.2.2	Centro - Chore	12 mss	vie 10/3/23	mié 13/3/24	\$573.945																	
320	1.2.4.12.2.2.3	Centro - Caacupé	18 mss	vie 10/3/23	vie 13/9/24	\$1.165.400																	
321	1.2.4.12.2.2.4	Centro - Barrerito	12 mss	vie 10/3/23	mié 13/3/24	\$489.260																	
322	1.2.4.12.3	Contratación de Firma para Instalaciones Eléctricas	264 días	vie 10/3/23	mié 13/3/24	\$213.325																	
323	1.2.4.12.3.1	Proceso de contratación	6 mss	vie 10/3/23	lun 11/9/23	\$0																	
324	1.2.4.12.3.2	Ejecución de contrato	6 mss	mar 12/9/23	mié 13/3/24	\$213.325																	
325	1.2.4.12.4	Fiscalización para Obras para Centro de Investigación	616 días	mar 7/6/22	mar 15/10/24	\$198.360																	
326	1.2.4.12.4.1	Expresión de Interés	2 mss	mar 7/6/22	vie 5/8/22	\$0																	
327	1.2.4.12.4.2	Proceso de contratación	6 mss	lun 8/8/22	mar 7/2/23	\$0																	
328	1.2.4.12.4.3	Ejecución de contrato	440 días	mié 8/2/23	mar 15/10/24	\$198.360																	
329	1.2.4.12.4.3.1	Centro - Cap. Miranda	14 mss	mié 8/2/23	vie 12/4/24	\$42.357																	
330	1.2.4.12.4.3.2	Centro - Chore	14 mss	mié 8/2/23	vie 12/4/24	\$40.176																	
331	1.2.4.12.4.3.3	Centro - Caacupé	20 mss	mié 8/2/23	mar 15/10/24	\$81.578																	
332	1.2.4.12.4.3.4	Centro - Barrerito	14 mss	mié 8/2/23	vie 12/4/24	\$34.249																	
333	1.2.4.12.4.4	Proceso de contratación	6 mss	mié 8/2/23	jue 10/8/23	\$0																	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
334	1.2.4.12.5	Coordinador de Obra	506 días	mar 8/11/22	mar 15/10/24	\$50.000																		
335	1.2.4.12.5.1	Proceso de contratación	3 mss	mar 8/11/22	mar 7/2/23	\$0																		
336	1.2.4.12.5.2	Ejecución de contrato	20 mss	mié 8/2/23	mar 15/10/24	\$50.000																		
337	1.2.4.12.6	Cartelería	308 días	mié 12/7/23	vie 13/9/24	\$18.000																		
338	1.2.4.12.6.1	Proceso de contratación	5 mss	mié 12/7/23	mar 12/12/23	\$0																		
339	1.2.4.12.6.2	Ejecución de contrato	142 días	jue 29/2/24	vie 13/9/24	\$18.000																		
340	1.2.4.12.6.2.1	Centro - Cap. Miranda	10 días	jue 29/2/24	mié 13/3/24	\$3.843																		
341	1.2.4.12.6.2.2	Centro - Chore	10 días	jue 29/2/24	mié 13/3/24	\$3.646																		
342	1.2.4.12.6.2.3	Centro - Caacupé	10 días	lun 2/9/24	vie 13/9/24	\$7.403																		
343	1.2.4.12.6.2.4	Centro - Barrerito	10 días	jue 29/2/24	mié 13/3/24	\$3.108																		
344	1.2.4.12.7	Equipamiento de Centros de Investigación	1044 días	mié 6/4/22	lun 6/4/26	\$3.475.125																		
345	1.2.4.12.7.1	Proceso de contratación	6 mss	mié 6/4/22	jue 6/10/22	\$0																		
346	1.2.4.12.7.2	Ejecución de contrato	802 días	vie 10/3/23	lun 6/4/26	\$3.475.125																		
347	1.2.4.12.7.2.1	Centro - Cap. Miranda	10 días	vie 10/3/23	jue 23/3/23	\$910.000																		
348	1.2.4.12.7.2.2	Centro - Chore	0,45 mss	vie 10/3/23	jue 23/3/23	\$325.000																		
349	1.2.4.12.7.2.3	Centro - Caacupé	0,45 mss	vie 10/3/23	jue 23/3/23	\$1.590.000																		
350	1.2.4.12.7.2.4	Centro - Barrerito	0,45 mss	vie 10/3/23	jue 23/3/23	\$547.000																		
351	1.2.4.12.7.2.5	Mantenimiento	36 mss	vie 24/3/23	lun 6/4/26	\$103.125																		
352	1.2.4.12.8	Especialista Técnico en Equipamiento	418 días	jue 1/4/21	lun 7/11/22	\$15.000																		
353	1.2.4.12.8.1	Proceso de contratación	3 mss	jue 1/4/21	jue 1/7/21	\$0																		
354	1.2.4.12.8.2	Ejecución de contrato Etapa 1	1 ms	vie 2/7/21	lun 2/8/21	\$2.500																		
355	1.2.4.12.8.3	Ejecución de contrato Etapa 2	5 mss	mar 7/6/22	lun 7/11/22	\$12.500																		
356	1.2.4.12.9	Contratación técnico analista especializado	330 días	mié 8/2/23	mar 14/5/24	\$384.000																		
357	1.2.4.12.9.1	Proceso de contratación	3 mss	mié 8/2/23	mié 10/5/23	\$0																		
358	1.2.4.12.9.2	Ejecución de contrato	12 mss	jue 11/5/23	mar 14/5/24	\$384.000																		
359	1.2.4.12.10	Capacitación de becario en analítica laboratorial	264 días	vie 17/12/21	mié 21/12/22	\$0																		
360	1.2.4.12.10.1	Usufructo de beca	12 mss	vie 17/12/21	mié 21/12/22	\$0																		
361	1.2.4.12.11	Insumos y suministros para Centros de Investigación	396 días	jue 11/5/23	jue 14/11/24	\$520.000																		
362	1.2.4.12.11.1	Ejecución de contrato	396 días	jue 11/5/23	jue 14/11/24	\$520.000																		
363	1.2.4.12.11.1.1	Centro - Cap. Miranda	12 mss	jue 11/5/23	mar 14/5/24	\$120.000																		
364	1.2.4.12.11.1.2	Centro - Chore	12 mss	jue 11/5/23	mar 14/5/24	\$50.000																		
365	1.2.4.12.11.1.3	Centro - Caacupé	18 mss	jue 11/5/23	jue 14/11/24	\$250.000																		
366	1.2.4.12.11.1.4	Centro - Barrerito	12 mss	jue 11/5/23	mar 14/5/24	\$100.000																		
367	1.2.4.12.12	Equipamiento de Maquinarias para Centros de Investigación	252 días	jue 2/9/21	vie 19/8/22	\$1.430.000																		
368	1.2.4.12.12.1	Proceso de contratación	6 mss	jue 2/9/21	vie 4/3/22	\$0																		
369	1.2.4.12.12.2	Ejecución de contrato	10 días	lun 8/8/22	vie 19/8/22	\$1.430.000																		
370	1.2.4.12.12.2.1	Centro - Cap. Miranda	10 días	lun 8/8/22	vie 19/8/22	\$400.000																		
371	1.2.4.12.12.2.2	Centro - Chore	0,45 mss	lun 8/8/22	vie 19/8/22	\$215.000																		
372	1.2.4.12.12.2.3	Centro - Caacupé	0,45 mss	lun 8/8/22	vie 19/8/22	\$480.000																		

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
373	1.2.4.12.12.2.4	Centro - Barrerito	0,45 mss	lun 8/8/22	vie 19/8/22	\$335.000																		
374	1.2.4.12.13	Especialista Técnico en Maquinaria	418 días	jue 1/4/21	lun 7/11/22	\$12.600																		
375	1.2.4.12.13.1	Proceso de contratación	3 mss	jue 1/4/21	jue 1/7/21	\$0																		
376	1.2.4.12.13.2	Ejecución de contrato Etapa 1	1 ms	vie 2/7/21	lun 2/8/21	\$2.100																		
377	1.2.4.12.13.3	Ejecución de contrato Etapa 2	5 mss	mar 7/6/22	lun 7/11/22	\$10.500																		
378	1.2.4.12.14	Adquisición de vehículos	208 días	jue 1/4/21	lun 17/1/22	\$240.000																		
379	1.2.4.12.14.1	Proceso de contratación	6 mss	jue 1/4/21	vie 1/10/21	\$0																		
380	1.2.4.12.14.2	Ejecución de contrato	10 días	mar 4/1/22	lun 17/1/22	\$240.000																		
381	1.2.4.12.15	Fin Producto 17	0 días	lun 6/4/26	lun 6/4/26	\$0																		
382	1.2.4.13	Producto 18. Estrategia de comunicación y difusión de tecnologías disponibles desarrollada	1386 días	jue 1/4/21	jue 23/7/26	\$1.074.800																		
383	1.2.4.13.1	Especialista en Transferencia	1298 días	jue 1/4/21	lun 23/3/26	\$108.000																		
384	1.2.4.13.1.1	Proceso de contratación	5 mss	jue 1/4/21	mié 1/9/21	\$0																		
385	1.2.4.13.1.2	Ejecución de contrato	54 mss	jue 2/9/21	lun 23/3/26	\$108.000																		
386	1.2.4.13.2	Instalación de Vitrinas Tecnológicas/Demostrativos de tecnologías en Centros de Investigación	88 días	mar 7/6/22	jue 6/10/22	\$100.000																		
387	1.2.4.13.2.1	Ejecución de contrato	4 mss	mar 7/6/22	jue 6/10/22	\$100.000																		
388	1.2.4.13.3	Mantenimiento de Vitrinas Tecnológicas/Demostrativos de tecnologías en Centros de Investigación	946 días	jue 8/12/22	jue 23/7/26	\$40.000																		
389	1.2.4.13.3.1	Ejecución de contrato	946 días	jue 8/12/22	jue 23/7/26	\$40.000																		
390	1.2.4.13.3.1.1	Año 1	12 mss	jue 8/12/22	mar 12/12/23	\$10.000																		
391	1.2.4.13.3.1.2	Año 2	11 mss	mié 13/12/23	jue 14/11/24	\$10.000																		
392	1.2.4.13.3.1.3	Año 3	12 mss	vie 15/11/24	mié 19/11/25	\$10.000																		
393	1.2.4.13.3.1.4	Año 4	8 mss	jue 20/11/25	jue 23/7/26	\$10.000																		
394	1.2.4.13.4	Especialista en Comunicación, diseño grafico y Gestión de Medios	1254 días	jue 1/4/21	mar 20/1/26	\$91.800																		
395	1.2.4.13.4.1	Proceso de contratación	3 mss	jue 1/4/21	jue 1/7/21	\$0																		
396	1.2.4.13.4.2	Ejecución de contrato	54 mss	vie 2/7/21	mar 20/1/26	\$91.800																		
397	1.2.4.13.5	Nuevo Portal web	242 días	mié 3/11/21	jue 6/10/22	\$40.000																		
398	1.2.4.13.5.1	Proceso de contratación	5 mss	mié 3/11/21	mar 5/4/22	\$0																		
399	1.2.4.13.5.2	Ejecución de contrato	6 mss	mié 6/4/22	jue 6/10/22	\$40.000																		
400	1.2.4.13.6	Generación de nuevos contenidos audiovisuales	990 días	mar 7/6/22	lun 23/3/26	\$50.000																		
401	1.2.4.13.6.1	Proceso de contratación	5 mss	mar 7/6/22	lun 7/11/22	\$0																		
402	1.2.4.13.6.2	Ejecución de contrato	40 mss	mar 8/11/22	lun 23/3/26	\$50.000																		
403	1.2.4.13.7	Nuevas publicaciones	990 días	mar 7/6/22	lun 23/3/26	\$80.000																		
404	1.2.4.13.7.1	Proceso de contratación	5 mss	mar 7/6/22	lun 7/11/22	\$0																		
405	1.2.4.13.7.2	Ejecución de contrato	40 mss	mar 8/11/22	lun 23/3/26	\$80.000																		

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
406	1.2.4.13.8	Adquisición de equipamiento para impresiones (p/apoyo a demostrativos, expos nacionales, otros)	220 días	jue 2/9/21	mié 6/7/22	\$20.000																		
407	1.2.4.13.8.1	Proceso de contratación	5 mss	jue 2/9/21	mié 2/2/22	\$0																		
408	1.2.4.13.8.2	Plazo de entrega	5 mss	jue 3/2/22	mié 6/7/22	\$20.000																		
409	1.2.4.13.9	Mantenimiento e insumos para equipos	990 días	jue 7/7/22	mié 22/4/26	\$15.000																		
410	1.2.4.13.9.1	Ejecución de contrato	45 mss	jue 7/7/22	mié 22/4/26	\$15.000																		
411	1.2.4.13.10	MEGAJORNADAS IPTA en Centros de Investigación	1106 días	mié 3/11/21	mié 28/1/26	\$300.000																		
412	1.2.4.13.10.1	Ejecución de contrato	1106 días	mié 3/11/21	mié 28/1/26	\$300.000																		
413	1.2.4.13.10.1.1	Año 1	10 días	mié 3/11/21	mar 16/11/21	\$60.000																		
414	1.2.4.13.10.1.2	Año 2	10 días	mar 22/11/22	lun 5/12/22	\$60.000																		
415	1.2.4.13.10.1.3	Año 3	10 días	lun 11/12/23	vie 22/12/23	\$60.000																		
416	1.2.4.13.10.1.4	Año 4	10 días	vie 27/12/24	jue 9/1/25	\$60.000																		
417	1.2.4.13.10.1.5	Año 5	10 días	jue 15/1/26	mié 28/1/26	\$60.000																		
418	1.2.4.13.11	Apoyo visual a las 3 Exposiciones de alcance nacional	558 días	mié 3/11/21	vie 22/12/23	\$110.000																		
419	1.2.4.13.11.1	Ejecución de contrato	558 días	mié 3/11/21	vie 22/12/23	\$110.000																		
420	1.2.4.13.11.1.1	Año 1	10 días	mié 3/11/21	mar 16/11/21	\$36.000																		
421	1.2.4.13.11.1.2	Año 2	10 días	mar 22/11/22	lun 5/12/22	\$36.000																		
422	1.2.4.13.11.1.3	Año 3	10 días	lun 11/12/23	vie 22/12/23	\$38.000																		
423	1.2.4.13.12	Línea de base conocimiento, uso y satisfacción de tecnologías	110 días	lun 3/5/21	vie 1/10/21	\$10.000																		
424	1.2.4.13.12.1	Proceso de contratación	3 mss	lun 3/5/21	lun 2/8/21	\$0																		
425	1.2.4.13.12.2	Ejecución de contrato	2 mss	mar 3/8/21	vie 1/10/21	\$10.000																		
426	1.2.4.13.13	Seminarios técnicos a extensionistas públicos y privados en CI	832 días	mié 3/11/21	jue 9/1/25	\$110.000																		
427	1.2.4.13.13.1	Ejecución de contrato	832 días	mié 3/11/21	jue 9/1/25	\$110.000																		
428	1.2.4.13.13.1.1	Año 1	10 días	mié 3/11/21	mar 16/11/21	\$27.500																		
429	1.2.4.13.13.1.2	Año 2	10 días	mar 22/11/22	lun 5/12/22	\$27.500																		
430	1.2.4.13.13.1.3	Año 3	10 días	lun 11/12/23	vie 22/12/23	\$27.500																		
431	1.2.4.13.13.1.4	Año 4	10 días	vie 27/12/24	jue 9/1/25	\$27.500																		
432	1.2.4.14	Fin Producto 18	0 días	jue 23/7/26	jue 23/7/26	\$0																		
433	1.2.5	Administración del Proyecto	1573 días	vie 28/8/20	mar 8/9/26	\$1.432.000																		
434	1.2.5.1	Unidad Coordinadora funcionando	1573 días	vie 28/8/20	mar 8/9/26	\$1.432.000																		
435	1.2.5.1.1	Proceso de contratación	3 mss	vie 28/8/20	vie 27/11/20	\$0																		
436	1.2.5.1.2	UEP Conformada	0 días	vie 27/11/20	vie 27/11/20	\$0																		
437	1.2.5.1.3	Ejecución de contratos	1507 días	lun 30/11/20	mar 8/9/26	\$1.432.000																		
438	1.2.5.1.3.1	Gerente de Programa	68,5 mss	lun 30/11/20	mar 8/9/26	\$241.500																		
439	1.2.5.1.3.2	Gerente de Componente 1	68,5 mss	lun 30/11/20	mar 8/9/26	\$172.500																		
440	1.2.5.1.3.3	Gerente de Componente 2	68,5 mss	lun 30/11/20	mar 8/9/26	\$207.000																		
441	1.2.5.1.3.4	Especialista Financiero	68,5 mss	lun 30/11/20	mar 8/9/26	\$172.500																		
442	1.2.5.1.3.5	Especialista Planificación y Monitoreo	68,5 mss	lun 30/11/20	mar 8/9/26	\$172.500																		

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Fondos BID	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
443	1.2.5.1.3.6	Especialista de Adquisiciones	68,5 mss	lun 30/11/20	mar 8/9/26	\$172.500																		
444	1.2.5.1.3.7	Oficial de Apoyo Fiduciario	68,5 mss	lun 30/11/20	mar 8/9/26	\$121.000																		
445	1.2.5.1.3.8	Especialista Ambiental y Cambio Climático	68,5 mss	lun 30/11/20	mar 8/9/26	\$172.500																		
446	1.2.6	Evaluaciones realizadas	1452 días	vie 29/1/21	lun 24/8/26	\$360.000																		
447	1.2.6.1	Evaluación Intermedia	110 días	lun 12/6/23	vie 10/11/23	\$20.000																		
448	1.2.6.1.1	Proceso de contratación	2 mss	lun 12/6/23	jue 10/8/23	\$0																		
449	1.2.6.1.2	Ejecución de contrato	3 mss	vie 11/8/23	vie 10/11/23	\$20.000																		
450	1.2.6.2	Evaluación final	242 días	vie 19/9/25	lun 24/8/26	\$40.000																		
451	1.2.6.2.1	Expresión de Interés	2 mss	vie 19/9/25	mié 19/11/25	\$0																		
452	1.2.6.2.2	Proceso de contratación	5 mss	jue 20/11/25	mié 22/4/26	\$0																		
453	1.2.6.2.3	Ejecución de contrato	4 mss	jue 23/4/26	lun 24/8/26	\$40.000																		
454	1.2.6.3	Evaluación de Impacto - Línea de Base	242 días	vie 29/1/21	lun 3/1/22	\$150.000																		
455	1.2.6.3.1	Expresión de Interés	2 mss	vie 29/1/21	mié 31/3/21	\$0																		
456	1.2.6.3.2	Proceso de contratación	5 mss	jue 1/4/21	mié 1/9/21	\$0																		
457	1.2.6.3.3	Ejecución de contrato	4 mss	jue 2/9/21	lun 3/1/22	\$150.000																		
458	1.2.6.4	Evaluación de Impacto - Línea de seguimiento	242 días	vie 19/9/25	lun 24/8/26	\$150.000																		
459	1.2.6.4.1	Expresión de Interés	2 mss	vie 19/9/25	mié 19/11/25	\$0																		
460	1.2.6.4.2	Proceso de contratación	5 mss	jue 20/11/25	mié 22/4/26	\$0																		
461	1.2.6.4.3	Ejecución de contrato	4 mss	jue 23/4/26	lun 24/8/26	\$150.000																		
462	1.2.7	Auditorías Externas del Programa realizadas	1397 días	lun 3/5/21	mar 8/9/26	\$150.000																		
463	1.2.7.1	Proceso de contratación	6 mss	lun 3/5/21	mar 2/11/21	\$0																		
464	1.2.7.2	Auditoria Externa	1100 días	mié 3/11/21	mar 20/1/26	\$150.000																		
465	1.2.7.2.1	Auditoria Externa 1	44 días	mié 3/11/21	lun 3/1/22	\$30.000																		
466	1.2.7.2.2	Auditoria Externa 2	44 días	mar 8/11/22	vie 6/1/23	\$30.000																		
467	1.2.7.2.3	Auditoria Externa 3	44 días	lun 13/11/23	jue 11/1/24	\$30.000																		
468	1.2.7.2.4	Auditoria Externa 4	44 días	vie 15/11/24	mié 15/1/25	\$30.000																		
469	1.2.7.2.5	Auditoria Externa 5	44 días	jue 20/11/25	mar 20/1/26	\$30.000																		
470	1.2.7.3	Fin Administración del Programa	0 días	mar 8/9/26	mar 8/9/26	\$0																		
471	1.2.8	Imprevistos	880 días	jue 8/12/22	mié 22/4/26	\$273.000																		
472	1.2.8.1	Imprevisto	40 mss	jue 8/12/22	mié 22/4/26	\$273.000																		
473	1.2.9	Fin Programa	0 días	mar 8/9/26	mar 8/9/26	\$0																		

Mejoramiento de la Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria de Paraguay

PLAN OPERATIVO AÑO 1				2.020		2021										Año 1	
				T1			T2			T3			T4				Año 2020
				nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21		
Insumos y suministros (gastos directos de investigación)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capacitación de becario de Doctorado en Sanidad Animal				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Producto 16. Estudios de identificación de temas Forestales de				-	-	-	-	-	-	3.818	4.000	4.000	182	-	-	12.000	
Consultoría para el desarrollo del área de salud animal	Contrato firmado	Gerente Componente 2		-	-	-	-	-	-	3.818	4.000	4.000	182	-	-	12.000	
Fondos Concursables				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capacitación de becario de Doctorado en Sanidad Animal				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Producto 17. Infraestructura, equipos y maquinaria agrícola de Centros				-	-	-	-	-	-	-	4.391	209	-	-	-	4.600	
Diseño del modelo organización de la DPNC (Incluye Licencias	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente Componente 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratación de Constructora para Obras para Centro de Investigación				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratación de Firma para Instalaciones Eléctricas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fiscalización para Obras para Centro de Investigación				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coordinador de Obra				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cartelería				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equipamiento de Centros de Investigación				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Especialista Técnico en Equipamiento	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente Componente 2	-	-	-	-	-	-	-	2.386	114	-	-	-	2.500	
Contratación técnico analista especializado				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capacitación de becario en analítica laboratorial				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insumos y suministros para Centros de Investigación				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Equipamiento de Maquinarias para Centros de Investigación				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Especialista Técnico en Maquinaria	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente Componente 2	-	-	-	-	-	-	-	2.005	95	-	-	-	2.100	
Adquisición de vehículos				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Producto 18. Estrategia de comunicación y difusión de tecnologías				-	-	-	-	-	-	-	1.623	6.473	8.609	3.759	-	20.464	
Especialista en Transferencia	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente Componente 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.909	1.909	-	3.818	
Instalación de Vitrinas Tecnológicas/Demostrativos de tecnologías en				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mantenimiento de Vitrinas Tecnológicas/Demostrativos de tecnologías				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Especialista en Comunicación, diseño grafico y Gestión de Medios	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente Componente 2	-	-	-	-	-	-	-	1.623	1.700	1.700	1.623	-	6.645	
Nuevo Portal web				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Generación de nuevos contenidos audiovisuales				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nuevas publicaciones				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adquisición de equipamiento para impresiones (p/apoyo a demostrativos,				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mantenimiento e insumos para equipos				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MEGAJORNADAS IPTA en Centros de Investigación	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente Componente 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Apoyo visual a las 3 Exposiciones de alcance nacional	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente Componente 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Línea de base conocimiento, uso y satisfacción de tecnologías	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente Componente 2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.773	5.000	227	-	10.000	
Seminarios técnicos a extensionistas públicos y privados en CI	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente Componente 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administración del Proyecto				-	-	-	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	189.150	
Unidad Coordinadora funcionando				-	-	-	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017	189.150	
Gerente de Proyecto	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Presidencia del IPTA	-	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	31.500	
Gerente de Componente 1	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente del Proyecto	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	22.500	
Gerente de Componente 2	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente del Proyecto	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.000	
Especialista Financiero	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente del Proyecto	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	22.500	
Especialista Planificación y Monitoreo	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente del Proyecto	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	22.500	
Especialista de Adquisiciones	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente del Proyecto	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	22.500	
Oficial de Apoyo Fiduciario	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente del Proyecto	-	-	-	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	2.017	18.150	
Especialista Ambiental y Cambio Climático	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente del Proyecto	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	22.500	
Evaluaciones realizadas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.795	35.795	-	71.591	
Evaluación Intermedia				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Evaluación final				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Evaluación de Impacto - Línea de Base	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente del Proyecto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.795	35.795	-	71.591	
Evaluación de Impacto - Línea de seguimiento				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Auditorías Externas del Programa realizadas	Proceso de Contratación y	Contrato firmado	Gerente del Proyecto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMPREVISTO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL				-	-	-	21.017	24.142	47.167	45.978	202.996	221.516	267.709	269.197	248.207	1.347.930	
