



Fondo Multilateral de Inversiones  
Miembro del Grupo BID

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2015 - DICIEMBRE 2015

## SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

**NOMBRE DEL PROYECTO:** PROADAPT Gran Chaco

Nro. Proyecto: RG-M1264 - Proyecto No.: ATN/ME-14899-RG

**País Administrador**  
ARGENTINA


**País Beneficiario**  
ARGENTINA, BOLIVIA, PARAGUAY

**Agencia Ejecutora:** Fundación AVINA Argentina


**Líder equipo de diseño:** ZACHARY LEVEY

**Líder equipo de supervisión:** MARIEL SABRA


### CICLO DEL PROYECTO

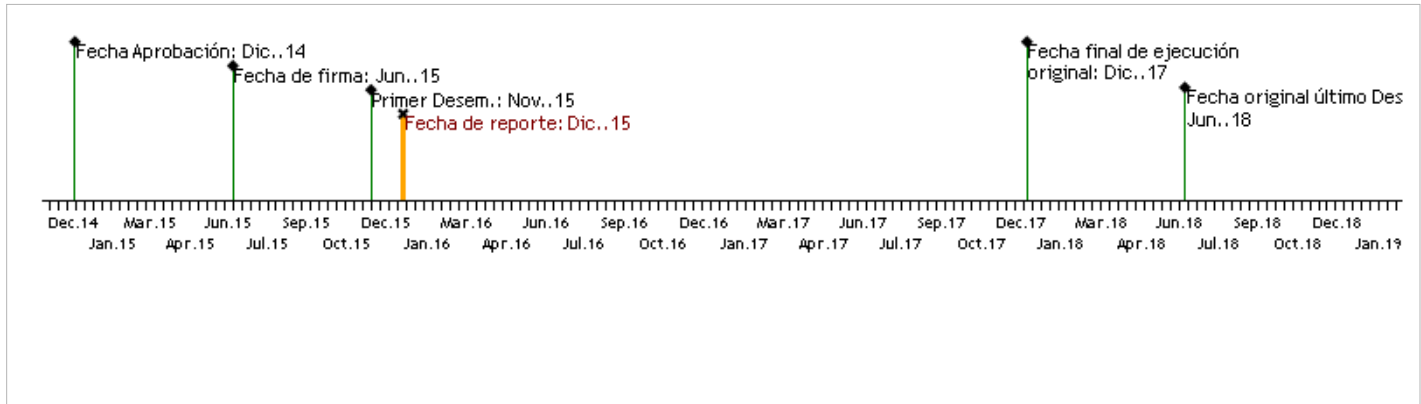

### RECURSOS

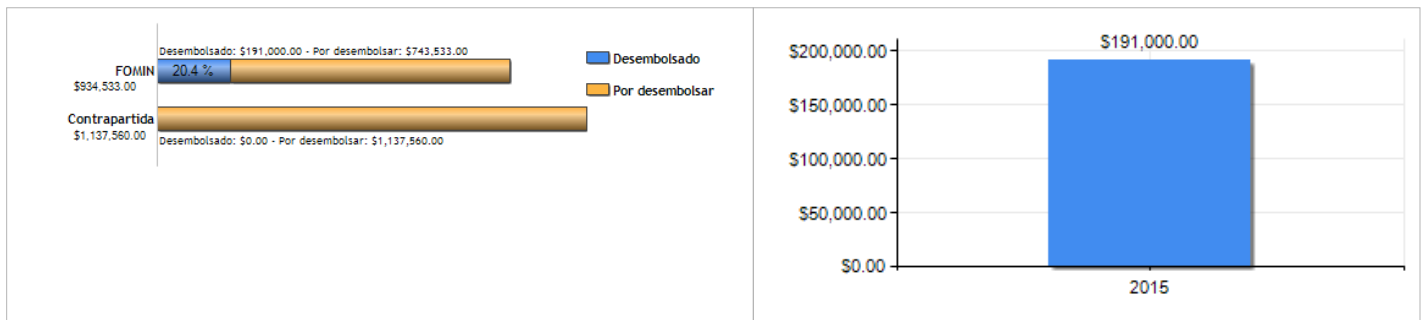

### PUNTAJE DE DESEMPEÑO

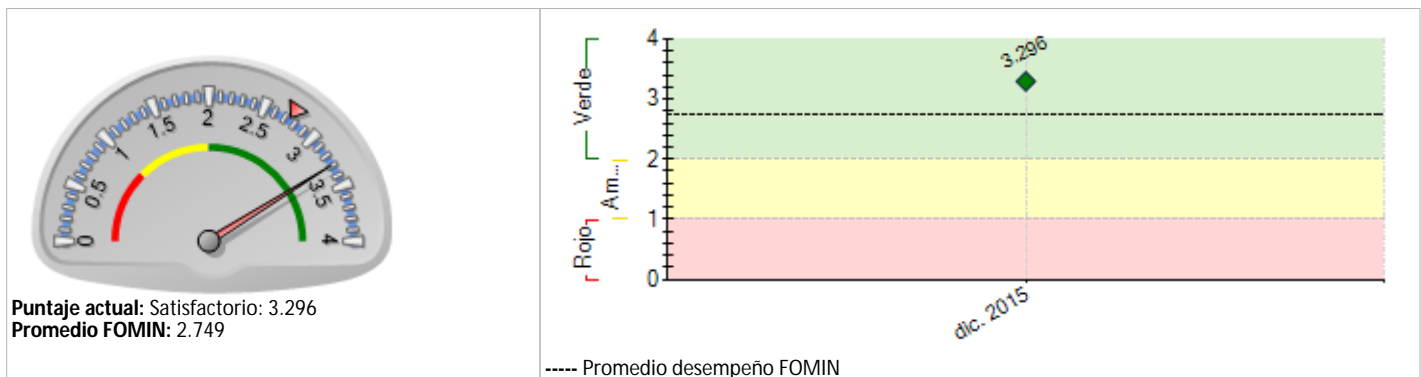

### RIESGOS EXTERNOS


#### CAPACIDAD INSTITUCIONAL

**Riesgo**

**Administración Financiera:** Baja

**Adquisiciones:** Baja

**Capacidad Técnica:** Media

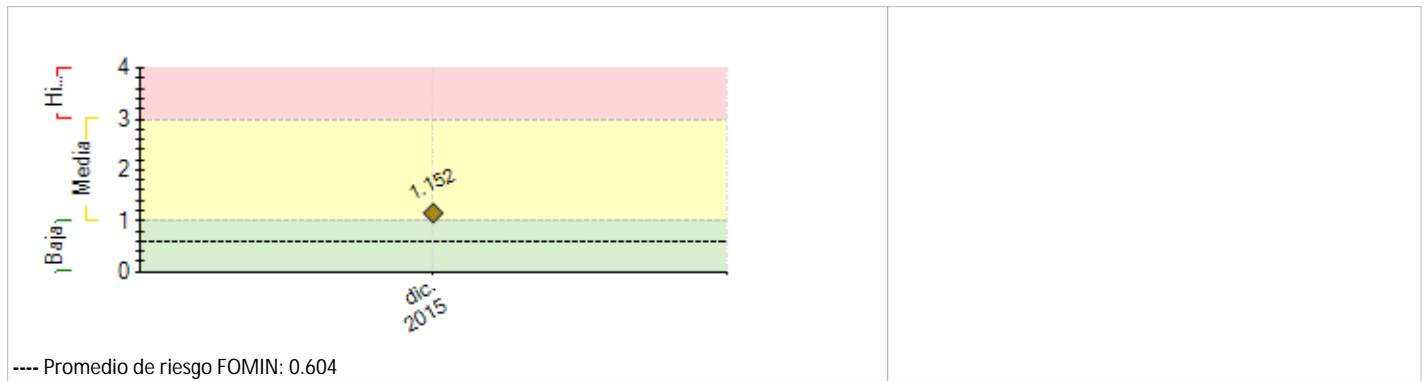

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Las actividades se han visto demoradas por la dificultad de la operación (regional) de efectivizar el Primer Desembolso. Así mismo, a partir de la Firma del Convenio se realizaron intensas actividades de planificación participativa con socios y aliados.

En el mes de Septiembre 2015 se realizó el Taller de Arranque con la presencia del FOMIN/BID y una diversidad de actores de gobiernos, instituciones y organizaciones como instancia de socialización del Proyecto, suma de Alianzas y planificación participativa.

En Argentina, ante el cambio de Gobierno y por lo tanto de casi la totalidad de las autoridades nacionales y muchas de las provinciales, se inició un proceso intenso de contacto con las nuevas gestiones para comunicar el Proyecto, con muy buena recepción y posibilidades de cooperación mutua.

En Paraguay se comenzó un trabajo con los aliados en la definición de los planes operativos de trabajo.

Bolivia aún sin actividades en espera de la autorización del Banco de cuando comenzar las operaciones en este País.

Se comenzó el proceso de selección y contratación de los Gerentes País y Consultorías Claves de Expertos, muchos de ellos ya presentados al Banco en espera de su no objeción.

El Proyecto está siendo muy bien recibido los actores territoriales tanto públicos como privados y se está ampliando rápidamente la red de aliados y colaboradores posicionando el proyecto como una iniciativa que lidera en la región la temática de adaptabilidad al cambio climático.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto está iniciándose satisfactoriamente, con las características y dificultades propias de la primer etapa del ciclo de ejecución. A ello se suma las tareas que se realizan para lograr la adhesión de Bolivia, que se espera se resuelvan para cuando el proyecto haya alcanzado el ritmo de ejecución esperado.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base					
	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>						
Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado	

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Cambios en la política nacional

## SECCIÓN 4: RIESGOS

**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	<b>Nivel</b>	<b>Acción de mitigación</b>	<b>Responsable</b>
1. Demanda – La incertidumbre para prever el momento y la magnitud precisos del cambio climático conllevan el riesgo de que algunas MIPYME se mantengan inactivas y prefieran el enfoque de “esperar y ver” ante el cambio climático.	Media	Se reforzarán los instrumentos de comunicación y sensibilización.	Project Coordinator
2. Percepciones de costos y beneficios – Entre algunas empresas existe la percepción de que reducir los riesgos del cambio climático supondrá altos costos iniciales y beneficios inciertos y a más largo plazo.	Media	Se amplificarán los efectos demostrativos de los Pilotos (Modelos de Negocio climáticamente inteligentes) que transmitirán opciones productivas y de negocio de tipo win-win (ganar-ganar).	Project Coordinator
3. Mala adaptación – Este tipo de riesgo se presenta cuando las acciones para fomentar la adaptación propician un aumento no deliberado de la vulnerabilidad al cambio climático a largo plazo.	Media	Se realizarán análisis de impacto ambiental y estudios de sensibilidad económica para reducir este riesgo en los diseños de Planes y Pilotos Demostrativos.	Project Coordinator
4. Institucional – las Plataformas Institucionales requerirán de la voluntad política de las autoridades competentes locales de participar de la Red. Acción de mitigación	Media	Se ampliarán las alianzas a nivel de las bases de MIPYME para incidir más fuertemente en las políticas y estrategias de las instituciones y gobiernos locales.	Project Coordinator
5. Sustentabilidad de la plataforma establecida en componente 1 – El primer componente generará una plataforma que permita centralizar y disponer de datos, sistematizar y difundir información, generar y distribuir conocimiento para el manejo inteligente del clima. Hay riesgos relacionados con la sustentabilidad de la plataforma.	Media	El proyecto va a ubicar la plataforma en una institución local con capacidad técnica y financiera para gestionarla y darle sostenibilidad. Además, durante la implementación, el proyecto intentará definir un modelo de negocio para la plataforma.	Project Coordinator

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

*[No se reportaron factores para este periodo]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

\* La sostenibilidad del presente proyecto es sobre todo e orden institucional. REDES Chaco a través del instrumento de “acuerdo de gobernanza” que diseñará, incluirán las responsabilidades de los miembros asegurando su participación en la RA3Ch. Por otro lado, la iniciativa contempla el fortalecimiento de la Plataforma Institucional a través de talleres especializados en el trabajo en alianzas, resolución de conflictos y estandarización de procesos que mitigen los riesgos de la desintegración. También el trabajo en el fortalecimiento de las redes a nivel de territorio (Red de Municipios, Red de Técnicos, Red de MIPYMES innovadoras) permitirá un sostenimiento de la Plataforma Institucional.

\* Las actividades de incidencia pública serán clave para generar una apropiación de los productos generados por el proyecto por parte de los gobiernos y para propiciar la movilización de recursos y la generación de legislaciones que permitan no sólo el sostenimiento de lo generado sino también el scaling up de la iniciativa.

\* Cuando menos cuatro (4) meses antes de concluir el periodo de ejecución, se organizará un Taller de Sostenibilidad.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

	<b>Relativo a</b>	<b>Autor</b>
1. En Proyecto Regionales el cumplimiento de las condicionalidades iniciales así como los ajustes administrativos y contables de la unidad ejecutora suelen ser muy importantes y requieren tiempo. Se sugiere comenzar el trabajo entre la Aprobación y la Firma del Convenio para contar con más tiempo y no demorar el primer desembolso.	Design	Moresco, Mauricio
