


Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	tiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
0	0	Plan de Ejecución del Programa CH-L1081	1112 días	lun 28/09/15	mar 31/12/19	USD 70.000.000,00	USD 50.000.000,00	USD 20.000.000,00										
1	0	Inicio	0 días	lun 28/09/15	lun 28/09/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
2	0	Actividades previas al Inicio de la Ejecución	145 días	lun 28/09/15	vie 15/04/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
3	0	Distribución del POD	0 días	lun 28/09/15	lun 28/09/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
4	0	Aprobación del Préstamo por el Directorio	50 días	lun 28/09/15	vie 04/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
5	0	Misión de Negociación	1 día	lun 07/12/15	lun 07/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
6	0	Contrato de Préstamo firmado	0 días	lun 07/12/15	lun 07/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
7	0	Ley de Préstamo aprobado	0 días	lun 07/12/15	lun 07/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
8	0	Presupuesto Año 1 aprobado	1 día	mar 08/12/15	mar 08/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
9	0	Cumplimiento de Condiciones de Elegibilidad y Primer Desembolso	93 días	mié 09/12/15	vie 15/04/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
10	0	Inicio de la Ejecución del Programa	0 días	vie 30/10/15	vie 30/10/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
11	1	Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 13.751.951,00	USD 6.043.165,00	USD 7.708.786,00										
12	1.1	Producto 1: Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP	264 días	mar 03/05/16	vie 05/05/17	USD 232.896,00	USD 232.896,00	USD 0,00										
13	1.1.1	LP_Diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP	264 días	mar 03/05/16	vie 05/05/17	USD 232.896,00	USD 232.896,00	USD 0,00	UINET									
14	1.1.1.1	Etapa previa	22 días	mar 03/05/16	mié 01/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
15	1.1.1.2	Proceso de Contratación	110 días	jue 02/06/16	mié 02/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
16	1.1.1.3	Ejecución de contrato	132 días	jue 03/11/16	vie 05/05/17	USD 232.896,00	USD 232.896,00	USD 0,00										
17	1.2	Producto 2: Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP	956 días	mar 03/05/16	mar 31/12/19	USD 292.000,00	USD 292.000,00	USD 0,00										
18	1.2.1	LP_Diseño el Plan de Formación, incluyendo diagnóstico de capacidades y estimación de brechas	264 días	mar 03/05/16	vie 05/05/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
19	1.2.1.1	Etapa previa	22 días	mar 03/05/16	mié 01/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
20	1.2.1.2	Proceso de contratación	110 días	jue 02/06/16	mié 02/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
21	1.2.1.3	Etapa de ejecución de contrato	132 días	jue 03/11/16	vie 05/05/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
22	1.2.2	LP_Servicios para la implementación del plan de formación - Año 2	392 días	jue 30/06/16	vie 29/12/17	USD 92.000,00	USD 92.000,00	USD 0,00	UINET									
23	1.2.2.1	Etapa previa	22 días	jue 30/06/16	vie 29/07/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
24	1.2.2.2	Proceso de contratación	110 días	lun 01/08/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
25	1.2.2.3	Etapa de ejecución de contrato	260 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	USD 92.000,00	USD 92.000,00	USD 0,00										
26	1.2.3	LP_Servicios para la implementación del plan de formación - Año 3	393 días	jue 29/06/17	lun 31/12/18	USD 100.000,00	USD 100.000,00	USD 0,00	UINET									
27	1.2.3.1	Etapa previa	22 días	jue 29/06/17	vie 28/07/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
28	1.2.3.2	Proceso de contratación	110 días	lun 31/07/17	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
29	1.2.3.3	Etapa de ejecución de contrato	261 días	lun 01/01/18	lun 31/12/18	USD 100.000,00	USD 100.000,00	USD 0,00										
30	1.2.4	LP_Servicios para la implementación del plan de formación - Año 4	393 días	vie 29/06/18	mar 31/12/19	USD 100.000,00	USD 100.000,00	USD 0,00	UINET									
31	1.2.4.1	Etapa previa	22 días	vie 29/06/18	lun 30/07/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
32	1.2.4.2	Proceso de contratación	110 días	mar 31/07/18	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
33	1.2.4.3	Etapa de ejecución de contrato	261 días	mar 01/01/19	mar 31/12/19	USD 100.000,00	USD 100.000,00	USD 0,00										
34	1.3	Producto 3: Plataformas de información y gestión	1046 días	mar 29/12/15	mar 31/12/19	USD 4.218.341,00	USD 4.218.341,00	USD 0,00										
35	1.3.1	LP_Diseño de la arquitectura de procesos. Incluye levantamiento de necesidades y procesos.	264 días	mar 29/12/15	vie 30/12/16	USD 436.681,00	USD 436.681,00	USD 0,00	UINET									
36	1.3.1.1	Etapa previa	22 días	mar 29/12/15	mié 27/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
37	1.3.1.2	Proceso de contratación	110 días	jue 28/01/16	mié 29/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
38	1.3.1.3	Ejecución del Contrato	132 días	jue 30/06/16	vie 30/12/16	USD 436.681,00	USD 436.681,00	USD 0,00										

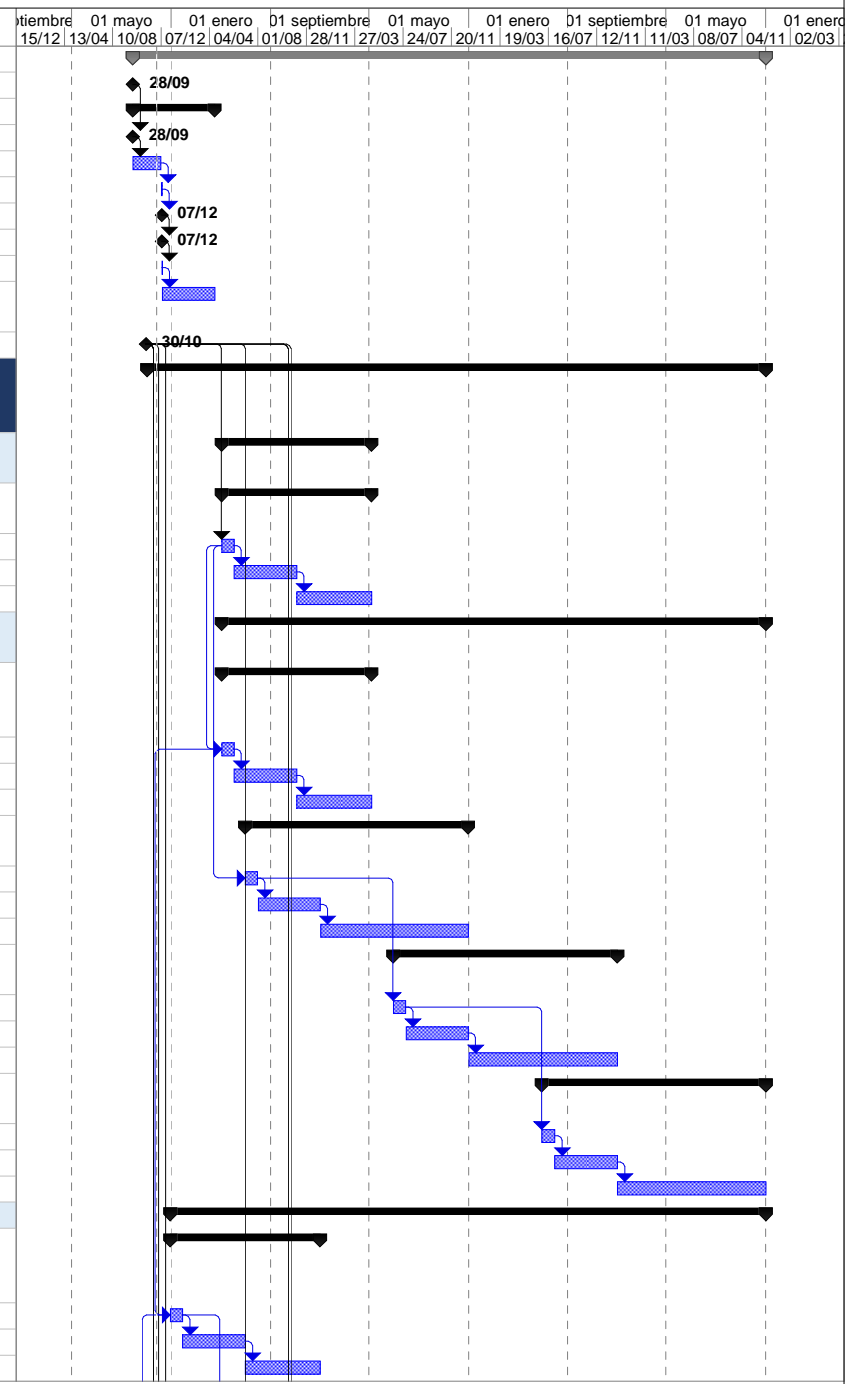

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	tiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
39	1.3.2	SBCC_Desarrollo e implementación de plataforma 1 de información y gestión	958 días	vie 29/04/16	mar 31/12/19	USD 1.890.830,00	USD 1.890.830,00	USD 0,00	UINET									
40	1.3.2.1	Etapa previa	22 días	vie 29/04/16	lun 30/05/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
41	1.3.2.2	Expresión de interés	22 días	mar 31/05/16	mié 29/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
42	1.3.2.3	Proceso de contratación	132 días	jue 30/06/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
43	1.3.2.4	Ejecución del Contrato	782 días	lun 02/01/17	mar 31/12/19	USD 1.890.830,00	USD 1.890.830,00	USD 0,00										
44	1.3.3	SBCC_Desarrollo e implementación de plataforma 2 de información y gestión	958 días	vie 29/04/16	mar 31/12/19	USD 1.890.830,00	USD 1.890.830,00	USD 0,00	UINET									
45	1.3.3.1	Etapa previa	22 días	vie 29/04/16	lun 30/05/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
46	1.3.3.2	Expresión de interés	22 días	mar 31/05/16	mié 29/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
47	1.3.3.3	Proceso de contratación	132 días	jue 30/06/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
48	1.3.3.4	Ejecución del Contrato	782 días	lun 02/01/17	mar 31/12/19	USD 1.890.830,00	USD 1.890.830,00	USD 0,00										
49	1.4	Producto 4: Campañas comunicacionales	546 días	vie 27/11/15	vie 29/12/17	USD 732.242,00	USD 732.242,00	USD 0,00										
50	1.4.1	CM_Diseño de campaña comunicacional para fortalecimiento de la educación pública, que incluye elaboración de contenido, diseño de material gráfico, identificación público y objetivo y logo de la NEP	189 días	vie 27/11/15	mié 17/08/16	USD 150.000,00	USD 150.000,00	USD 0,00	UINET									
51	1.4.1.1	Etapa previa	22 días	vie 27/11/15	lun 28/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
52	1.4.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 29/12/15	lun 15/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
53	1.4.1.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 16/02/16	mié 17/08/16	USD 150.000,00	USD 150.000,00	USD 0,00										
54	1.4.2	CM_Implementación de la campaña comunicacional	414 días	mar 31/05/16	vie 29/12/17	USD 582.242,00	USD 582.242,00	USD 0,00	UINET									
55	1.4.2.1	Etapa previa	22 días	mar 31/05/16	mié 29/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
56	1.4.2.2	Proceso de contratación	35 días	jue 30/06/16	mié 17/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
57	1.4.2.3	Ejecución del contrato	357 días	jue 18/08/16	vie 29/12/17	USD 582.242,00	USD 582.242,00	USD 0,00										
58	1.5	Producto 5: Estrategia de gestión del cambio	577 días	vie 14/10/16	lun 31/12/18	USD 567.686,00	USD 567.686,00	USD 0,00										
59	1.5.1	CM_Diseño e implementación de estrategia de gestión del cambio	577 días	vie 14/10/16	lun 31/12/18	USD 567.686,00	USD 567.686,00	USD 0,00	UINET									
60	1.5.1.1	Etapa previa	22 días	vie 14/10/16	lun 14/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
61	1.5.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 15/11/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
62	1.5.1.3	Ejecución del contrato	520 días	mar 03/01/17	lun 31/12/18	USD 567.686,00	USD 567.686,00	USD 0,00										
63	1.6	Producto 6: Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP	696 días	mar 01/12/15	mar 31/07/18	USD 341.005,00	USD 0,00	USD 341.005,00										
64	1.6.1	Primera etapa (creación de la UINEP, equipamiento durante año 1)	115 días	mar 01/12/15	lun 09/05/16	USD 87.874,00	USD 0,00	USD 87.874,00	UINET									
65	1.6.1.1	CM_Provisión de mobiliario	49 días	mar 01/12/15	vie 05/02/16	USD 28.558,00	USD 0,00	USD 28.558,00										
66	1.6.1.1.1	Etapa previa	22 días	mar 01/12/15	mié 30/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
67	1.6.1.1.2	Proceso de contratación	5 días	jue 31/12/15	mié 06/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
68	1.6.1.1.3	Ejecución del contrato	22 días	jue 07/01/16	vie 05/02/16	USD 28.558,00	USD 0,00	USD 28.558,00										
69	1.6.1.2	CM_Instalación de redes	93 días	jue 31/12/15	lun 09/05/16	USD 23.290,00	USD 0,00	USD 23.290,00	UINET									
70	1.6.1.2.1	Etapa previa	22 días	jue 31/12/15	vie 29/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
71	1.6.1.2.2	Proceso de contratación	5 días	lun 01/02/16	vie 05/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
72	1.6.1.2.3	Ejecución del contrato	66 días	lun 08/02/16	lun 09/05/16	USD 23.290,00	USD 0,00	USD 23.290,00										
73	1.6.1.3	CM_Provisión de hardware	49 días	mar 01/12/15	vie 05/02/16	USD 33.479,00	USD 0,00	USD 33.479,00	UINET									
74	1.6.1.3.1	Etapa previa	22 días	mar 01/12/15	mié 30/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
75	1.6.1.3.2	Proceso de contratación	5 días	jue 31/12/15	mié 06/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
76	1.6.1.3.3	Ejecución del contrato	22 días	jue 07/01/16	vie 05/02/16	USD 33.479,00	USD 0,00	USD 33.479,00										
77	1.6.1.4	CM_Provisión de licencias de software	49 días	mar 01/12/15	vie 05/02/16	USD 2.547,00	USD 0,00	USD 2.547,00	UINET									
78	1.6.1.4.1	Etapa previa	22 días	mar 01/12/15	mié 30/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
79	1.6.1.4.2	Proceso de contratación	5 días	jue 31/12/15	mié 06/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	01 noviembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
80	1.6.1.4.3	Ejecución del contrato	22 días	jue 07/01/16	vie 05/02/16	USD 2.547,00	USD 0,00	USD 2.547,00										
81	1.6.2	Segunda etapa (creación de la DEP)	436 días	mar 29/11/16	mar 31/07/18	USD 253.131,00	USD 0,00	USD 253.131,00										
82	1.6.2.1	CM_Provisión de mobiliario	414 días	mar 29/11/16	vie 29/06/18	USD 62.083,00	USD 0,00	USD 62.083,00	UINET									
83	1.6.2.1.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
84	1.6.2.1.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
85	1.6.2.1.3	Ejecución del contrato	387 días	jue 05/01/17	vie 29/06/18	USD 62.083,00	USD 0,00	USD 62.083,00										
86	1.6.2.2	CM_Instalación de redes	414 días	jue 29/12/16	mar 31/07/18	USD 23.290,00	USD 0,00	USD 23.290,00	UINET									
87	1.6.2.2.1	Etapa previa	22 días	jue 29/12/16	vie 27/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
88	1.6.2.2.2	Proceso de contratación	5 días	lun 30/01/17	vie 03/02/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
89	1.6.2.2.3	Ejecución del contrato	387 días	lun 06/02/17	mar 31/07/18	USD 23.290,00	USD 0,00	USD 23.290,00										
90	1.6.2.3	CM_Provisión de hardware	414 días	mar 29/11/16	vie 29/06/18	USD 72.780,00	USD 0,00	USD 72.780,00	UINET									
91	1.6.2.3.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
92	1.6.2.3.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
93	1.6.2.3.3	Ejecución del contrato	387 días	jue 05/01/17	vie 29/06/18	USD 72.780,00	USD 0,00	USD 72.780,00										
94	1.6.2.4	CM_Provisión de licencias de software	414 días	mar 29/11/16	vie 29/06/18	USD 7.642,00	USD 0,00	USD 7.642,00	UINET									
95	1.6.2.4.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
96	1.6.2.4.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
97	1.6.2.4.3	Ejecución del contrato	387 días	jue 05/01/17	vie 29/06/18	USD 7.642,00	USD 0,00	USD 7.642,00										
98	1.6.2.5	CM_Provisión de vehículos	414 días	mar 29/11/16	vie 29/06/18	USD 87.336,00	USD 0,00	USD 87.336,00	UINET									
99	1.6.2.5.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
100	1.6.2.5.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
101	1.6.2.5.3	Ejecución del contrato	387 días	jue 05/01/17	vie 29/06/18	USD 87.336,00	USD 0,00	USD 87.336,00										
102	1.7	Producto 7: Contratación de personal en la UINEP/DEP	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 7.367.781,00	USD 0,00	USD 7.367.781,00										
103	1.7.1	Integración de UINEP - Recursos Humanos Nuevos	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 4.200.980,00	USD 0,00	USD 4.200.980,00										
104	1.7.1.1	HN_Contratación de personal	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 4.200.980,00	USD 0,00	USD 4.200.980,00	UINET									
105	1.7.1.1.1	Etapa previa	22 días	lun 02/11/15	mar 01/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
106	1.7.1.1.2	Proceso de contratación	22 días	mié 02/12/15	jue 31/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
107	1.7.1.1.3	Ejecución del contrato	1043 días	vie 01/01/16	mar 31/12/19	USD 4.200.980,00	USD 0,00	USD 4.200.980,00										
108	1.7.2	Integración de UINEP - Recursos Humanos Traspaso interno	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 3.166.801,00	USD 0,00	USD 3.166.801,00										
109	1.7.2.1	HN_Contratación de personal	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 3.166.801,00	USD 0,00	USD 3.166.801,00	UINET									
110	1.7.2.1	Etapa previa	22 días	lun 02/11/15	mar 01/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
111	1.7.2.2	Proceso de contratación	22 días	mié 02/12/15	jue 31/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
112	1.7.2.3	Ejecución del contrato	1043 días	vie 01/01/16	mar 31/12/19	USD 3.166.801,00	USD 0,00	USD 3.166.801,00										
113	2	Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local	1088 días	vie 30/10/15	mar 31/12/19	USD 44.763.646,00	USD 36.712.843,00	USD 8.050.803,00										
114	2.1	Producto 8: Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública	792 días	vie 18/12/15	lun 31/12/18	USD 845.357,00	USD 704.464,00	USD 140.893,00										
115	2.1.1	LP_Análisis comparado de modelos de gestión de nivel intermedio a nivel internacional	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 24.000,00	USD 24.000,00	USD 0,00	UINET									
116	2.1.1.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
117	2.1.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
118	2.1.1.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 24.000,00	USD 24.000,00	USD 0,00										
119	2.1.2	LP_Sistematización de buenas prácticas de gestión en municipios	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 40.000,00	USD 40.000,00	USD 0,00	UINET									
120	2.1.2.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
121	2.1.2.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
122	2.1.2.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 40.000,00	USD 40.000,00	USD 0,00										

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	01 noviembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07	20/11
123	2.1.3	LP_Diseño de arquitectura de procesos de los SLEs	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 145.560,00	USD 145.560,00	USD 0,00	UINET										
124	2.1.3.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
125	2.1.3.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
126	2.1.3.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 145.560,00	USD 145.560,00	USD 0,00											
127	2.1.4	LP_Diseño de módulo de gestión estratégica y liderazgo	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00	UINET										
128	2.1.4.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
129	2.1.4.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
130	2.1.4.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00											
131	2.1.5	LP_Diseño de módulo de acompañamiento pedagógico a escuelas	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00	UINET										
132	2.1.5.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
133	2.1.5.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
134	2.1.5.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00											
135	2.1.6	LP_Diseño de módulo de participación comunitaria	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00	UINET										
136	2.1.6.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
137	2.1.6.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
138	2.1.6.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00											
139	2.1.7	LP_Sistematización de lecciones aprendidas a partir de implementación de módulos y desarrollo de plan de formación de RRHH	389 días	vie 01/07/16	mié 27/12/17	USD 116.448,00	USD 116.448,00	USD 0,00	UINET										
140	2.1.7.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
141	2.1.7.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
142	2.1.7.3	Ejecución del contrato	257 días	mar 03/01/17	mié 27/12/17	USD 116.448,00	USD 116.448,00	USD 0,00											
143	2.1.8	LP_Desarrollo de protocolo de implementación operativa de SLEs	389 días	vie 01/07/16	mié 27/12/17	USD 116.448,00	USD 116.448,00	USD 0,00	UINET										
144	2.1.8.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
145	2.1.8.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
146	2.1.8.3	Ejecución del contrato	257 días	mar 03/01/17	mié 27/12/17	USD 116.448,00	USD 116.448,00	USD 0,00											
147	2.1.9	Actividad sin programar para contingencia	260 días	mar 02/01/18	lun 31/12/18	USD 140.893,00	USD 0,00	USD 140.893,00											
148	2.2	Producto 9: Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio	1088 días	vie 30/10/15	mar 31/12/19	USD 18.038.654,00	USD 18.038.654,00	USD 0,00											
149	2.2.1	CM_Anticipación del traspaso. Año 1. Levantamiento de contratos	189 días	vie 30/10/15	mié 20/07/16	USD 698.690,00	USD 698.690,00	USD 0,00	UINET										
150	2.2.1.1	Etapa previa	22 días	vie 30/10/15	lun 30/11/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
151	2.2.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 01/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
152	2.2.1.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 19/01/16	mié 20/07/16	USD 698.690,00	USD 698.690,00	USD 0,00											
153	2.2.2	CM_Implementación de los 3 módulos - Año 1	306 días	vie 30/10/15	vie 30/12/16	USD 1.746.725,00	USD 1.746.725,00	USD 0,00	UINET										
154	2.2.2.1	Etapa previa	22 días	vie 30/10/15	lun 30/11/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
155	2.2.2.2	Proceso de contratación	35 días	mar 01/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
156	2.2.2.3	Ejecución del contrato	249 días	mar 19/01/16	vie 30/12/16	USD 1.746.725,00	USD 1.746.725,00	USD 0,00											
157	2.2.3	LP_Anticipación del traspaso. Año 2 Levantamiento de contratos	264 días	jue 30/06/16	mar 04/07/17	USD 1.048.035,00	USD 1.048.035,00	USD 0,00	UINET										
158	2.2.3.1	Etapa previa	22 días	jue 30/06/16	vie 29/07/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
159	2.2.3.2	Proceso de contratación	110 días	lun 01/08/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
160	2.2.3.3	Ejecución del contrato	132 días	lun 02/01/17	mar 04/07/17	USD 1.048.035,00	USD 1.048.035,00	USD 0,00											
161	2.2.4	LP_Implementación de los 3 módulos - Año 2	392 días	jue 30/06/16	vie 29/12/17	USD 1.746.725,00	USD 1.746.725,00	USD 0,00	UINET										
162	2.2.4.1	Etapa previa	22 días	jue 30/06/16	vie 29/07/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
163	2.2.4.2	Proceso de contratación	110 días	lun 01/08/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	tiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
164	2.2.4.3	Ejecución del contrato	260 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	USD 1.746.725,00	USD 1.746.725,00	USD 0,00										
165	2.2.5	LP_Anticipación del traspaso. Año 3 Levantamiento de contratos vigentes, adquisiciones, etc para traspasar a las funciones que adopta el SLE.	264 días	jue 29/06/17	mar 03/07/18	USD 1.863.173,00	USD 1.863.173,00	USD 0,00	UINET/ Municipio									
166	2.2.5.1	Etapa previa	22 días	jue 29/06/17	vie 28/07/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
167	2.2.5.2	Proceso de contratación	110 días	lun 31/07/17	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
168	2.2.5.3	Ejecución del contrato	132 días	lun 01/01/18	mar 03/07/18	USD 1.863.173,00	USD 1.863.173,00	USD 0,00										
169	2.2.6	LP_Implementación de los 3 modulos - Año 3	381 días	jue 29/06/17	jue 13/12/18	USD 2.620.087,00	USD 2.620.087,00	USD 0,00	UINET									
170	2.2.6.1	Etapa previa	22 días	jue 29/06/17	vie 28/07/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
171	2.2.6.2	Proceso de contratación	110 días	lun 31/07/17	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
172	2.2.6.3	Ejecución del contrato	249 días	lun 01/01/18	jue 13/12/18	USD 2.620.087,00	USD 2.620.087,00	USD 0,00										
173	2.2.7	LP_Anticipación del traspaso. Año 4. Levantamiento de contratos	264 días	vie 29/06/18	mié 03/07/19	USD 1.630.277,00	USD 1.630.277,00	USD 0,00	UINET/ Municipio									
174	2.2.7.1	Etapa previa	22 días	vie 29/06/18	lun 30/07/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
175	2.2.7.2	Proceso de contratación	110 días	mar 31/07/18	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
176	2.2.7.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 01/01/19	mié 03/07/19	USD 1.630.277,00	USD 1.630.277,00	USD 0,00										
177	2.2.8	LP_Implementación de los 3 modulos - Año 4	381 días	vie 29/06/18	vie 13/12/19	USD 4.657.933,00	USD 4.657.933,00	USD 0,00	UINET									
178	2.2.8.1	Etapa previa	22 días	vie 29/06/18	lun 30/07/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
179	2.2.8.2	Proceso de contratación	110 días	mar 31/07/18	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
180	2.2.8.3	Ejecución del contrato	249 días	mar 01/01/19	vie 13/12/19	USD 4.657.933,00	USD 4.657.933,00	USD 0,00										
181	2.2.9	Actividad sin programar para contingencia	522 días	lun 01/01/18	mar 31/12/19	USD 2.027.009,00	USD 2.027.009,00	USD 0,00										
182	2.3	Producto 10: Cupos individuales de capacitación para personal local	833 días	vie 21/10/16	mar 31/12/19	USD 10.139.301,00	USD 10.139.301,00	USD 0,00										
183	2.3.1	CM_Personal capacitado - Año 2	311 días	vie 21/10/16	vie 29/12/17	USD 1.868.996,00	USD 1.868.996,00	USD 0,00	UINET									
184	2.3.1.1	Etapa previa	22 días	vie 21/10/16	lun 21/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
185	2.3.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 22/11/16	lun 09/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
186	2.3.1.3	Ejecución del contrato	254 días	mar 10/01/17	vie 29/12/17	USD 1.868.996,00	USD 1.868.996,00	USD 0,00										
187	2.3.2	CM_Personal capacitado - Año 3.	315 días	mar 17/10/17	lun 31/12/18	USD 2.803.493,00	USD 2.803.493,00	USD 0,00	UINET									
188	2.3.2.1	Etapa previa	22 días	mar 17/10/17	mié 15/11/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
189	2.3.2.2	Proceso de contratación	35 días	jue 16/11/17	mié 03/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
190	2.3.2.3	Ejecución del contrato	258 días	jue 04/01/18	lun 31/12/18	USD 2.803.493,00	USD 2.803.493,00	USD 0,00										
191	2.3.3	CM_Personal capacitado - Año 4	318 días	vie 12/10/18	mar 31/12/19	USD 4.983.988,00	USD 4.983.988,00	USD 0,00	UINET									
192	2.3.3.1	Etapa previa	22 días	vie 12/10/18	lun 12/11/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
193	2.3.3.2	Proceso de contratación	35 días	mar 13/11/18	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
194	2.3.3.3	Ejecución del contrato	261 días	mar 01/01/19	mar 31/12/19	USD 4.983.988,00	USD 4.983.988,00	USD 0,00										
195	2.3.4	Actividad sin programar para contingencia	519 días	jue 04/01/18	mar 31/12/19	USD 482.824,00	USD 482.824,00	USD 0,00										
196	2.4	Producto 11: Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales	617 días	mar 29/11/16	mié 10/04/19	USD 7.909.910,00	USD 0,00	USD 7.909.910,00										
197	2.4.1	CM_Año 2: Provisión de computadores	49 días	mar 29/11/16	vie 03/02/17	USD 467.249,00	USD 0,00	USD 467.249,00	UINET									
198	2.4.1.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
199	2.4.1.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
200	2.4.1.3	Ejecución del contrato	22 días	jue 05/01/17	vie 03/02/17	USD 467.249,00	USD 0,00	USD 467.249,00										
201	2.4.2	CM_Año 2: Provisión de automóviles	71 días	jue 29/12/16	jue 06/04/17	USD 393.013,00	USD 0,00	USD 393.013,00	UINET									
202	2.4.2.1	Etapa previa	22 días	jue 29/12/16	vie 27/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
203	2.4.2.2	Proceso de contratación	5 días	lun 30/01/17	vie 03/02/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
204	2.4.2.3	Ejecución del contrato	44 días	lun 06/02/17	jue 06/04/17	USD 393.013,00	USD 0,00	USD 393.013,00										
205	2.4.3	CM_Año 2: Provisión de puesto de trabajo	49 días	mar 29/11/16	vie 03/02/17	USD 438.430,00	USD 0,00	USD 438.430,00	UINET									
206	2.4.3.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
207	2.4.3.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
208	2.4.3.3	Ejecución del contrato	22 días	jue 05/01/17	vie 03/02/17	USD 438.430,00	USD 0,00	USD 438.430,00										

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	tiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
209	2.4.4	CM_Año 2: Refacciones o rehabilitaciones	49 días	mar 29/11/16	vie 03/02/17	USD 400.000,00	USD 0,00	USD 400.000,00	UINET									
210	2.4.4.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
211	2.4.4.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
212	2.4.4.3	Ejecución del contrato	22 días	jue 05/01/17	vie 03/02/17	USD 400.000,00	USD 0,00	USD 400.000,00										
213	2.4.5	CM_Año 3 Provisión de computadores	49 días	jue 30/11/17	mar 06/02/18	USD 700.873,00	USD 0,00	USD 700.873,00	UINET									
214	2.4.5.1	Etapa previa	22 días	jue 30/11/17	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
215	2.4.5.2	Proceso de contratación	5 días	lun 01/01/18	vie 05/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
216	2.4.5.3	Ejecución del contrato	22 días	lun 08/01/18	mar 06/02/18	USD 700.873,00	USD 0,00	USD 700.873,00										
217	2.4.6	CM_Año 3 Provisión de automóviles	71 días	lun 01/01/18	lun 09/04/18	USD 589.520,00	USD 0,00	USD 589.520,00	UINET									
218	2.4.6.1	Etapa previa	22 días	lun 01/01/18	mar 30/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
219	2.4.6.2	Proceso de contratación	5 días	mié 31/01/18	mar 06/02/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
220	2.4.6.3	Ejecución del contrato	44 días	mié 07/02/18	lun 09/04/18	USD 589.520,00	USD 0,00	USD 589.520,00										
221	2.4.7	CM_Año 3 Provisión de puesto de trabajo	49 días	jue 30/11/17	mar 06/02/18	USD 657.645,00	USD 0,00	USD 657.645,00	UINET									
222	2.4.7.1	Etapa previa	22 días	jue 30/11/17	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
223	2.4.7.2	Proceso de contratación	5 días	lun 01/01/18	vie 05/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
224	2.4.7.3	Ejecución del contrato	22 días	lun 08/01/18	mar 06/02/18	USD 657.645,00	USD 0,00	USD 657.645,00										
225	2.4.8	CM_Año 3 Refacciones o rehabilitaciones	49 días	jue 30/11/17	mar 06/02/18	USD 400.000,00	USD 0,00	USD 400.000,00	UINET									
226	2.4.8.1	Etapa previa	22 días	jue 30/11/17	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
227	2.4.8.2	Proceso de contratación	5 días	lun 01/01/18	vie 05/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
228	2.4.8.3	Ejecución del contrato	22 días	lun 08/01/18	mar 06/02/18	USD 400.000,00	USD 0,00	USD 400.000,00										
229	2.4.9	CM_Año 4 Provisión de computadores	49 días	lun 03/12/18	jue 07/02/19	USD 1.245.997,00	USD 0,00	USD 1.245.997,00	UINET									
230	2.4.9.1	Etapa previa	22 días	lun 03/12/18	mar 01/01/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
231	2.4.9.2	Proceso de contratación	5 días	mié 02/01/19	mar 08/01/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
232	2.4.9.3	Ejecución del contrato	22 días	mié 09/01/19	jue 07/02/19	USD 1.245.997,00	USD 0,00	USD 1.245.997,00										
233	2.4.10	CM_Año 4 Provisión de automóviles	71 días	mié 02/01/19	mié 10/04/19	USD 1.048.035,00	USD 0,00	USD 1.048.035,00	UINET									
234	2.4.10.1	Etapa previa	22 días	mié 02/01/19	jue 31/01/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
235	2.4.10.2	Proceso de contratación	5 días	vie 01/02/19	jue 07/02/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
236	2.4.10.3	Ejecución del contrato	44 días	vie 08/02/19	mié 10/04/19	USD 1.048.035,00	USD 0,00	USD 1.048.035,00										
237	2.4.11	CM_Año 4 Provisión de puesto de trabajo	49 días	lun 03/12/18	jue 07/02/19	USD 1.169.148,00	USD 0,00	USD 1.169.148,00	UINET									
238	2.4.11.1	Etapa previa	22 días	lun 03/12/18	mar 01/01/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
239	2.4.11.2	Proceso de contratación	5 días	mié 02/01/19	mar 08/01/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
240	2.4.11.3	Ejecución del contrato	22 días	mié 09/01/19	jue 07/02/19	USD 1.169.148,00	USD 0,00	USD 1.169.148,00										
241	2.4.12	CM_Año 4 Refacciones o rehabilitaciones	49 días	lun 03/12/18	jue 07/02/19	USD 400.000,00	USD 0,00	USD 400.000,00	UINET									
242	2.4.12.1	Etapa previa	22 días	lun 03/12/18	mar 01/01/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
243	2.4.12.2	Proceso de contratación	5 días	mié 02/01/19	mar 08/01/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
244	2.4.12.3	Ejecución del contrato	22 días	mié 09/01/19	jue 07/02/19	USD 400.000,00	USD 0,00	USD 400.000,00										
245	2.5	Producto 12: Campañas comunicacionales a nivel territorio	838 días	vie 14/10/16	mar 31/12/19	USD 3.958.517,00	USD 3.958.517,00	USD 0,00										
246	2.5.1	CM_Año 2: Implementación local de la campaña comunicacional. Incluye diseño	316 días	vie 14/10/16	vie 29/12/17	USD 807.860,00	USD 807.860,00	USD 0,00	UINET									
247	2.5.1.1	Etapa previa	22 días	vie 14/10/16	lun 14/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
248	2.5.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 15/11/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
249	2.5.1.2	Ejecución del contrato	259 días	mar 03/01/17	vie 29/12/17	USD 807.860,00	USD 807.860,00	USD 0,00										
250	5.5.2	CM_Año 3: Implementación local de la campaña comunicacional. Incluye diseño	315 días	mar 17/10/17	lun 31/12/18	USD 1.346.434,00	USD 1.346.434,00	USD 0,00	UINET									
251	5.5.2.1	Etapa previa	22 días	mar 17/10/17	mié 15/11/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
252	5.5.2.2	Proceso de contratación	35 días	jue 16/11/17	mié 03/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
253	5.5.2.3	Ejecución del contrato	258 días	jue 04/01/18	lun 31/12/18	USD 1.346.434,00	USD 1.346.434,00	USD 0,00										
254	5.5.3	CM_Año 4: Implementación local de la campaña comunicacional. Incluye diseño	317 días	vie 12/10/18	lun 30/12/19	USD 1.615.721,00	USD 1.615.721,00	USD 0,00	UINET									
255	5.5.3.1	Etapa previa	22 días	vie 12/10/18	lun 12/11/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081


Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	01 noviembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
256	5.5.3.2	Proceso de contratación	35 días	mar 13/11/18	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
257	5.5.3.3	Ejecución del contrato	260 días	mar 01/01/19	lun 30/12/19	USD 1.615.721,00	USD 1.615.721,00	USD 0,00										
258	5.5.4	Actividad sin programar para contingencia	519 días	jue 04/01/18	mar 31/12/19	USD 188.502,00	USD 188.502,00	USD 0,00										
259	2.6	Producto 13: Estrategia de gestión del cambio a nivel territorial	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 3.871.907,00	USD 3.871.907,00	USD 0,00										
260	2.6.1	CM_Implementación de la gestión del cambio a nivel local. Año 1	296 días	vie 13/11/15	vie 30/12/16	USD 305.677,00	USD 305.677,00	USD 0,00	UINET									
261	2.6.1.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
262	2.6.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 15/12/15	lun 01/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
263	2.6.1.3	Ejecución del contrato	239 días	mar 02/02/16	vie 30/12/16	USD 305.677,00	USD 305.677,00	USD 0,00										
264	2.6.2	CM_Implementación de la gestión del cambio a nivel local. Año 2	317 días	jue 13/10/16	vie 29/12/17	USD 764.192,00	USD 764.192,00	USD 0,00	UINET									
265	2.6.2.1	Etapa previa	22 días	jue 13/10/16	vie 11/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
266	2.6.2.2	Proceso de contratación	35 días	lun 14/11/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
267	2.6.2.3	Ejecución del contrato	260 días	lun 02/01/17	vie 29/12/17	USD 764.192,00	USD 764.192,00	USD 0,00										
268	2.6.3	CM_Implementación de la gestión del cambio a nivel local. Año 3	318 días	jue 12/10/17	lun 31/12/18	USD 1.273.654,00	USD 1.273.654,00	USD 0,00	UINET									
269	2.6.3.1	Etapa previa	22 días	jue 12/10/17	vie 10/11/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
270	2.6.3.2	Proceso de contratación	35 días	lun 13/11/17	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
271	2.6.3.3	Ejecución del contrato	261 días	lun 01/01/18	lun 31/12/18	USD 1.273.654,00	USD 1.273.654,00	USD 0,00										
272	2.6.4	CM_Implementación de la gestión del cambio a nivel local. Año 4	317 días	lun 15/10/18	mar 31/12/19	USD 1.528.384,00	USD 1.528.384,00	USD 0,00	UINET									
273	2.6.4.1	Etapa previa	22 días	lun 15/10/18	mar 13/11/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
274	2.6.4.2	Proceso de contratación	35 días	mié 14/11/18	mar 01/01/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
275	2.6.4.3	Ejecución del contrato	260 días	mié 02/01/19	mar 31/12/19	USD 1.528.384,00	USD 1.528.384,00	USD 0,00										
276	3	Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de una nueva institucionalidad	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 5.825.341,00	USD 5.825.341,00	USD 0,00										
277	3.1	Producto 14: Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 694.322,00	USD 694.322,00	USD 0,00										
278	3.1.1	LP_Definición de estándares indicativos de desempeño de sostenedores públicos	652 días	vie 01/07/16	lun 31/12/18	USD 120.087,00	USD 120.087,00	USD 0,00	UINET									
279	3.1.1.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
280	3.1.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
281	3.1.1.3	Ejecución del contrato	520 días	mar 03/01/17	lun 31/12/18	USD 120.087,00	USD 120.087,00	USD 0,00										
282	3.1.2	LP_Diseño de instrumentos de evaluación del desempeño de sostenedores públicos	652 días	vie 01/07/16	lun 31/12/18	USD 120.087,00	USD 120.087,00	USD 0,00	UINET									
283	3.1.2.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
284	3.1.2.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
285	3.1.2.3	Ejecución del contrato	520 días	mar 03/01/17	lun 31/12/18	USD 120.087,00	USD 120.087,00	USD 0,00										
286	3.1.3	LP_Diseño de marco de fiscalización con foco en sostenedores públicos	652 días	vie 01/07/16	lun 31/12/18	USD 120.087,00	USD 120.087,00	USD 0,00	UINET									
287	3.1.3.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
288	3.1.3.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
289	3.1.3.3	Ejecución del contrato	520 días	mar 03/01/17	lun 31/12/18	USD 120.087,00	USD 120.087,00	USD 0,00										
290	3.1.4	LP_Validación y difusión nacional y local del marco evaluativo	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 218.341,00	USD 218.341,00	USD 0,00	UINET									
291	3.1.4.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
292	3.1.4.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
293	3.1.4.3	Ejecución del contrato	781 días	mar 03/01/17	mar 31/12/19	USD 218.341,00	USD 218.341,00	USD 0,00										
294	3.1.5	Actividad sin programar para contingencia	521 días	mar 02/01/18	mar 31/12/19	USD 115.720,00	USD 115.720,00	USD 0,00	UINET									

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	01 noviembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
295	3.2	Producto 15: Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública	817 días	vie 13/11/15	lun 31/12/18	USD 200.875,00	USD 200.875,00	USD 0,00										
296	3.2.1	LP_Diseño del modelo de coordinación y articulación institucional de las instituciones del SAC. Incluye modelo de mejora continua de la educación pública y diseño de acciones coordinadas de la DEP, la Agencia de la Calidad, la Superintendencia y los SLEs	556 días	vie 13/11/15	vie 29/12/17	USD 174.672,00	USD 174.672,00	USD 0,00	UINET									
297	3.2.1.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
298	3.2.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 15/12/15	lun 16/05/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
299	3.2.1.3	Ejecución del contrato	424 días	mar 17/05/16	vie 29/12/17	USD 174.672,00	USD 174.672,00	USD 0,00										
300	3.2.2	Actividad sin programar para contingencia	521 días	lun 02/01/17	lun 31/12/18	USD 26.203,00	USD 26.203,00	USD 0,00										
301	3.3	Producto 16: Plataforma integrada de gestión e información	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 1.500.000,00	USD 1.500.000,00	USD 0,00										
302	3.3.1	SBCC_Diseño e implementación de arquitectura de sistemas para la articulación de plataformas de información y gestión.	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 1.500.000,00	USD 1.500.000,00	USD 0,00	UINET									
303	3.3.1.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
304	3.3.1.2	Expresión de interés	22 días	mar 02/08/16	mié 31/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
305	3.3.1.2	Proceso de contratación	132 días	jue 01/09/16	vie 03/03/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
306	3.3.1.3	Ejecución del contrato	737 días	lun 06/03/17	mar 31/12/19	USD 1.500.000,00	USD 1.500.000,00	USD 0,00										
307	3.4	Producto 17: Instrumentos de planificación y gestión del SAC a nivel de territorio	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 2.728.000,00	USD 2.728.000,00	USD 0,00										
308	3.4.1	LP_Diseño e implementación de un plan articulado para cada SLE, incluyendo la implementación de mesas de coordinación y la coordinación operativa entre instituciones del SAC a nivel local. Año 2.	391 días	vie 01/07/16	vie 29/12/17	USD 480.000,00	USD 480.000,00	USD 0,00	UINET									
309	3.4.1.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
310	3.4.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
311	3.4.1.3	Ejecución del contrato	259 días	mar 03/01/17	vie 29/12/17	USD 480.000,00	USD 480.000,00	USD 0,00										
312	3.4.2	LP_Diseño e implementación de un plan articulado para cada SLE, incluyendo la implementación de mesas de coordinación y la coordinación operativa entre instituciones del SAC a nivel local. Año 3.	390 días	mar 04/07/17	lun 31/12/18	USD 720.000,00	USD 720.000,00	USD 0,00	UINET									
313	3.4.2.1	Etapa previa	22 días	mar 04/07/17	mié 02/08/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
314	3.4.2.2	Proceso de contratación	110 días	jue 03/08/17	mié 03/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
315	3.4.2.3	Ejecución del contrato	258 días	jue 04/01/18	lun 31/12/18	USD 720.000,00	USD 720.000,00	USD 0,00										
316	3.4.3	LP_Diseño e implementación de un plan articulado para cada SLE, incluyendo la implementación de mesas de coordinación y la coordinación operativa entre instituciones del SAC a nivel local. Año 4.	393 días	vie 29/06/18	mar 31/12/19	USD 1.280.000,00	USD 1.280.000,00	USD 0,00	UINET									
317	3.4.3.1	Etapa previa	22 días	vie 29/06/18	lun 30/07/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
318	3.4.3.2	Proceso de contratación	110 días	mar 31/07/18	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
319	3.4.3.3	Ejecución del contrato	261 días	mar 01/01/19	mar 31/12/19	USD 1.280.000,00	USD 1.280.000,00	USD 0,00										
320	3.4.4	Actividad sin programar para contingencia	519 días	jue 04/01/18	mar 31/12/19	USD 248.000,00	USD 248.000,00	USD 0,00										
321	3.5	Producto 18: Cupos en capacitaciones para personal del SAC	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 702.144,00	USD 702.144,00	USD 0,00										

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	tiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero	D1 septiembre	01 mayo	01 enero	
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07	20/11
322	3.5.1	LP_Diseño de plan de formación de capacidades de evaluadores; fiscalizadores; supervisores MINEDUC-DEPROVs, asesores técnico pedagógicos del nivel local. Incluye plan de formación en el enfoque de mejora continua de la educación pública	264 días	vie 01/07/16	mié 05/07/17	USD 145.560,00	USD 145.560,00	USD 0,00	UINET										
323	3.5.1.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
324	3.5.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
325	3.5.1.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 03/01/17	mié 05/07/17	USD 145.560,00	USD 145.560,00	USD 0,00											
326	3.5.2	CM_Implementación de plan de formación de capacidades de evaluadores; fiscalizadores; supervisores MINEDUC-DEPRPOVs, asesores técnico pedagógicos del nivel local. Año 2.	314 días	mar 18/10/16	vie 29/12/17	USD 90.000,00	USD 90.000,00	USD 0,00	UINET										
327	3.5.2.1	Etapa previa	22 días	mar 18/10/16	mié 16/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
328	3.5.2.2	Proceso de contratación	35 días	jue 17/11/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
329	3.5.2.3	Ejecución del contrato	257 días	jue 05/01/17	vie 29/12/17	USD 90.000,00	USD 90.000,00	USD 0,00											
330	3.5.3	CM_Implementación de plan de formación de capacidades de evaluadores; fiscalizadores; supervisores MINEDUC-DEPROVs, asesores técnico pedagógicos del nivel local. Año 3.	314 días	mar 17/10/17	vie 28/12/18	USD 135.000,00	USD 135.000,00	USD 0,00	UINET										
331	3.5.3.1	Etapa previa	22 días	mar 17/10/17	mié 15/11/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
332	3.5.3.2	Proceso de contratación	35 días	jue 16/11/17	mié 03/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
333	3.5.3.3	Ejecución del contrato	257 días	jue 04/01/18	vie 28/12/18	USD 135.000,00	USD 135.000,00	USD 0,00											
334	3.5.4	CM_Implementación de plan de formación de capacidades de evaluadores; fiscalizadores; supervisores MINEDUC-DEPROVs, asesores técnico pedagógicos del nivel local. Año 4.	318 días	vie 12/10/18	mar 31/12/19	USD 240.000,00	USD 240.000,00	USD 0,00	UINET										
335	3.5.4.1	Etapa previa	22 días	vie 12/10/18	lun 12/11/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
336	3.5.4.2	Proceso de contratación	35 días	mar 13/11/18	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
337	3.5.4.3	Ejecución del contrato	261 días	mar 01/01/19	mar 31/12/19	USD 240.000,00	USD 240.000,00	USD 0,00											
338	3.5.5	Actividad sin programar para contingencia	518 días	jue 05/01/17	lun 31/12/18	USD 91.584,00	USD 91.584,00	USD 0,00											
339	4	Administración, Seguimiento y Auditoría	1112 días	lun 28/09/15	mar 31/12/19	USD 4.259.062,00	USD 18.651,00	USD 4.240.411,00											
340	4.1	Gestión del Programa	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 3.385.698,00	USD 18.651,00	USD 3.367.047,00											
341	4.1.1	Integración de la UINEP/DEP- Personal clave	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 2.551.090,00	USD 18.651,00	USD 2.532.439,00											
342	4.1.1.1	Coordinador General (Jefe de Proyecto)	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 293.450,00	USD 0,00	USD 293.450,00	UINET										
343	4.1.1.1.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
344	4.1.1.1.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
345	4.1.1.1.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 293.450,00	USD 0,00	USD 293.450,00											
346	4.1.1.2	Especialista en Planificación	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00	UINET										
347	4.1.1.2.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
348	4.1.1.2.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
349	4.1.1.2.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00											
350	4.1.1.3	Especialista Técnico 1	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00	UINET										
351	4.1.1.3.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
352	4.1.1.3.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
353	4.1.1.3.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00											
354	4.1.1.4	Especialista Técnico 2	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00	UINET										
355	4.1.1.4.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
356	4.1.1.4.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
357	4.1.1.4.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00											
358	4.1.1.5	Especialista Técnico 3	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00	UINET										
359	4.1.1.5.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											

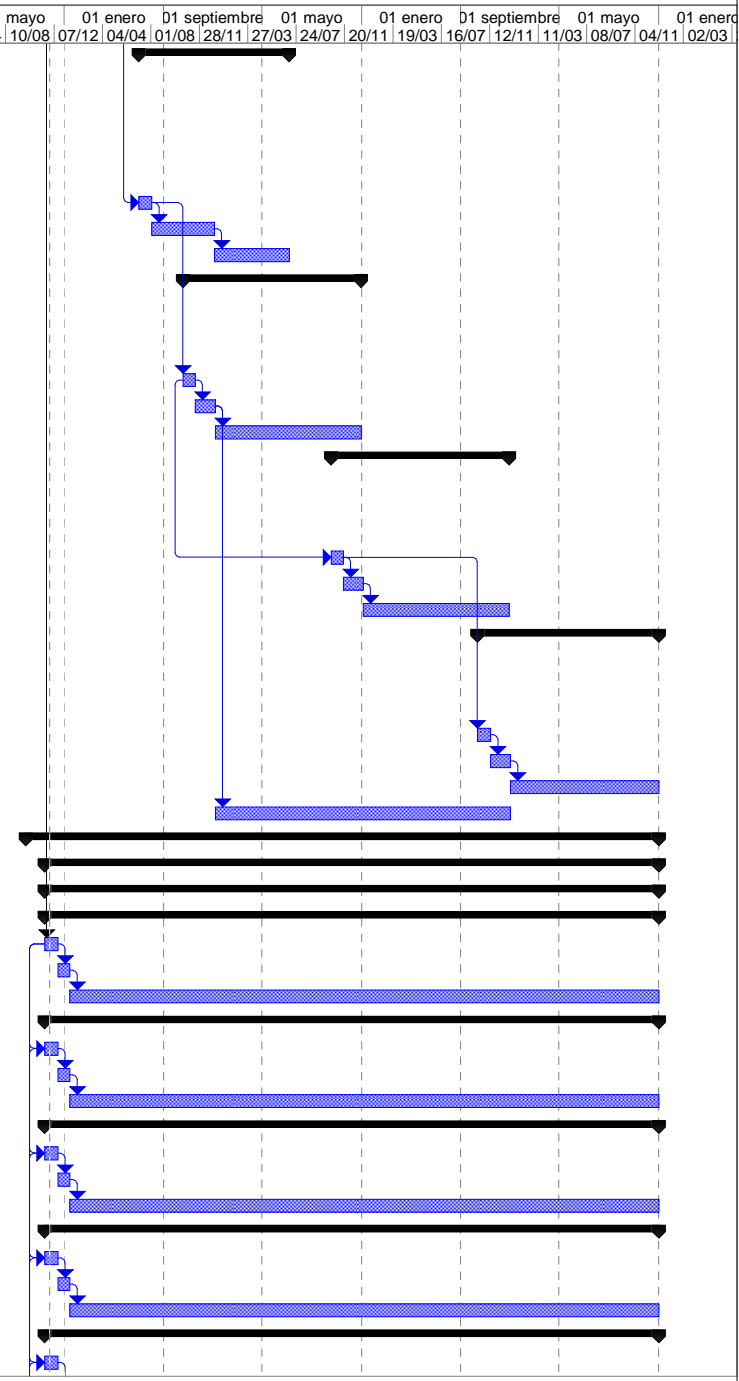

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	01 mayo	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
360	4.1.1.5.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
361	.1.1.5.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00										
362	4.1.1.6	Especialista de Adquisiciones	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00	UINET									
363	4.1.1.6.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
364	4.1.1.6.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
365	4.1.1.6.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00										
366	4.1.1.7	Especialista Financiero	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00	UINET									
367	4.1.1.7.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
368	4.1.1.7.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
369	4.1.1.7.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 209.607,00	USD 0,00	USD 209.607,00										
370	.1.1.8	Actividad sin programar para contingencia	1009 días	jue 18/02/16	mar 31/12/19	USD 999.998,00	USD 18.651,00	USD 981.347,00										
371	4.1.2	Gastos concurrentes	1009 días	jue 18/02/16	mar 31/12/19	USD 834.608,00	USD 0,00	USD 834.608,00	UINET									
372	4.2	LP_Apoyo especializado en Gestión de Proyectos	1112 días	lun 28/09/15	mar 31/12/19	USD 873.364,00	USD 0,00	USD 873.364,00	UINET									
373	4.2.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
374	4.2.2	Proceso de contratación	110 días	lun 28/09/15	vie 26/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
375	4.2.3	Ejecución del contrato	1112 días	lun 28/09/15	mar 31/12/19	USD 873.364,00	USD 0,00	USD 873.364,00										
376	4.3	Auditoría del programa	1009 días	jue 18/02/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
377	5	Evaluación	1028 días	jue 24/12/15	lun 02/12/19	USD 1.400.000,00	USD 1.400.000,00	USD 0,00										
378	5.1	Informes de evaluación de procesos del programa	766 días	jue 24/12/15	jue 29/11/18	USD 500.000,00	USD 500.000,00	USD 0,00										
379	5.1.1	SBCC_Evaluación de procesos del programa	264 días	jue 24/12/15	mar 27/12/16	USD 166.667,00	USD 166.667,00	USD 0,00	UINET									
380	5.1.1.1	Etapa previa	22 días	jue 24/12/15	vie 22/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
381	5.1.1.2	Expresión de interés	22 días	lun 25/01/16	mar 23/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
382	5.1.1.3	Proceso de contratación	132 días	mié 24/02/16	jue 25/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
383	5.1.1.4	Ejecución del contrato	88 días	vie 26/08/16	mar 27/12/16	USD 166.667,00	USD 166.667,00	USD 0,00										
384	5.1.1	SBCC_Evaluación de procesos del programa	264 días	jue 24/11/16	mar 28/11/17	USD 166.667,00	USD 166.667,00	USD 0,00	UINET									
385	5.1.1.1	Etapa previa	22 días	jue 24/11/16	vie 23/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
386	5.1.1.2	Expresión de interés	22 días	lun 26/12/16	mar 24/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
387	5.1.1.3	Proceso de contratación	132 días	mié 25/01/17	jue 27/07/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
388	5.1.1.4	Ejecución del contrato	88 días	vie 28/07/17	mar 28/11/17	USD 166.667,00	USD 166.667,00	USD 0,00										
389	5.1.2	SBCC_Evaluación de procesos del programa	264 días	lun 27/11/17	jue 29/11/18	USD 166.666,00	USD 166.666,00	USD 0,00	UINET									
390	5.1.2.1	Etapa previa	22 días	lun 27/11/17	mar 26/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
391	5.1.2.2	Expresión de interés	22 días	mié 27/12/17	jue 25/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
392	5.1.2.3	Proceso de contratación	132 días	vie 26/01/18	lun 30/07/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
393	5.1.2.4	Ejecución del contrato	88 días	mar 31/07/18	jue 29/11/18	USD 166.666,00	USD 166.666,00	USD 0,00										
394	5.2	Informes de evaluación de resultados del programa	1028 días	jue 24/12/15	lun 02/12/19	USD 900.000,00	USD 900.000,00	USD 0,00										
395	5.1.3	SBCC_Evaluación de impacto	264 días	jue 24/12/15	mar 27/12/16	USD 270.000,00	USD 270.000,00	USD 0,00	UINET									
396	5.1.3.1	Etapa previa	22 días	jue 24/12/15	vie 22/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
397	5.1.3.2	Expresión de interés	22 días	lun 25/01/16	mar 23/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
398	5.1.3.3	Proceso de contratación	132 días	mié 24/02/16	jue 25/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
399	5.1.3.4	Ejecución del contrato	88 días	vie 26/08/16	mar 27/12/16	USD 270.000,00	USD 270.000,00	USD 0,00										
400	5.1.4	SBCC_Evaluación de impacto	264 días	lun 27/11/17	jue 29/11/18	USD 270.000,00	USD 270.000,00	USD 0,00	UINET									
401	5.1.4.1	Etapa previa	22 días	lun 27/11/17	mar 26/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
402	5.1.4.2	Expresión de interés	22 días	mié 27/12/17	jue 25/01/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
403	5.1.4.3	Proceso de contratación	132 días	vie 26/01/18	lun 30/07/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
404	5.1.4.4	Ejecución del contrato	88 días	mar 31/07/18	jue 29/11/18	USD 270.000,00	USD 270.000,00	USD 0,00										
405	5.1.5	SBCC_Evaluación de impacto	264 días	mié 28/11/18	lun 02/12/19	USD 360.000,00	USD 360.000,00	USD 0,00	UINET									
406	5.1.5.1	Etapa previa	22 días	mié 28/11/18	jue 27/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
407	5.1.5.2	Expresión de interés	22 días	vie 28/12/18	lun 28/01/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
408	5.1.5.3	Proceso de contratación	132 días	mar 29/01/19	mié 31/07/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
409	5.1.5.4	Ejecución del contrato	88 días	jue 01/08/19	lun 02/12/19	USD 360.000,00	USD 360.000,00	USD 0,00										

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	TOTAL	BID	CL	Responsables	septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07	20/11
410	0	Fin (ajustes por redondeo)	0 días	lun 02/12/19	lun 02/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											

◆ 02/12

Proyecto: 2667/OC-PR

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin	
División		Tareas externas		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito		Hito externo		Resumen inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Resumen		Tarea inactiva		Tarea manual		Sólo el comienzo			
