


Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Total POA Año 1	BID Año 1	CL Año 1	Responsables	01	01	01	01	01	01	01	01	01
										septiembre 15/12	mayo 13/04	enero 10/08	septiembre 07/12	mayo 04/04	enero 01/08	septiembre 28/11	mayo 27/03	enero 24/07
0		0 Plan Operativo Anual Año 1 del Programa CH-L1081	1112 días	lun 28/09/15	mar 31/12/19	USD 7.421.725,00	USD 4.740.914,00	USD 2.680.811,00										
1	0	Inicio	0 días	lun 28/09/15	lun 28/09/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
2	0	Actividades previas al Inicio de la Ejecución	145 días	lun 28/09/15	vie 15/04/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
3	0	Distribución del POD	0 días	lun 28/09/15	lun 28/09/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
4	0	Aprobación del Préstamo por el Directorio	50 días	lun 28/09/15	vie 04/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
5	0	Misión de Negociación	1 día	lun 07/12/15	lun 07/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
6	0	Contrato de Préstamo firmado	0 días	lun 07/12/15	lun 07/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
7	0	Ley de Préstamo aprobado	0 días	lun 07/12/15	lun 07/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
8	0	Presupuesto Año 1 aprobado	1 día	mar 08/12/15	mar 08/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
9	0	Cumplimiento de Condiciones de Elegibilidad y Primer Desembolso	93 días	mié 09/12/15	vie 15/04/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
10	0	Inicio de la Ejecución del Programa	0 días	vie 30/10/15	vie 30/10/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
11	1	Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 2.860.295,00	USD 994.249,00	USD 1.866.046,00										
12	1.1	Producto 1: Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP	264 días	mar 03/05/16	vie 05/05/17	USD 232.896,00	USD 232.896,00	USD 0,00										
13	1.1.1	LP_Diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP	264 días	mar 03/05/16	vie 05/05/17	USD 232.896,00	USD 232.896,00	USD 0,00	UINET									
14	1.1.1.1	Etapa previa	22 días	mar 03/05/16	mié 01/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
15	1.1.1.2	Proceso de Contratación	110 días	jue 02/06/16	mié 02/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
16	1.1.1.3	Ejecución de contrato	132 días	jue 03/11/16	vie 05/05/17	USD 232.896,00	USD 232.896,00	USD 0,00										
17	1.2	Producto 2: Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP	956 días	mar 03/05/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
18	1.2.1	LP_Diseño el Plan de Formación, incluyendo diagnóstico de capacidades y estimación de brechas	264 días	mar 03/05/16	vie 05/05/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
19	1.2.1.1	Etapa previa	22 días	mar 03/05/16	mié 01/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
20	1.2.1.2	Proceso de contratación	110 días	jue 02/06/16	mié 02/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
21	1.2.1.3	Etapa de ejecución de contrato	132 días	jue 03/11/16	vie 05/05/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
22	1.2.2	LP_Servicios para la implementación del plan de formación - Año 2	392 días	jue 30/06/16	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
23	1.2.2.1	Etapa previa	22 días	jue 30/06/16	vie 29/07/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
24	1.2.2.2	Proceso de contratación	110 días	lun 01/08/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
34	1.3	Producto 3: Plataformas de información y gestión	1046 días	mar 29/12/15	mar 31/12/19	USD 436.681,00	USD 436.681,00	USD 0,00										
35	1.3.1	LP_Diseño de la arquitectura de procesos. Incluye levantamiento de necesidades y procesos.	264 días	mar 29/12/15	vie 30/12/16	USD 436.681,00	USD 436.681,00	USD 0,00	UINET									
36	1.3.1.1	Etapa previa	22 días	mar 29/12/15	mié 27/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
37	1.3.1.2	Proceso de contratación	110 días	jue 28/01/16	mié 29/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
38	1.3.1.3	Ejecución del Contrato	132 días	jue 30/06/16	vie 30/12/16	USD 436.681,00	USD 436.681,00	USD 0,00										
39	1.3.2	SBCC_Desarrollo e implementación de plataforma 1 de información y gestión	958 días	vie 29/04/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
40	1.3.2.1	Etapa previa	22 días	vie 29/04/16	lun 30/05/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
41	1.3.2.2	Expresión de interés	22 días	mar 31/05/16	mié 29/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
42	1.3.2.3	Proceso de contratación	132 días	jue 30/06/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
44	1.3.3	SBCC_Desarrollo e implementación de plataforma 2 de información y gestión	958 días	vie 29/04/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
45	1.3.3.1	Etapa previa	22 días	vie 29/04/16	lun 30/05/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
46	1.3.3.2	Expresión de interés	22 días	mar 31/05/16	mié 29/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
47	1.3.3.3	Proceso de contratación	132 días	jue 30/06/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
49	1.4	Producto 4: Campañas comunicacionales	546 días	vie 27/11/15	vie 29/12/17	USD 324.672,00	USD 324.672,00	USD 0,00										

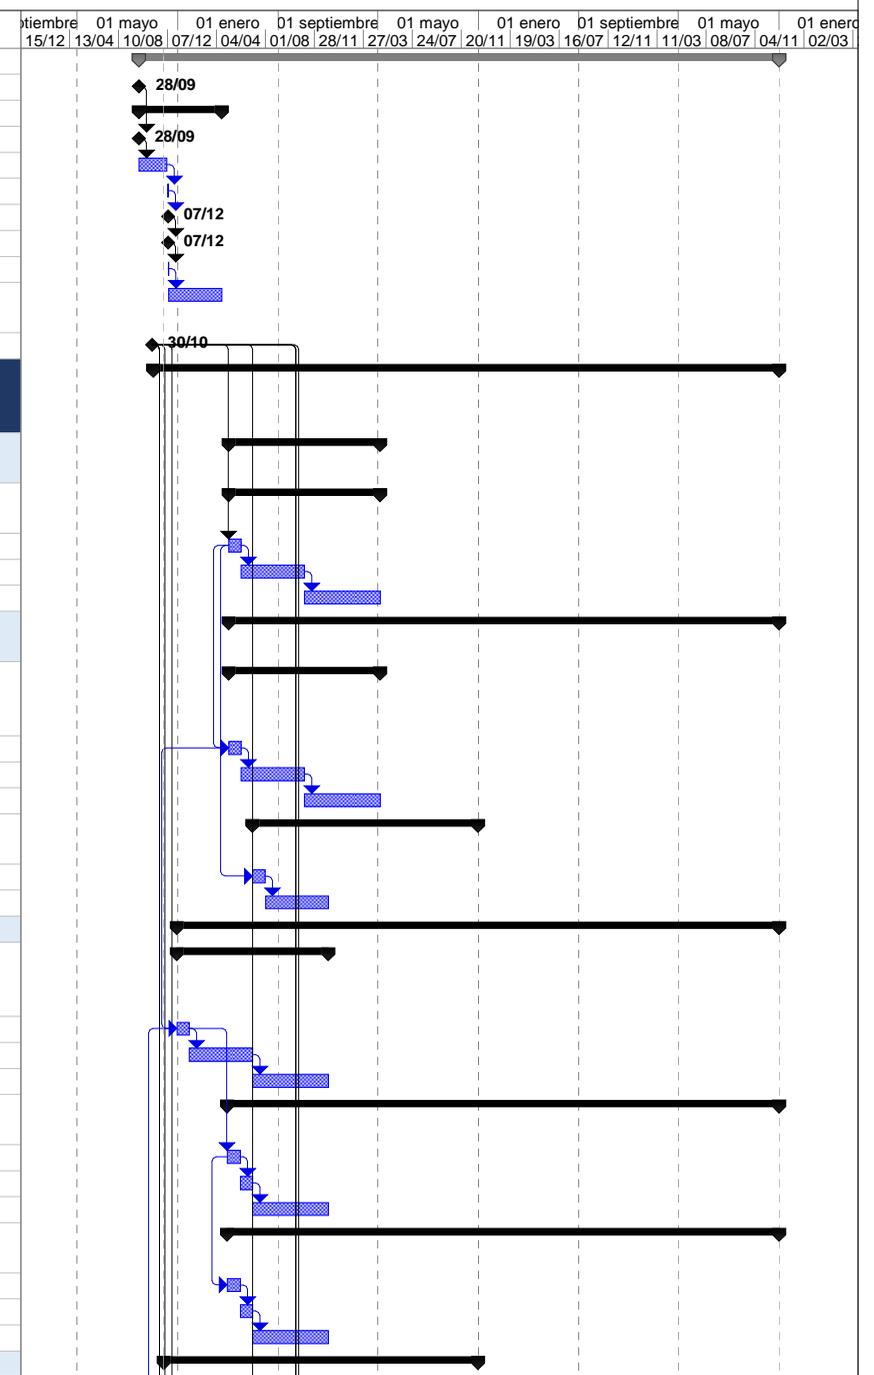

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Total POA Año 1	BID Año 1	CL Año 1	Responsables	01 noviembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
50	1.4.1	CM_Diseño de campaña comunicacional para fortalecimiento de la educación pública, que incluye elaboración de contenido, diseño de material gráfico, identificación público y objetivo y logo de la NEP	189 días	vie 27/11/15	mié 17/08/16	USD 150.000,00	USD 150.000,00	USD 0,00	UINET									
51	1.4.1.1	Etapa previa	22 días	vie 27/11/15	lun 28/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
52	1.4.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 29/12/15	lun 15/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
53	1.4.1.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 16/02/16	mié 17/08/16	USD 150.000,00	USD 150.000,00	USD 0,00										
54	1.4.2	CM_Implementación de la campaña comunicacional	414 días	mar 31/05/16	vie 29/12/17	USD 174.672,00	USD 174.672,00	USD 0,00	UINET									
55	1.4.2.1	Etapa previa	22 días	mar 31/05/16	mié 29/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
56	1.4.2.2	Proceso de contratación	35 días	jue 30/06/16	mié 17/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
57	1.4.2.3	Ejecución del contrato	357 días	jue 18/08/16	vie 29/12/17	USD 174.672,00	USD 174.672,00	USD 0,00										
58	1.5	Producto 5: Estrategia de gestión del cambio	577 días	vie 14/10/16	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
59	1.5.1	CM_Diseño e implementación de estrategia de gestión del cambio	577 días	vie 14/10/16	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
60	1.5.1.1	Etapa previa	22 días	vie 14/10/16	lun 14/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
61	1.5.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 15/11/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
63	1.6	Producto 6: Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP	696 días	mar 01/12/15	mar 31/07/18	USD 87.874,00	USD 0,00	USD 87.874,00										
64	1.6.1	Primera etapa (creación de la UINEP, equipamiento durante año 1)	115 días	mar 01/12/15	lun 09/05/16	USD 87.874,00	USD 0,00	USD 87.874,00	UINET									
65	1.6.1.1	CM_Provisión de mobiliario	49 días	mar 01/12/15	vie 05/02/16	USD 28.558,00	USD 0,00	USD 28.558,00										
66	1.6.1.1.1	Etapa previa	22 días	mar 01/12/15	mié 30/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
67	1.6.1.1.2	Proceso de contratación	5 días	jue 31/12/15	mié 06/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
68	1.6.1.1.3	Ejecución del contrato	22 días	jue 07/01/16	vie 05/02/16	USD 28.558,00	USD 0,00	USD 28.558,00										
69	1.6.1.2	CM_Instalación de redes	93 días	jue 31/12/15	lun 09/05/16	USD 23.290,00	USD 0,00	USD 23.290,00	UINET									
70	1.6.1.2.1	Etapa previa	22 días	jue 31/12/15	vie 29/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
71	1.6.1.2.2	Proceso de contratación	5 días	lun 01/02/16	vie 05/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
72	1.6.1.2.3	Ejecución del contrato	66 días	lun 08/02/16	lun 09/05/16	USD 23.290,00	USD 0,00	USD 23.290,00										
73	1.6.1.3	CM_Provisión de hardware	49 días	mar 01/12/15	vie 05/02/16	USD 33.479,00	USD 0,00	USD 33.479,00	UINET									
74	1.6.1.3.1	Etapa previa	22 días	mar 01/12/15	mié 30/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
75	1.6.1.3.2	Proceso de contratación	5 días	jue 31/12/15	mié 06/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
76	1.6.1.3.3	Ejecución del contrato	22 días	jue 07/01/16	vie 05/02/16	USD 33.479,00	USD 0,00	USD 33.479,00										
77	1.6.1.4	CM_Provisión de licencias de software	49 días	mar 01/12/15	vie 05/02/16	USD 2.547,00	USD 0,00	USD 2.547,00	UINET									
78	1.6.1.4.1	Etapa previa	22 días	mar 01/12/15	mié 30/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
79	1.6.1.4.2	Proceso de contratación	5 días	jue 31/12/15	mié 06/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
80	1.6.1.4.3	Ejecución del contrato	22 días	jue 07/01/16	vie 05/02/16	USD 2.547,00	USD 0,00	USD 2.547,00										
81	1.6.2	Segunda etapa (creación de la DEP)	436 días	mar 29/11/16	mar 31/07/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
82	1.6.2.1	CM_Provisión de mobiliario	414 días	mar 29/11/16	vie 29/06/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
83	1.6.2.1.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
84	1.6.2.1.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
86	1.6.2.2	CM_Instalación de redes	414 días	jue 29/12/16	mar 31/07/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
87	1.6.2.2.1	Etapa previa	22 días	jue 29/12/16	vie 27/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
90	1.6.2.3	CM_Provisión de hardware	414 días	mar 29/11/16	vie 29/06/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
91	1.6.2.3.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
92	1.6.2.3.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
94	1.6.2.4	CM_Provisión de licencias de software	414 días	mar 29/11/16	vie 29/06/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
95	1.6.2.4.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
96	1.6.2.4.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
98	1.6.2.5	CM_Provisión de vehículos	414 días	mar 29/11/16	vie 29/06/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Total POA Año 1	BID Año 1	CL Año 1	Responsables	01 noviembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
99	1.6.2.5.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
100	1.6.2.5.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
102	1.7	Producto 7: Contratación de personal en la UINEP/DEP	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 1.778.172,00	USD 0,00	USD 1.778.172,00										
103	1.7.1	Integración de UINEP - Recursos Humanos Nuevos	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 971.642,00	USD 0,00	USD 971.642,00										
104	1.7.1.1	HN_Contratación de personal	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 971.642,00	USD 0,00	USD 971.642,00	UINET									
105	1.7.1.1.1	Etapa previa	22 días	lun 02/11/15	mar 01/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
106	1.7.1.1.2	Proceso de contratación	22 días	mié 02/12/15	jue 31/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
107	1.7.1.1.3	Ejecución del contrato	1043 días	vie 01/01/16	mar 31/12/19	USD 971.642,00	USD 0,00	USD 971.642,00										
108	1.7.2	Integración de UINEP - Recursos Humanos Traspaso interno	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 806.530,00	USD 0,00	USD 806.530,00										
109	1.7.2.1	HN_Contratación de personal	1087 días	lun 02/11/15	mar 31/12/19	USD 806.530,00	USD 0,00	USD 806.530,00	UINET									
110	1.7.2.1	Etapa previa	22 días	lun 02/11/15	mar 01/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
111	1.7.2.2	Proceso de contratación	22 días	mié 02/12/15	jue 31/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
112	1.7.2.3	Ejecución del contrato	1043 días	vie 01/01/16	mar 31/12/19	USD 806.530,00	USD 0,00	USD 806.530,00										
113	2	Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local	1088 días	vie 30/10/15	mar 31/12/19	USD 3.222.661,00	USD 3.222.661,00	USD 0,00										
114	2.1	Producto 8: Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública	792 días	vie 18/12/15	lun 31/12/18	USD 471.568,00	USD 471.568,00	USD 0,00										
115	2.1.1	LP_Análisis comparado de modelos de gestión de nivel intermedio a nivel internacional	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 24.000,00	USD 24.000,00	USD 0,00	UINET									
116	2.1.1.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
117	2.1.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
118	2.1.1.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 24.000,00	USD 24.000,00	USD 0,00										
119	2.1.2	LP_Sistematización de buenas prácticas de gestión en municipios	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 40.000,00	USD 40.000,00	USD 0,00	UINET									
120	2.1.2.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
121	2.1.2.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
122	2.1.2.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 40.000,00	USD 40.000,00	USD 0,00										
123	2.1.3	LP_Diseño de arquitectura de procesos de los SLEs	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 145.560,00	USD 145.560,00	USD 0,00	UINET									
124	2.1.3.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
125	2.1.3.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
126	2.1.3.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 145.560,00	USD 145.560,00	USD 0,00										
127	2.1.4	LP_Diseño de módulo de gestión estratégica y liderazgo	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00	UINET									
128	2.1.4.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
129	2.1.4.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
130	2.1.4.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00										
131	2.1.5	LP_Diseño de módulo de acompañamiento pedagógico a escuelas	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00	UINET									
132	2.1.5.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
133	2.1.5.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
134	2.1.5.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00										
135	2.1.6	LP_Diseño de módulo de participación comunitaria	264 días	vie 18/12/15	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00	UINET									
136	2.1.6.1	Etapa previa	22 días	vie 18/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
137	2.1.6.2	Proceso de contratación	110 días	mar 19/01/16	lun 20/06/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
138	2.1.6.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 21/06/16	mié 21/12/16	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00										

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081


Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Total POA Año 1	BID Año 1	CL Año 1	Responsables	01 noviembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07	20/11
139	2.1.7	LP_Sistematización de lecciones aprendidas a partir de implementación de módulos y desarrollo de plan de formación de RRHH	389 días	vie 01/07/16	mié 27/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
140	2.1.7.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
141	2.1.7.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
143	2.1.8	LP_Desarrollo de protocolo de implementación operativa de SLEs	389 días	vie 01/07/16	mié 27/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
144	2.1.8.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
145	2.1.8.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
148	2.2	Producto 9: Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio	1088 días	vie 30/10/15	mar 31/12/19	USD 2.445.415,00	USD 2.445.415,00	USD 0,00											
149	2.2.1	CM_Anticipación del traspaso. Año 1. Levantamiento de contratos	189 días	vie 30/10/15	mié 20/07/16	USD 698.690,00	USD 698.690,00	USD 0,00	UINET										
150	2.2.1.1	Etapa previa	22 días	vie 30/10/15	lun 30/11/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
151	2.2.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 01/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
152	2.2.1.3	Ejecución del contrato	132 días	mar 19/01/16	mié 20/07/16	USD 698.690,00	USD 698.690,00	USD 0,00											
153	2.2.2	CM_Implementación de los 3 módulos - Año 1	306 días	vie 30/10/15	vie 30/12/16	USD 1.746.725,00	USD 1.746.725,00	USD 0,00	UINET										
154	2.2.2.1	Etapa previa	22 días	vie 30/10/15	lun 30/11/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
155	2.2.2.2	Proceso de contratación	35 días	mar 01/12/15	lun 18/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
156	2.2.2.3	Ejecución del contrato	249 días	mar 19/01/16	vie 30/12/16	USD 1.746.725,00	USD 1.746.725,00	USD 0,00											
157	2.2.3	LP_Anticipación del traspaso. Año 2 Levantamiento de contratos	264 días	jue 30/06/16	mar 04/07/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
158	2.2.3.1	Etapa previa	22 días	jue 30/06/16	vie 29/07/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
159	2.2.3.2	Proceso de contratación	110 días	lun 01/08/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
161	2.2.4	LP_Implementación de los 3 módulos - Año 2	392 días	jue 30/06/16	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
162	2.2.4.1	Etapa previa	22 días	jue 30/06/16	vie 29/07/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
163	2.2.4.2	Proceso de contratación	110 días	lun 01/08/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
182	2.3	Producto 10: Cupos individuales de capacitación para personal local	833 días	vie 21/10/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
183	2.3.1	CM_Personal capacitado - Año 2	311 días	vie 21/10/16	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
184	2.3.1.1	Etapa previa	22 días	vie 21/10/16	lun 21/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
185	2.3.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 22/11/16	lun 09/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
196	2.4	Producto 11: Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales	617 días	mar 29/11/16	mié 10/04/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
197	2.4.1	CM_Año 2: Provisión de computadores	49 días	mar 29/11/16	vie 03/02/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
198	2.4.1.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
199	2.4.1.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
201	2.4.2	CM_Año 2: Provisión de automóviles	71 días	jue 29/12/16	jue 06/04/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
202	2.4.2.1	Etapa previa	22 días	jue 29/12/16	vie 27/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
205	2.4.3	CM_Año 2: Provisión de puesto de trabajo	49 días	mar 29/11/16	vie 03/02/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
206	2.4.3.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
207	2.4.3.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
209	2.4.4	CM_Año 2: Refacciones o rehabilitaciones	49 días	mar 29/11/16	vie 03/02/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
210	2.4.4.1	Etapa previa	22 días	mar 29/11/16	mié 28/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
211	2.4.4.2	Proceso de contratación	5 días	jue 29/12/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
245	2.5	Producto 12: Campañas comunicacionales a nivel territorio	838 días	vie 14/10/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
246	2.5.1	CM_Año 2: Implementación local de la campaña comunicacional. Incluye diseño	316 días	vie 14/10/16	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
247	2.5.1.1	Etapa previa	22 días	vie 14/10/16	lun 14/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
248	2.5.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 15/11/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											

Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Total POA Año 1	BID Año 1	CL Año 1	Responsables	Gantt Chart Timeline											
										01 noviembre 15/12	01 mayo 13/04	01 enero 10/08	01 septiembre 07/12	01 mayo 04/04	01 enero 01/08	01 septiembre 28/11	01 mayo 27/03	01 enero 24/07	01 septiembre 20/11	01 mayo 19/03	01 enero 16/07
259	2.6	Producto 13: Estrategia de gestión del cambio a nivel territorial	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 305.678,00	USD 305.678,00	USD 0,00		[Gantt bar for Product 13]											
260	2.6.1	CM_Implementación de la gestión del cambio a nivel local. Año 1	296 días	vie 13/11/15	vie 30/12/16	USD 305.678,00	USD 305.678,00	USD 0,00	UINET	[Gantt bar for CM_Implementación Año 1]											
261	2.6.1.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Etapa previa 261]											
262	2.6.1.2	Proceso de contratación	35 días	mar 15/12/15	lun 01/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Proceso de contratación 262]											
263	2.6.1.3	Ejecución del contrato	239 días	mar 02/02/16	vie 30/12/16	USD 305.678,00	USD 305.678,00	USD 0,00		[Gantt bar for Ejecución del contrato 263]											
264	2.6.2	CM_Implementación de la gestión del cambio a nivel local. Año 2	317 días	jue 13/10/16	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET	[Gantt bar for CM_Implementación Año 2]											
265	2.6.2.1	Etapa previa	22 días	jue 13/10/16	vie 11/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Etapa previa 265]											
266	2.6.2.2	Proceso de contratación	35 días	lun 14/11/16	vie 30/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Proceso de contratación 266]											
276	3	Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de una nueva institucionalidad	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00		[Gantt bar for Componente 3]											
277	3.1	Producto 14: Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Product 14]											
278	3.1.1	LP_Definición de estándares indicativos de desempeño de sostenedores públicos	652 días	vie 01/07/16	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET	[Gantt bar for LP_Definición de estándares]											
279	3.1.1.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Etapa previa 279]											
280	3.1.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Proceso de contratación 280]											
282	3.1.2	LP_Diseño de instrumentos de evaluación del desempeño de sostenedores públicos	652 días	vie 01/07/16	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET	[Gantt bar for LP_Diseño de instrumentos]											
283	3.1.2.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Etapa previa 283]											
284	3.1.2.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Proceso de contratación 284]											
286	3.1.3	LP_Diseño de marco de fiscalización con foco en sostenedores públicos	652 días	vie 01/07/16	lun 31/12/18	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET	[Gantt bar for LP_Diseño de marco de fiscalización]											
287	3.1.3.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Etapa previa 287]											
288	3.1.3.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Proceso de contratación 288]											
290	3.1.4	LP_Validación y difusión nacional y local del marco evaluativo	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET	[Gantt bar for LP_Validación y difusión]											
291	3.1.4.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Etapa previa 291]											
292	3.1.4.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Proceso de contratación 292]											
295	3.2	Producto 15: Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública	817 días	vie 13/11/15	lun 31/12/18	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00		[Gantt bar for Product 15]											
296	3.2.1	LP_Diseño del modelo de coordinación y articulación institucional de las instituciones del SAC. Incluye modelo de mejora continua de la educación pública y diseño de acciones coordinadas de la DEP, la Agencia de la Calidad, la Superintendencia y los SLEs	556 días	vie 13/11/15	vie 29/12/17	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00	UINET	[Gantt bar for LP_Diseño del modelo]											
297	3.2.1.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Etapa previa 297]											
298	3.2.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 15/12/15	lun 16/05/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Proceso de contratación 298]											
299	3.2.1.3	Ejecución del contrato	424 días	mar 17/05/16	vie 29/12/17	USD 87.336,00	USD 87.336,00	USD 0,00		[Gantt bar for Ejecución del contrato 299]											
301	3.3	Producto 16: Plataforma integrada de gestión e información	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Product 16]											
302	3.3.1	SBCC_Diseño e implementación de arquitectura de sistemas para la articulación de plataformas de información y gestión.	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET	[Gantt bar for SBCC_Diseño e implementación]											
303	3.3.1.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Etapa previa 303]											
304	3.3.1.2	Expresión de interés	22 días	mar 02/08/16	mié 31/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00		[Gantt bar for Expresión de interés 304]											


Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Total POA Año 1	BID Año 1	CL Año 1	Responsables	01 noviembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07
305	3.3.1.2	Proceso de contratación	132 días	jue 01/09/16	vie 03/03/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
307	3.4	Producto 17: Instrumentos de planificación y gestión del SAC a nivel de territorio	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
308	3.4.1	LP_Diseño e implementación de un plan articulado para cada SLE, incluyendo la implementación de mesas de coordinación y la coordinación operativa entre instituciones del SAC a nivel local. Año 2.	391 días	vie 01/07/16	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
309	3.4.1.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
310	3.4.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
321	3.5	Producto 18: Cupos en capacitaciones para personal del SAC	913 días	vie 01/07/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
322	3.5.1	LP_Diseño de plan de formación de capacidades de evaluadores; fiscalizadores; supervisores MINEDUC-DEPROVs, asesores técnico pedagógicos del nivel local. Incluye plan de formación en el enfoque de mejora continua de la educación pública	264 días	vie 01/07/16	mié 05/07/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
323	3.5.1.1	Etapa previa	22 días	vie 01/07/16	lun 01/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
324	3.5.1.2	Proceso de contratación	110 días	mar 02/08/16	lun 02/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
326	3.5.2	CM_Implementación de plan de formación de capacidades de evaluadores; fiscalizadores; supervisores MINEDUC-DEPRPOVs, asesores técnico pedagógicos del nivel local. Año 2.	314 días	mar 18/10/16	vie 29/12/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET									
327	3.5.2.1	Etapa previa	22 días	mar 18/10/16	mié 16/11/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
328	3.5.2.2	Proceso de contratación	35 días	jue 17/11/16	mié 04/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
339	4	Administración, Seguimiento y Auditoría	1112 días	lun 28/09/15	mar 31/12/19	USD 814.767,00	USD 0,00	USD 814.767,00										
340	4.1	Gestión del Programa	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 596.425,00	USD 0,00	USD 596.426,00										
341	4.1.1	Integración de la UINEP/DEP- Personal clave	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 387.774,00	USD 0,00	USD 387.774,00										
342	4.1.1.1	Coordinador General (Jefe de Proyecto)	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 73.362,00	USD 0,00	USD 73.362,00	UINET									
343	4.1.1.1.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
344	4.1.1.1.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
345	4.1.1.1.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 73.362,00	USD 0,00	USD 73.362,00										
346	4.1.1.2	Especialista en Planificación	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00	UINET									
347	4.1.1.2.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
348	4.1.1.2.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
349	4.1.1.2.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00										
350	4.1.1.3	Especialista Técnico 1	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00	UINET									
351	4.1.1.3.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
352	4.1.1.3.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
353	4.1.1.3.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00										
354	4.1.1.4	Especialista Técnico 2	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00	UINET									
355	4.1.1.4.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
356	4.1.1.4.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
357	4.1.1.4.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00										
358	4.1.1.5	Especialista Técnico 3	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00	UINET									
359	4.1.1.5.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
360	4.1.1.5.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
361	4.1.1.5.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00										
362	4.1.1.6	Especialista de Adquisiciones	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00	UINET									
363	4.1.1.6.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										
364	4.1.1.6.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00										

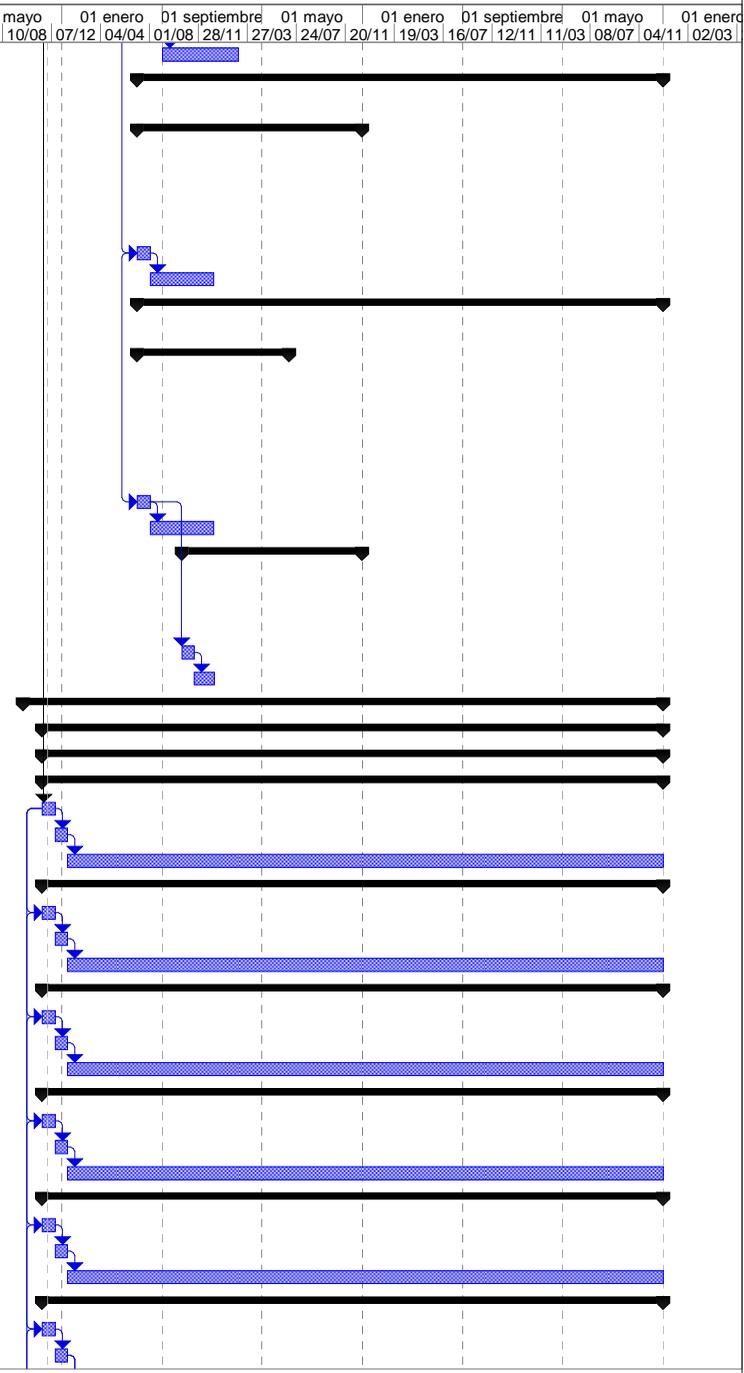


Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo CH-L1081

Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Total POA Año 1	BID Año 1	CL Año 1	Responsables	01 noviembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	01 septiembre	01 mayo	01 enero	
										15/12	13/04	10/08	07/12	04/04	01/08	28/11	27/03	24/07	20/11
365	4.1.1.6.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00											
366	4.1.1.7	Especialista Financiero	1078 días	vie 13/11/15	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00	UINET										
367	4.1.1.7.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
368	4.1.1.7.2	Proceso de contratación	22 días	mar 15/12/15	mié 13/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
369	4.1.1.7.3	Ejecución del contrato	1034 días	jue 14/01/16	mar 31/12/19	USD 52.402,00	USD 0,00	USD 52.402,00											
370	.1.1.8	Actividad sin programar para contingencia	1009 días	jue 18/02/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
371	4.1.2	Gastos concurrentes	1009 días	jue 18/02/16	mar 31/12/19	USD 208.651,00	USD 0,00	USD 208.652,00	UINET										
372	4.2	LP_Apoyo especializado en Gestión de Proyectos	1112 días	lun 28/09/15	mar 31/12/19	USD 218.342,00	USD 0,00	USD 218.341,00	UINET										
373	4.2.1	Etapa previa	22 días	vie 13/11/15	lun 14/12/15	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
374	4.2.2	Proceso de contratación	110 días	lun 28/09/15	vie 26/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
375	4.2.3	Ejecución del contrato	1112 días	lun 28/09/15	mar 31/12/19	USD 218.342,00	USD 0,00	USD 218.341,00											
376	4.3	Auditoría del programa	1009 días	jue 18/02/16	mar 31/12/19	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
377	5	Evaluación	1028 días	jue 24/12/15	lun 02/12/19	USD 436.667,00	USD 436.667,00	USD 0,00											
378	5.1	Informes de evaluación de procesos del programa	766 días	jue 24/12/15	jue 29/11/18	USD 166.667,00	USD 166.667,00	USD 0,00											
379	5.1.1	SBCC_Evaluación de procesos del programa	264 días	jue 24/12/15	mar 27/12/16	USD 166.667,00	USD 166.667,00	USD 0,00	UINET										
380	5.1.1.1	Etapa previa	22 días	jue 24/12/15	vie 22/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
381	5.1.1.2	Expresión de interés	22 días	lun 25/01/16	mar 23/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
382	5.1.1.3	Proceso de contratación	132 días	mié 24/02/16	jue 25/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
383	5.1.1.4	Ejecución del contrato	88 días	vie 26/08/16	mar 27/12/16	USD 166.667,00	USD 166.667,00	USD 0,00											
384	5.1.1	SBCC_Evaluación de procesos del programa	264 días	jue 24/11/16	mar 28/11/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	UINET										
385	5.1.1.1	Etapa previa	22 días	jue 24/11/16	vie 23/12/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
386	5.1.2.2	Expresión de interés	22 días	lun 26/12/16	mar 24/01/17	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
394	5.2	Informes de evaluación de resultados del programa	1028 días	jue 24/12/15	lun 02/12/19	USD 270.000,00	USD 270.000,00	USD 0,00											
395	5.1.3	SBCC_Evaluación de impacto	264 días	jue 24/12/15	mar 27/12/16	USD 270.000,00	USD 270.000,00	USD 0,00	UINET										
396	5.1.3.1	Etapa previa	22 días	jue 24/12/15	vie 22/01/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
397	5.1.3.2	Expresión de interés	22 días	lun 25/01/16	mar 23/02/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
398	5.1.3.3	Proceso de contratación	132 días	mié 24/02/16	jue 25/08/16	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00											
399	5.1.3.4	Ejecución del contrato	88 días	vie 26/08/16	mar 27/12/16	USD 270.000,00	USD 270.000,00	USD 0,00											

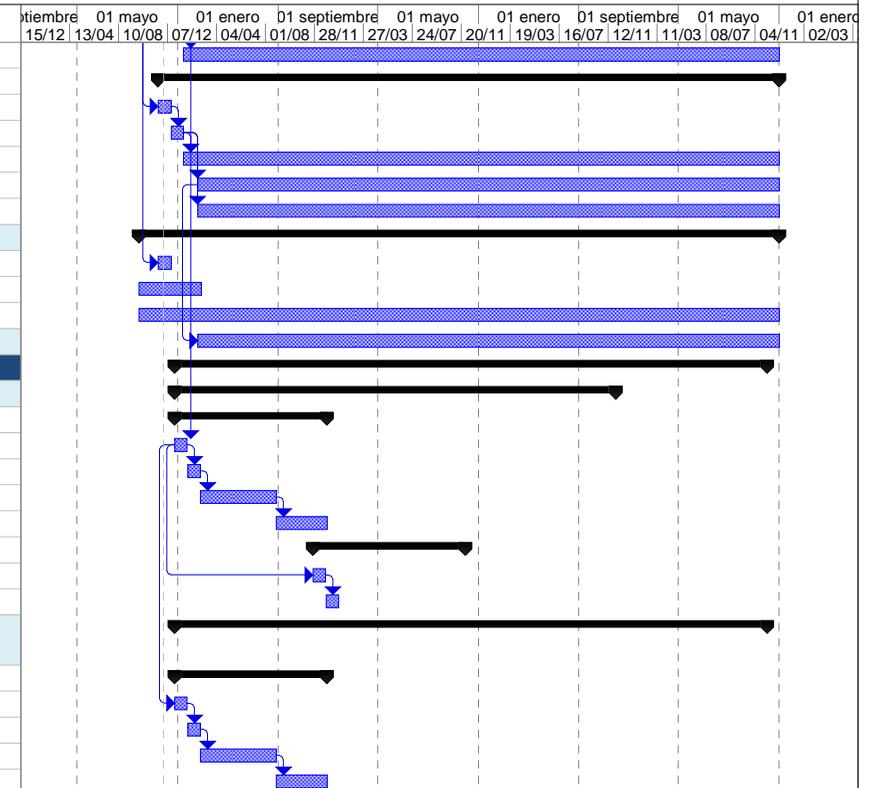

Proyecto: 2667/OC-PR

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin	
División		Tareas externas		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito		Hito externo		Resumen inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Resumen		Tarea inactiva		Tarea manual		Sólo el comienzo			
