

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1135	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/12/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/01/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Agricultural Public Management II	<b>Loan Number</b>	3800/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA	<b>Sector/Subsector</b>	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
<b>Team Leader</b>	DE SALVO, CARMINE PAOLO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1135	7,600,000	7,600,000	400,000	0	8,000,000	7,600,000	5,383,815.05	70.84%	2,216,184.95
<b>Aggregated</b>	<b>7,600,000</b>	<b>7,600,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>7,600,000</b>	<b>5,383,815.05</b>	<b>70.84%</b>	<b>2,216,184.95</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

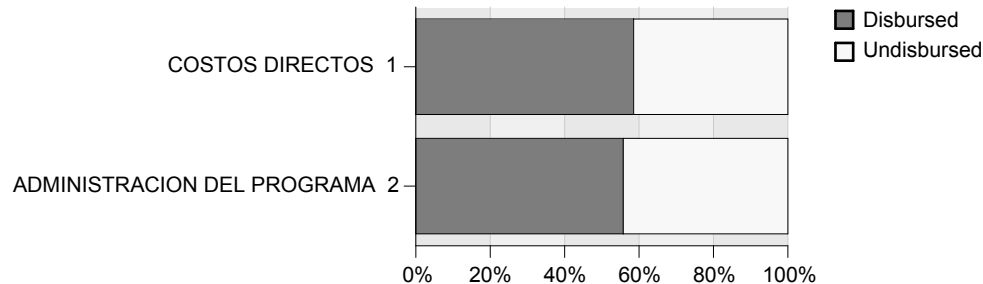

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Incrementar el valor de las exportaciones agroalimentarias de Uruguay

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Valor de las exportaciones	Miles de U\$S	4,060.00	2015	2022	P	4,400.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Uruguay XXI

**Observations:** Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

**General Development Objectives Nbr. 1:** Incrementar los mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias de Uruguay	Número de Mercados	302.00	2015	2022	P	312.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Suma de mercados de carne, lácteos y granos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Disminución del costo de trámites de exportación correspondientes al MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) en carne y lácteos

**Observation:** Estimado con base en 262.000 t de carne y 118.934 t de lácteos, año 2015

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
0.0	Costo de trámites por tonelada - Carne	U\$S	5.55	2015	P		2.78
					A		

#### Details

**Means of verification:** Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Estimado con base en 262.000 t de carne, año 2015

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
0.1	Costo de trámites por tonelada - Lácteos	U\$S	2.15	2015	P		1.07
					A		

#### Details

**Means of verification:** Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

**Observations:** Estimado con base en 118.934 t de lácteos, año 2015

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)

**Observation:** El rubro de línea de base es pesca; los que se prevé incorporar son carne, lácteos y granos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
1.0	Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior)	Rubros	1.00	2015	P		4.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior) de Uruguay XXI

**Observations:** El rubro de línea de base es Pesca; los que se prevé incorporar son carnes, lácteos y granos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Disminución de observaciones de inocuidad en exportaciones de alimentos

**Observation:**

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2022	EOP 2023
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

	Measure		Year				
2.0	Notificaciones anuales RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)	Número de notificaciones	6.00	2013	P	4.00	
					A		
<b>Details</b>							
<b>Means of verification:</b> Reporte Anual del Food and Feed Safety Alerts (RASFF)							
<b>Observations:</b> Línea de base es promedio 2012-2014. Valor de fin de proyecto, Promedio 2021 - 2023							
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Mejora en la eficiencia del laboratorio

**Observation:** Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.0	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Ganaderos	Días	7.00	2015	P		3.00
					A		
<b>Details</b>							
<b>Means of verification:</b> MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
<b>Observations:</b> Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.1	Plazo promedio para completar análisis - Servicios Agrícolas	Días	10.00	2015	P		5.00
					A		
<b>Details</b>							
<b>Means of verification:</b> MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)							
<b>Observations:</b> Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)							
<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No

**RESULTS MATRIX**

**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

**Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de los servicios provistos por el MGAP**

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa	Cantidad de Notificaciones electrónicas realizadas por año	P	12,960	32,400	13,986	236,327
			P(a)	1,000	3,000	24,818.44	236,327
			A	0	0	7,594	198,109.32
1.2	Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE)	Domicilios electrónicos constituidos en la BDDE	P	5,000	10,000	13,986	178,305
			P(a)	1,000	2,000	12,318.44	178,305
			A	0	0	7,594	128,218
1.3	Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa	% de expedientes gestionados por medios electrónicos	P	60	100	74,392	538,379
			P(a)	40	100	130,507.94	538,378
			A	0	0	25,252	433,122.06
1.4	Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las unidades ejecutoras del MGAP	Oficinas clave	P	5	9	13,986	359,168
			P(a)	2	9	22,793.45	359,168
			A	0	0	5,091	173,830.36
1.5	100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%)	% de trámites con gestión total vía web incorporados durante el Programa	P	20	83	128,061	935,309
			P(a)	4	179	271,085.47	935,309
			A	2	173	53,322	588,503.14
1.6	Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio	Oficina construida y operanodo	P	0	1	23,372	710,471
			P(a)	1	1	534,356.86	710,471
			A	0	0	130,429	306,543.14
1.7	Centros Administrativos Regionales con gestión total	Centros Administrativos	P	1	4	15,862	348,033
			P(a)	0	4	12,375.86	348,033
			A	0	0	6,266	306,859.24
1.8	Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico	Funcionarios Capacitados por el Programa	P	5	25	60,231	320,535
			P(a)	5	54	16,645.45	320,535
			A	0	44	3,267	88,645.46

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Componente 2. Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad

Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
			2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1 Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado	% de avance en desarrollo e implementación	P	10	100	108,485	925,743
		P(a)	12	100	85,453.25	925,743
		A	5	70	1,512	608,517.85
2.2 Laboratorios MGAP con SIGLA implantado	Laboratorios integrados al SIGLA	P	10	10	103,743	899,030
		P(a)	4	23	85,453.25	899,030
		A	1	5	1,512	429,284.86
2.3 Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando	Grado de avance de obra y equipamiento	P	0	100	4,743	724,030
		P(a)	20	100	55,856.82	724,030
		A	0	20	915	669,088.18
2.4 Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025	No. de sustancias	P	10	23	4,743	119,030
		P(a)	5	23	2,953.25	119,030
		A	0	12	1,512	74,299.2
2.5 Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP	Protocolos aprobados	P	0	8	4,743	76,713
		P(a)	2	10	45.11	76,713
		A	0	6	0	16,239.02
2.6 Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad	Reportes del observatorio	P	300	1,200	72,243	273,713
		P(a)	200	1,668	60,045.11	273,713
		A	96	1,314	0	63,408.89
2.7 Observatorio de exigencias y tendencias de exportación	Reportes del observatorio	P	6	24	4,743	226,713
		P(a)	15	109	27,643.13	226,713
		A	9	88	7,177	83,457.49
2.8 Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo	Barreras Sanitarias con sistema inteligente	P	0	3	4,743	598,758
		P(a)	2	9	128,664.52	598,758
		A	0	5	57,831	285,128.74

## Other Cost

Administración del Programa (seguimiento, evaluación, auditorías)	P			107,172	529,743
	P(a)			60,084.43	529,744
	A			23,918	295,780.4

## Total Cost

Total Cost	P			759,234	8,000,000
	P(a)			1,531,100.78	8,000,000
	A			333,192	4,749,035.35

**CHANGES TO THE MATRIX**

No information available for this section

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
1	Active	Human Resources	
	<b>Response actions</b>		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy	
2	Inactive	Institutional Environment	
	<b>Response actions</b>		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	



# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories
