



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2015 - JUNIO 2015

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión en contrataciones públicas

Nro. Proyecto: PE-M1096 - Proyecto No.: ATN/ME-13919-PE

Propósito: Reducción de las barreras que limitan a las MYPES su participación en procesos de compras públicas a través del mejoramiento de la capacidad de gestión de los funcionarios de los Organismos de Compras Estatales

País Administrador

PERÚ

País Beneficiario


PERÚ

Agencia Ejecutora: Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado


Líder equipo de diseño: CARLOS RODRÍGUEZ

Líder equipo de supervisión: CARLOS RODRÍGUEZ


CICLO DEL PROYECTO

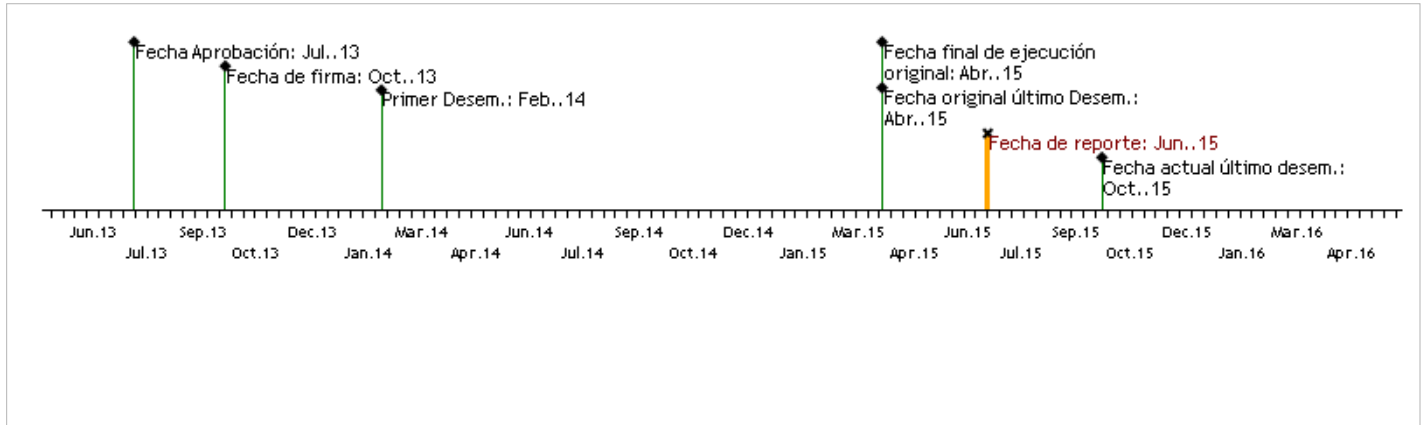

RECURSOS

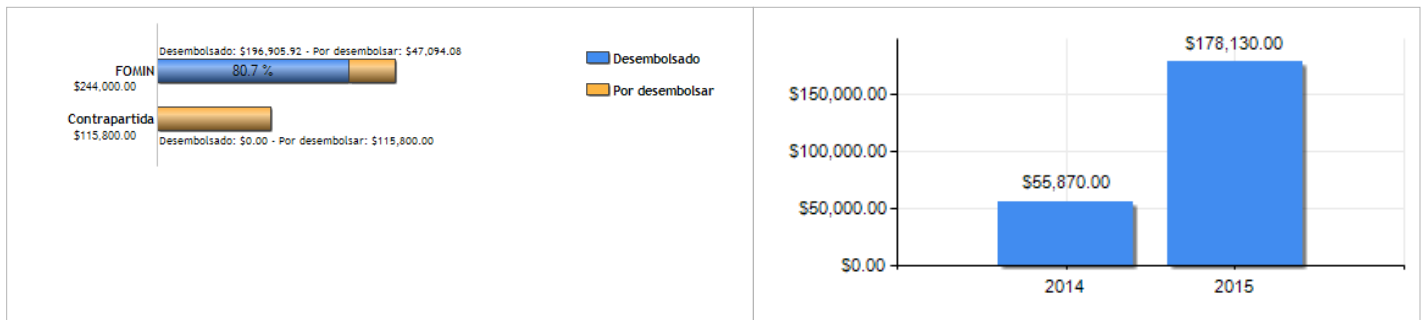

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

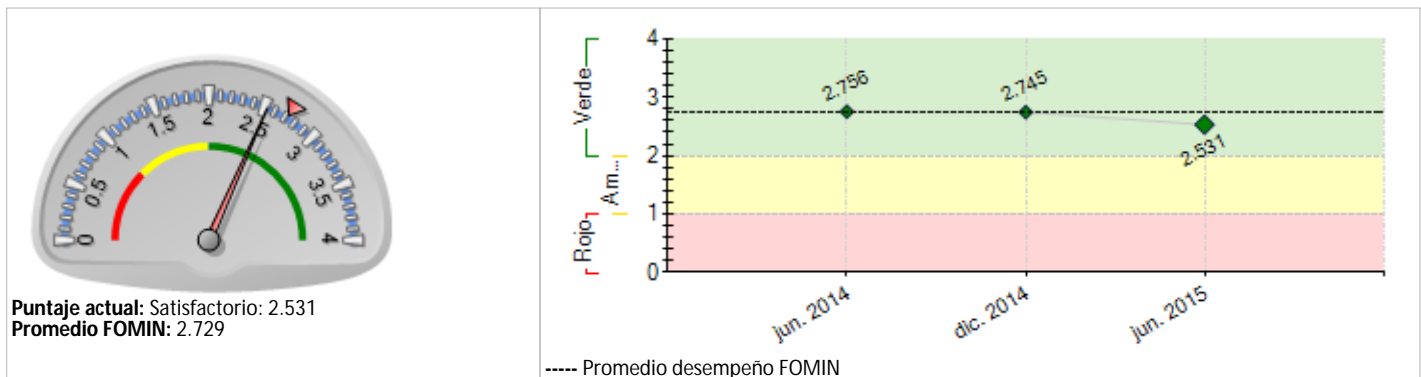

RIESGOS EXTERNOS


CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Baja

Adquisiciones: Baja

Capacidad Técnica: Media

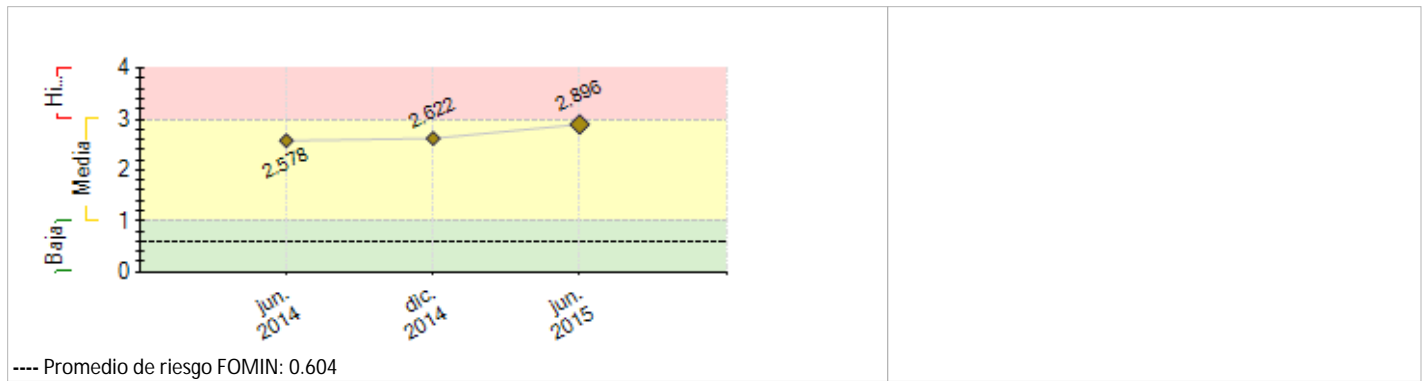

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- 1 Se ha logrado obtener una propuesta del sistema de certificación por niveles y un programa de difusión a partir de la culminación de la consultoría contratada para su elaboración.
2. Se ha culminado con la elaboración de la base de datos donde se ha identificado la de demanda y oferta de bienes, servicios y obras donde MYPE tiene mayor fortalecimiento institucional y mejora de acceso de MYPE en contrataciones del Estado.
3. En cuanto a la culminación de la base de datos se tuvo un retraso porque se presentaron observaciones al producto final de la Consultoría especializada para la identificación de demanda y oferta de bienes, servicios y obras donde MYPE tiene mayor fortalecimiento institucional y mejora de acceso de MYPE en contrataciones del Estado que en un inicio se presentó en el mes de marzo pero cuya versión final donde se levantaron las observaciones se aprobó en el mes de abril.
- 4 Se evidencia que las metas en cuanto a la sensibilización de las MYPES será menor en vista que las MYPES son en su mayoría empresas cuya ausencia del personal para asistir a los talleres afecta su productividad, por lo cual muchas no logran asistir a los eventos.
- 5 Desde OSCE se vienen haciendo esfuerzos para el logro de todos los objetivos destinando personal competente para la ejecución de las actividades restantes del proyecto haciendo el seguimiento necesario a la conclusión de cada actividad.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se ha logrado obtener una propuesta del sistema de certificación por niveles y un programa de difusión a partir de la culminación de la consultoría contratada para su elaboración.

Se ha culminado con la elaboración de la base de datos donde se ha identificado la de demanda y oferta de bienes, servicios y obras donde MYPE tiene mayor fortalecimiento institucional y mejora de acceso de MYPE

En cuanto a la culminación de la base de datos se tuvo un retraso porque se presentaron observaciones al producto final de la Consultoría especializada para la identificación de demanda y oferta de bienes, servicios y obras donde MYPE tiene mayor fortalecimiento institucional y mejora de acceso de MYPE en contrataciones del Estado que en un inicio se presentó en el mes de marzo pero cuya versión final se aprobó en el mes de abril.

Se presentó un retraso en cuanto a la presentación del producto final de la Consultoría especializada para la identificación de demanda y oferta de bienes, servicios y obras donde MYPE tiene mayor fortalecimiento institucional y mejora de acceso de MYPE en contrataciones del Estado, debido a fallas por parte del consultor contratado, que fueron absueltas por el consultor pero que significaron un retraso en la ejecución de las actividades de difusión y sensibilización de las MYPES, ante esto la coordinación tomó la decisión de preparar el plan de difusión a las MYPES paralelamente a la entrega de este producto, es así que se pudo mitigar los retrasos ocasionados.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Propósito: Reducción de las barreras que limitan a las MYPES su participación en procesos de compras públicas a través del mejoramiento de la capacidad de gestión de los funcionarios de los Organismos de Compras Estatales	R.1	Número Funcionarios que culminan satisfactoriamente el sistema de certificación por niveles	0				25400	0	
							Abr. 2015	Jun. 2014	
	R.2	Incremento de la participación de MYPES en el uso de los catálogos electrónicos y del sistema de adiestramiento virtual	0				10	10	
							Abr. 2015	Jun. 2014	

Componente 1: Diseño y promoción del sistema de certificación del personal de los OEC para mejorar el acceso de las MYPES a las compras públicas Peso: 50% Clasificación:	C1.11	Un sistema de certificación validado e implementado	0				1	0	Atrasado
							Abr. 2014	Jun. 2014	
	C1.12	Número de MYPES informadas y sensibilizadas para participar del de compras públicas	0				1750	1246	En curso
							Oct. 2014	Jun. 2014	
	C1.13	Número de MYPES que utilizan herramientas virtuales de capacitación e información para acceder al sistema de compras públicas	0				600	100	Atrasado
							Abr. 2015	Jun. 2014	

Componente 2: Elaboración de base de datos sobre demanda y oferta asociada de bienes, servicios y obras estatales Peso: 50% Clasificación:	C2.11	Base de datos reclasificada del sistema electrónico de contrataciones del estado SEACE, que incluye información específica sobre los bienes y servicios donde las MYPES tienen mayor participación y oportunidades					Oct. 2014	No	Finalizado
								Jun. 2015	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0	5	Abr. 2014	5	Ene. 2014	Logrado
H1	[*] Base de datos culminada	Jun. 2015	1	Dic. 2014	Logrado
H2	[*] MYPES sensibilizadas e informadas para participar del sistema de compras públicas	Sep. 2015	243	Jun. 2015	
H3	[*] Definición de niveles para la certificación de funcionarios y servidores públicos.	Sep. 2015	1	Abr. 2015	Logrado
H4	[*] Implementación del Sistema de certificación por niveles	Sep. 2015			
H5	[*] Incremento (%) de participación de las MYPES en los Catálogos Electrónicos de Convenio Marco.	Sep. 2015			
H6	[*] Mypes adicionales sensibilizadas e informadas para participar del sistema de compras públicas	Sep. 2015			
H7	[*] Mypes utilizan herramientas virtuales de capacitación e información para acceder al sistema de compras estatales.	Sep. 2015			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El contexto político y normativo en el Perú no es favorable y no promueve una mayor participación de las MYPES en las compras públicas	High	..	Invitado Proyecto
2. Las diversas entidades públicas no mantienen interés y compromiso por ampliar sus mercados y brindar información sobre su demanda y oferta	High	..	Invitado Proyecto
3. Las políticas públicas del estado peruano no continúan promoviendo la especialización de los funcionarios o servicios del sistema	Media	El Reglamento general de la Ley del Servicio Civil -Ley N°30057-, aprobado el 13 de junio de 2014 cuyo objeto es reformar la planilla estatal y establecer un régimen único para los servidores públicos desarrollando reglas en materia de derechos, obligaciones, capacitación, evaluación, derechos colectivos, entre otros temas para los servidores civiles. Está dividido en 2 libros: El primer libro se aplica a todos los servidores civiles (Régimen 276 y 728); El segundo libro se aplica SOLO a aquellos que se pasen al nuevo régimen de servicio civil.	Invitado Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: High **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Para el diseño del sistema de certificación por niveles y la consultoría especializada para la identificación de demanda y oferta de bienes, servicios y obras donde MYPE tiene mayor fortalecimiento institucional y mejora de acceso de MYPE en contrataciones del Estado, se está implementado la difusión a los profesionales y técnicos que laboran en los OEC de las entidades así como a las MYPE, este es un factor importante para la sostenibilidad del proyecto pues en la medida de que los actores involucrados estén conscientes de su rol se creará una corriente de opinión a favor y una expectativa por los cambios esperados.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. En cuanto a la definición del sistema de certificación por niveles que ejecutó la firma consultora siempre fue necesario el apoyo y seguimiento del área encargada de OSCE que facilitó la información requerida por los consultores y realizó labores de apoyo en las coordinaciones para las reuniones entre los consultores y entidades públicas que pudieran aportar a esta definición.	Implementation	Cobian, Jorge
2. La identificación de los participantes para los talleres de difusión con MYPES que tuvieran interés en venderle al estado y no estuvieran inscritos en el Registro Nacional de Proveedores ha sido una labor compleja, puesto que la mayoría de ellas son empresas familiares que en caso de asistir uno de ellos su ausencia afectaría la producción diaria, por lo cual su presencia final en los talleres ha sido menor afectando las metas planteadas como asistencia para cada evento, ya que si bien se cursaron las invitaciones muchos de ellos finalmente no asistieron en gran parte por las razones antes mencionadas.	Implementation	Cobian, Jorge
