



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2014 - DICIEMBRE 2014

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión en contrataciones públicas

Número de proyecto: PE-M1096 - Nro. Operación: ATN/ME-13919-PE

Resultado: Reducción de las barreras que limitan a las MYPES su participación en procesos de compras públicas a través del mejoramiento de la capacidad de gestión de los funcionarios de los Organismos de Compras Estatales


País Administrador
PERÚ

País Beneficiario
PERÚ


Agencia ejecutora: Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado

Líder equipo de diseño:
Líder equipo de supervisión: Rodríguez, Carlos


CRONOLOGÍA DE EVENTOS

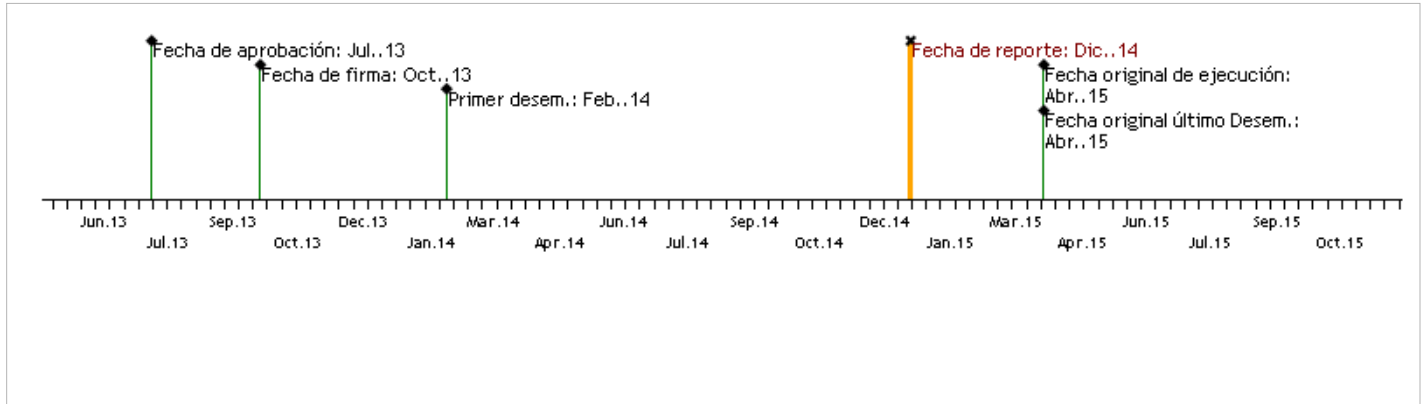

RECURSOS

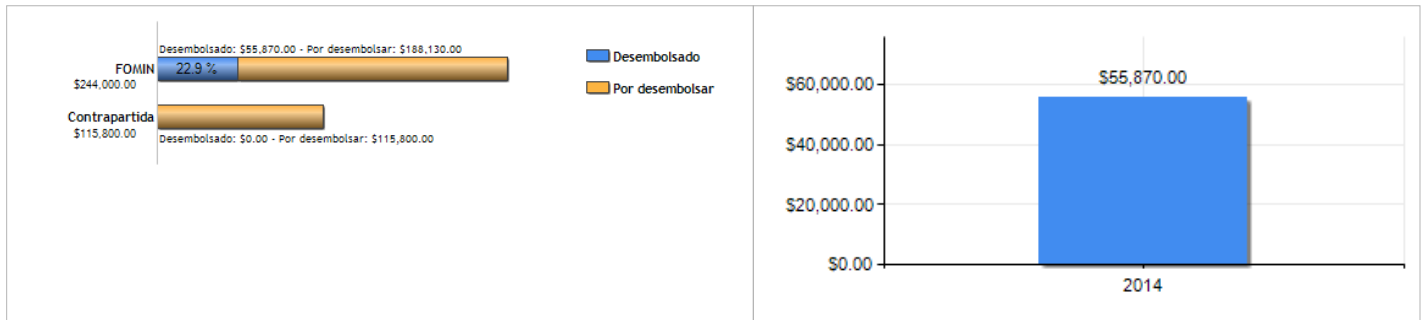

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

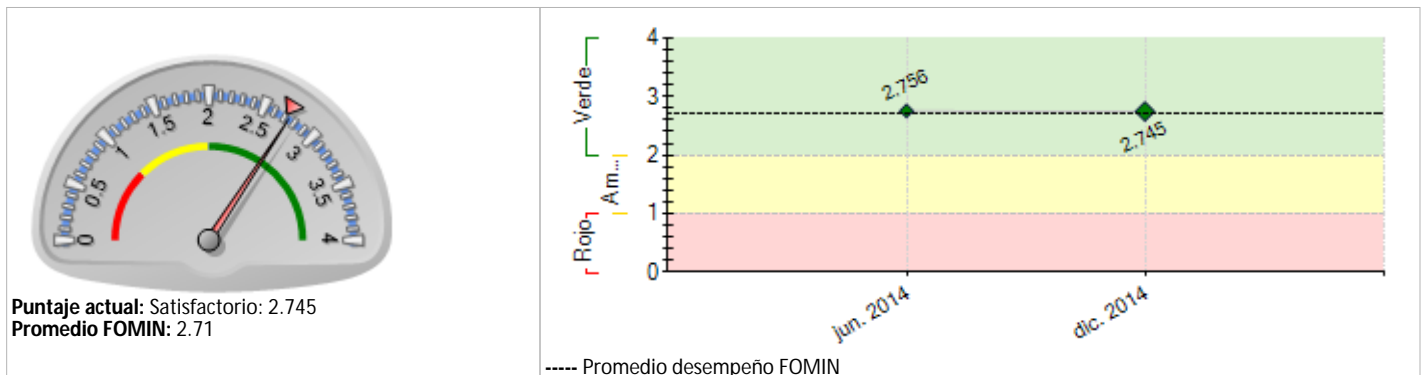

RIESGOS EXTERNOS


CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Baja

Adquisiciones: Baja

Capacidad Técnica: Medio

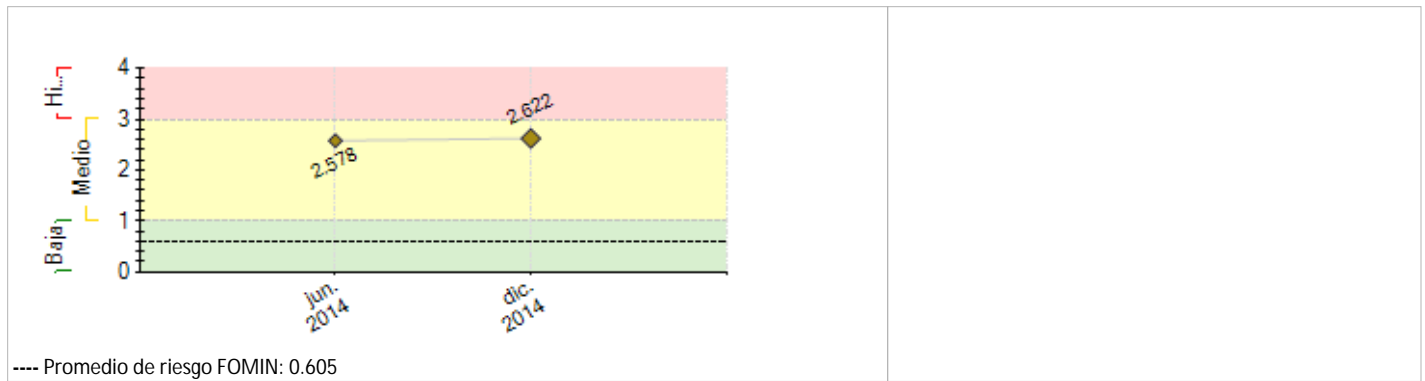

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El Primer componente referido a la Elaboración de la Base de Datos, se han logrado realiza dos de los tres servicios propuestos para el desarrollo de las actividades

La Consultoría especializada que determine la mejor muestra de la base de datos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), utilizando técnicas de muestras complejas, fue asumida y realizada por el Área de Estudios Económicos del OSCE.

La Consultoría para analizar y verificar la clasificación de la información registrada en el SEACE según el catálogo de bienes y servicios del MEF de una muestra de procesos del año 2009- 2011 se contrataron 03 consultorías individuales, las cuales estuvieron bajo la supervisión de la Oficina de Estudios Económicos quien dio la conformidad a los productos finales el 04 de diciembre de 2014.

En cuanto a la última consultoría Consultoría especializada para la identificación de la demanda y oferta en bienes, servicios y obras donde la mype tiene mayor participación y oportunidades que se encargaría de la última actividad se seleccionó y contrato al consultor el 31 de diciembre de 2014.

El segundo componente Diseño de sistema de certificación por niveles para funcionarios o servidores que laboran en OEC y OSCE se ha logrado realizar el proceso de selección y contratación de la firma consultora que realizara las actividades relacionadas con este componente, la misma que empezó el 1 de diciembre de 2014 el desarrollo de sus actividades.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Entre los resultados mas importantes:

En el componente uno se han realizado la clasificación de la información registrada en el SEACE según el catálogo de bienes y servicios del MEF de una muestra de procesos del año 2009- 2011a través de 03 servicios de consultoría individual, quedando pendiente para la finalización de las actividades de este componente la consultoría especializada para la identificación de la demanda y oferta en bienes, servicios y obras donde la mype tiene mayor participacion y oportunidades.

En cuanto al segundo componente se tuvieron algunas demoras en la selección y contratación de la firma consultora encargada de desarrollar las actividades de este componente finalmente se seleccionó y contrato a la firma el 1 de diciembre de 2014.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Reducción de las barreras que limitan a las MYPES su participación en procesos de compras públicas a través del mejoramiento de la capacidad de gestión de los funcionarios de los Organismos de Compras Estatales	R.1 Número Funcionarios que culminan satisfactoriamente el sistema de certificación por niveles	0			25400	0	
	R.2 Incremento de la participación de MYPES en el uso de los catálogos electrónicos y del sistema de adiestramiento virtual	0			Abr. 2015 10 Abr. 2015	Jun. 2014 10 Jun. 2014	

Componente 1: Diseño y promoción del	C1.I1 Un sistema de certificación validado e implementado	0			1	0	Atrasado
---	---	---	--	--	---	---	----------

sistema de certificación del personal de los OEC para mejorar el acceso de las MYPES a las compras públicas Peso: 50% Clasificación: Satisfactorio	C1.12	Número de MYPES informadas y sensibilizadas para participar del de compras públicas	0					Abr. 2014	Jun. 2014	En curso
								1750	1246	
	C1.13	Número de MYPES que utilizan herramientas virtuales de capacitación e información para acceder al sistema de compras públicas	0					Oct. 2014	Jun. 2014	Atrasado
								600	100	
								Abr. 2015	Jun. 2014	
Componente 2: Elaboración de base de datos sobre demanda y oferta asociada de bienes, servicios y obras estatales Peso: 50% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Base de datos reclasificada del sistema electrónico de contrataciones del estado SEACE, que incluye información específica sobre los bienes y servicios donde las MYPES tienen mayor participación y oportunidades						Oct. 2014	No Jun. 2014	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado	
H0	Condiciones previas	1	Abr. 2014	5	Ene. 2014	Logrado
H1	[*] Base de datos culminada	1	Jun. 2015	1	Dic. 2014	Logrado
H2	[*] MYPES sensibilizadas e informadas para participar del sistema de compras públicas	400	Sep. 2015			
H3	[*] Definición de niveles para la certificación de funcionarios y servidores públicos.	1	Sep. 2015			
H4	[*] Implementación del Sistema de certificación por niveles	1	Sep. 2015			
H5	[*] Incremento (%) de participación de las MYPES en los Catálogos Electrónicos de Convenio Marco.	10	Sep. 2015			
H6	[*] Mypes adicionales sensibilizadas e informadas para participar del sistema de compras públicas	500	Sep. 2015			
H7	[*] Mypes utilizan herramientas virtuales de capacitación e información para acceder al sistema de compras estatales.	300	Sep. 2015			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El contexto político y normativo en el Perú no es favorable y no promueve una mayor participación de las MYPES en las compras públicas	High	..	Invitado Proyecto
2. Las diversas entidades públicas no mantienen interés y compromiso por ampliar sus mercados y brindar información sobre su demanda y oferta	High	..	Invitado Proyecto
3. El sistema de certificación propuesto por el proyecto no promueve la participación y una mayor especialización de los funcionarios o servidores de los organismos estatales de compras públicas OEC	Medio	Si bien es cierto en la fase del Sistema de Certificación, se han certificado un total de 8 561 profesionales y técnicos que laboren en el órgano encargado de las contrataciones de las entidades públicas a nivel nacional; estos sin embargo no cuentan con la certificación por niveles que se proee realizar.	Invitado Proyecto
4. Las políticas públicas del estado peruano no continuen promoviendo la especialización de los funcionarios o servicios del sistema	Medio	El Reglamento general de la Ley del Servicio Civil -Ley N°30057-, aprobado el 13 de junio de 2014 cuyo objeto es reformar la planilla estatal y establecer un régimen único para los servidores públicos desarrollando reglas en materia de derechos, obligaciones, capacitación, evaluación, derechos colectivos, entre otros temas para los servidores civiles. Está dividido en 2 libros: El primer libro se aplica a todos los servidores civiles (Régimen 276 y 728); El segundo libro se aplica SOLO a aquellos que se pasen al nuevo régimen de servicio civil.	Invitado Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: High NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se realizaran acciones de sensibilización a las MYPE para participar en las compras públicas y por otra parte teniendo funcionarios certificados en diferentes niveles de competencia podrán orientar de manera pertinente las contrataciones de sus entidades priorizando la participación de las MYPE.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Las acciones de coordinación entre las áreas encargadas de la supervisión de la ejecución de las actividades de ambos componentes permitieron hacer un seguimiento de la entrega de los productos de las consultorías de cada uno de los dos componentes; este seguimiento permitió observar que no se cuenta con un plazo razonable para la implementación de los actividades de difusión (Programa) a los tres actores identificados en el proyecto como son MYPE, operadores logísticos y entidades académicas.

Relativa a
Implementation

Autor
Cobian, Jorge
